



٢٠٢٢ التقرير السنوي

إعادة الاستقرار للمناطق المحررة

مهندسو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدون الأجهزة الكهربائية في مديرية توزيع كهرباء أعلى الفرات. سرقت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام معظم المعدات الموجودة في المديرية. واليوم، أصبحت المديرية قادرة على إمداد جميع المرافق الكهربائية العامة في أنحاء غرب الأنبار.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.

برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة

التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢

فترة التقرير	١ كانون الثاني الى ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٢
عنوان المشروع	برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة
الرقم التعريفي لمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٠٠٠٨٩٤٥٩ (الرقم التعريفي للمخرج: ٠٠٠٩٥٦٨٤)
مدة المشروع	١٥ أيار ٢٠١٥ – ٣١ كانون الاول ٢٠٢٣
موارد المشروع	١,٤٧٥,٣٥٩,٦٢٤,٣٦ دولار أمريكي
مركز تنسيق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق	مكتب رئيس الوزراء
مخرجات إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام	النتيجة ١. تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات على مواجهة الكوارث (من صنع الإنسان والطبيعية).
نتائج وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي	النتيجة ٣. تحسين ظروف العودة الآمنة للمشردين داخليا في المناطق المحررة حديثاً.
مخرجات وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي	المخرج ١. دعمت حكومة العراق لتلبية احتياجات الاستقرار الفورية في المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثاً والتي تسمح بعودة النازحين داخلياً.
الشريك المنفذ	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الشريك المسؤول	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مناطق عمل المشروع	المحافظات المحررة: الانبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين المحررة.
الشركاء المساهمون	أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، ألمانيا، اليونان، العراق، إيطاليا، اليابان، الكويت، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية،
	

قائمة المحتويات

٧	١ . الوضع العام ٢٠٢٢
٩	٢ . برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة
٢١	٣ . عام من التقدم والتكيف المستمر
٢٠	٤ . النتائج حسب المحافظة
٢٢	١,٤ الأنبار
٢٦	٢,٤ ديالى
٣٠	٣,٤ كركوك
٣٤	٤,٤ نينوى
٣٧	٥,٤ صلاح الدين
٤١	٦,٤ التماسك المجتمعي
٤٣	٥ . الملحق ١ . إطار النتائج
٤٦	٦ . الملحق ٢ . التحديث المالي

قائمة الاشكال والجداول

٨	الشكل ١ . عدد النازحين والعائدين بمرور الوقت
١١	الشكل ٢ : منهج برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة
١٧	الشكل ٣ . المشاريع المكتملة حسب المحافظة وحسب القطاع، ٢٠٢٢ (إجمالي)
١٨	الشكل ٤ . المنافع المتراكمة حسب المحافظة ٢٠٢٢
١٨	الشكل ٥ . المنافع المتراكمة حسب المحافظة ٢٠٢٢ (اجمالي)
١٩	الشكل ٦ . الربع الرابع اجمالي التقدم المحرز مقابل الأهداف الموضوعة لعام ٢٠٢٢
٢٠	الشكل ٧ . المشاريع المنجزة حسب المحافظة ٢٠٢٢
٢٠	الشكل ٨ . المشاريع المنجزة حسب المحافظة ٢٠٢٢ (تراكمي)
٢٢	الجدول ١ . ملخص النتائج في الأنبار ٢٠٢٢
٢٢	الجدول ٢ . ملخص النتائج في الأنبار (التراكمي)
٢٦	الجدول ٣ . ملخص النتائج في ديالى ٢٠٢٢
٢٦	الجدول ٤ . ملخص النتائج في ديالى ٢٠٢٢ (التراكمي)
٣٠	الجدول ٥ . ملخص النتائج في كركوك ٢٠٢٢
٣٠	الجدول ٦ . ملخص النتائج في كركوك ٢٠٢٢ (التراكمي)
٣٤	الجدول ٧ . ملخص النتائج في نينوى ٢٠٢٢
٣٤	الجدول ٨ . ملخص النتائج في نينوى ٢٠٢٢ (التراكمي)
٣٧	الجدول ٩ . ملخص النتائج في نينوى ٢٠٢٢
٣٧	الجدول ١٠ . ملخص النتائج في صلاح الدين ٢٠٢٢ (التراكمي)

الاختصارات

جدول الكميات	BoQ
منظمات المجتمع المدني	CBO
النقد مقابل العمل	CfW
مرض فيروس كورونا	COVID-19
مديرية مكافحة الألغام	DMA
مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح	DTM
مخاطر المتفجرات	EH
برنامج إعادة الاستقرار الموسع	FFS
برنامج إعادة الاستقرار الفوري	FFES
برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة	FFIS
حكومة العراق	GOI
وحدة المشتريات العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي	GPU
رافع فولتية المولد	GSU
الصحة والسلامة والبيئة	HSE
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	ICT
وحدة العناية المركزة	ICU
النازحين	IDP
المنظمة الدولية للهجرة	IOM
الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)	ISIL
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	MOLSA
وزارة الصحة	MOH
وزارة الهجرة والمهجرين	MOMD
مستشار الاستقرار البلدي	MSA
الجامعة التقنية الشمالية	NTU
جامعة نينوى	NU
خلايا التنسيق في المحافظات	PCC
مراكز العناية الصحية الأولية	PHC
قوات الحشد الشعبي	PMF
معدات السلامة الشخصية	PPE
الأمم المتحدة	UN
بعثة الأمم المتحدة في العراق	UNAMI
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	UNDP
الذخائر المتفجرة غير المنفجرة	UXO
مركز التدريب المهني	VTC
الاسر التي تعولها نساء	WHH
منظمة الصحة العالمية	WHO
محطة لمعالجة المياه	WTP



فقد صالح علي حسن ساقه اليمنى عام ٢٠٠٥ بعد إصابته برصاصة طائشة. منذ ذلك الحين، لم تكن حياته كما كانت. من خلال مركز الأطراف الصناعية في الفلوجة الذي تم تأهيله من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يستطيع صالح المشي مرة أخرى.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.

١. الوضع العام ٢٠٢٢

بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢١، شهد تشكيل الحكومة في العراق عملية طويلة دامت لأكثر من عام تضمنت اجراء حوارات سياسية تارة وحصول انسدادات تارة اخرى وصلت في بعض الاحيان الى نشوب صراعات عنيفة بين الشخصيات والكتل السياسية التي كانت قد انخرطت في الحوارات، ومن ابرزها السيد مقتدى الصدر والحركة التابعة له ضد احزاب الاطار التنسيقي. كما أظهر انخفاض إقبال الناخبين والمظاهرات أن الفجوة في الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة لا تزال مستمرة، وأن العقد الاجتماعي لا يزال ممزقا.


بعد المصادقة على نتائج الانتخابات في نهاية شهر كانون الاول ٢٠٢١ اجتمع مجلس النواب المنتخب حديثاً للمرة الأولى في المنطقة الخضراء بتاريخ ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢ من اجل انتخاب رئيساً للمجلس ونائبيه. وبالرغم من هذا التقدم المحرز فإن الخطوة التالية في العملية السياسية هي انتخاب رئيس الجمهورية والتي ضلت معلقة حتى تحقيق النصاب البرلماني والذي قد لا يتحقق. وفي منتصف شهر حزيران قدم ٧٣ عضو في مجلس النواب من كتلة مقتدى اصدر استقالتهم وبهذه الاستقالة فقد زاد عدد مقاعد كتلة الاطار التنسيقي بقيادة نوري المالكي الى ١٣٠ مقعد. في نهاية تموز رشح الاطار التنسيقي محمد شياح السوداني رئيساً للوزراء، مما أثار احتجاجات من أنصار الصدر، الذين نظموا اعتصاماً في المنطقة الدولية ببغداد بما في ذلك مبنى مجلس النواب. بعد إعلان الصدر اعتزاله الحياة السياسية في ٢٩ آب ٢٠٢٢، احتل أنصاره القصر الرئاسي وتبع ذلك اشتباكات مسلحة بين فصائل مختلفة خلفت ما لا يقل عن ٣٠ قتيلاً ومئات الجرحى^١. كما اندلعت الاحتجاجات في البصرة وميسان وكربلاء. بعد حظر التجول في شهر أيلول ظل الوضع هادئاً إلى حد كبير. وفي شهر تشرين الأول وبعد أكثر من عام بقليل من الانتخابات، انتخب مجلس النواب العراقي أخيراً رئيساً، السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد والذي بدوره عين على الفور محمد شيع السوداني رئيساً للوزراء الذي شكل الحكومة منهيًا المأزق السياسي.

أدت عملية تشكيل الحكومة الراكدة والمتقلبة إلى عدم وجود ميزانية مصادق عليها لعام ٢٠٢٢، مما أثر على تنفيذ الاستثمارات المطلوبة بشدة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية واستعادة الخدمات الأساسية، وهذا على الرغم من توفر الظروف المالية الأكثر ملاءمة.

ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية بنحو ٧٢ في المائة (على أساس سنوي) في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢ مع ارتفاع متوسط أسعار تصدير النفط وزيادة حجم الصادرات تدريجياً. بدون ميزانية معتمدة، ظل الإنفاق الحكومي مقيداً بالمادة ١٣ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ (المعدل)، والتي تنص على أن صرف الأموال يقتصر على واحد على اثني عشر النفقات الفعلية في العام السابق. بالنسبة للاستثمارات، لا يسمح القانون إلا بالنفقات المتعلقة بالمشاريع المصادق عليها مسبقاً. ومن اجل إيجاد حل لهذا القيد بشكل مؤقت، أقر مجلس النواب مشروع قانون طوارئ في حزيران ٢٠٢٢، سمح للحكومة بتحويل الأموال العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي، وواردات الطاقة، وتحويلات الضمان الاجتماعي، وخلق فرص العمل، ومشاريع التنمية الأساسية، إضافة الى امور أخرى. ومع ذلك، فإن التمويل المعتمد بموجب القانون والذي قيمته (١٧,٢ مليار دولار أمريكي) لا يغطي سوى جزء بسيط من احتياجات التنمية في البلاد وكان أقل من ثلث المكاسب النفطية الإضافية في عام ٢٠٢٢. وقد استمر هذا في التأثير سلباً على تنفيذ الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي.

استمر النزوح في كونه سمة أساسية لبيئة ما بعد الصراع في العراق. وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من المنظمة الدولية للهجرة^٢ (IOM)، عاد ٩٨٩,٨٥٢، ٤ نازح عراقي إلى مناطقهم الأصلية بحلول نهاية شهر كانون الاول ٢٠٢٢. بدأت وتيرة العودة في التباطؤ في ٢٠١٨-٢٠١٩، مما يدل على تعقيد التحديات و التي تتضمن المساكن والبنى التحتية المتضررة بشدة ونقص الخدمات الأساسية ونقص فرص كسب العيش، وقضايا التماسك المجتمعي والمصالحة، وبيئة الأمن والسلامة المستمرة والمتقلبة في بعض مناطق العودة. مع بقاء ١,١٦٨، ٦١٩ من النازحين داخلياً في جميع أنحاء البلد وبلغ معدل العودة نسبة ٨١ في المائة.

٢ مع توقع أسعار النفط بأكثر من ٩٠ دولاراً أمريكياً للبرميل في ٢٠٢٢-٢٠٢٤، من المتوقع أن تصل عائدات تصدير النفط القوية الحفاظ على الحسابات المالية والخارجية في فوائض كبيرة. البنك الدولي، «المركز الاقتصادي للعراق»، خريف ٢٠٢٢.
٣ نفس المرجع
٤ مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، تقرير القائمة الرئيسية للعراق رقم ١٢٨، أكتوبر-ديسمبر ٢٠٢٢.

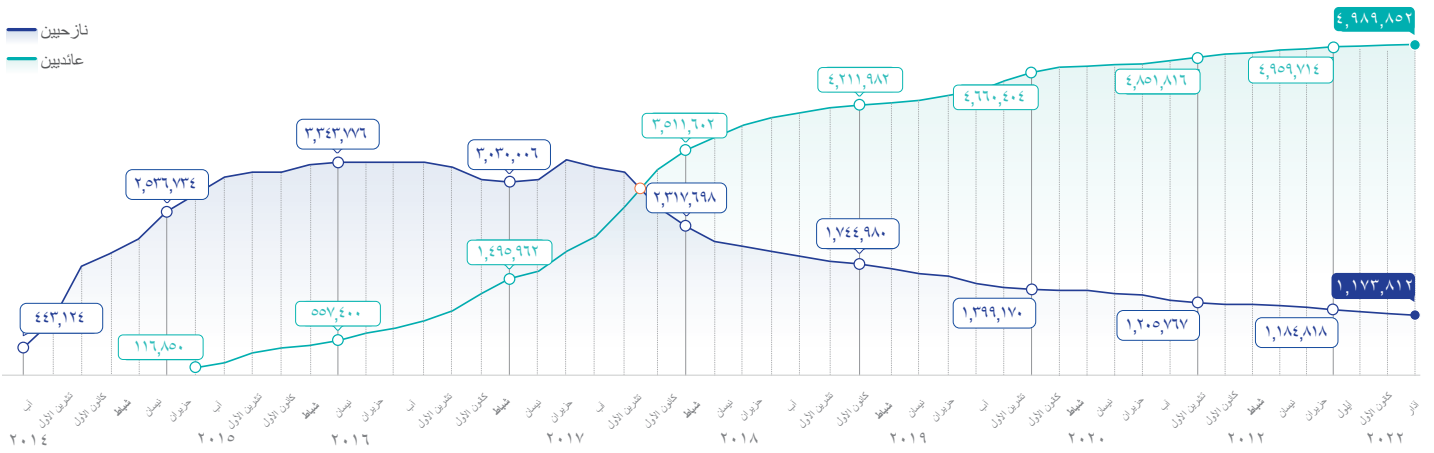

المصدر: مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، القائمة الرئيسية للعراق ٢٠٢٨، تشرين الأول (أكتوبر) - كانون الأول (ديسمبر)

في حين أن آثار جائحة فيروس كورونا (المعروفة بكوفيد-١٩) تنزع فتيلها تدريجياً في جميع أنحاء العالم، استمر الشعور بالتحديات طويلة الأجل للصحة العامة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية طوال عام ٢٠٢٢. بحلول ٣١ كانون الأول (ديسمبر) من عام ٢٠٢٢ أكدت السلطات الصحية العراقية أن ما مجموعه ٢,٤٦٥,٣٧٣ إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها والتي أدت إلى وفاة ٢٥,٣٧٤ شخصاً. تلقى العراق منذ عام ٢٠١٩ أكثر من ٦ ملايين جرعة تطعيم من خلال مرفق الوصول العالمي للقاحات المعروف باسم كوفاكس (COVAX). في حين تم توسيع خدمات التطعيم بشكل كبير منذ أواخر عام ٢٠٢١، ظل الإقبال على التطعيم منخفضاً نسبياً. في شهر آذار مارس ٢٠٢٢ أطلقت وزارة الصحة حملة لتوسيع تغطية لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا إضافة إلى خدمات التحصين الروتينية حيث يعمل بها أكثر من ١٣٠٠ فريق توعية متنقل في جميع أنحاء العراق. لا يزال التطعيم ضد فيروس كورونا في العراق منخفضاً للغاية وهو من بين أدنى المعدلات في المنطقة وأقل بكثير من المعدل العالمي. ولا تزال معدلات التطعيم منخفضة حتى بين الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل كبار السن والأسر الفقيرة والعاملين في القطاع غير الحكومي^١. وبحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر)، تم تطعيم حوالي ١٩,٧ في المائة من السكان العراقيين بشكل كامل وتلقى ٢٨ ٪ جرعة واحدة على الأقل.

على الرغم من هذه التحديات، أحرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدماً جيداً. توضح الأقسام التالية بالتفصيل الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

لا يزال العراق من أكثر البلدان هشاشة في العالم. استمر تأثر مسار البلد وتوقعاته التنموية سلباً بالتحديات الجيوسياسية والوضع الأمني المعقد والحوكمة الضعيفة بما في ذلك الفساد المستشري والإدارة العامة غير الفعالة والظروف الاقتصادية الهشة بسبب الاعتماد على النفط ونقص التنوع الاقتصادي وضعف القطاع الخاص. استمرت الهجمات غير المتكافئة التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية ضد قوات الأمن في العراق وضد السكان المدنيين، ولا سيما في محافظات الأنبار وبغداد وبابل وديالى وكركوك ونيوى وصلاح الدين وظلت مصدر قلق بالغ. ورداً على ذلك واصلت قوات الأمن العراقية عملياتها الاستباقية والوقائية. استمر تغير المناخ يمثل تهديداً خطيراً ولا يزال عاملاً مضاعفاً للبيئة الهشة بالفعل والمشهد الأمني والسياسي والاقتصادي ساهم انخفاض مستويات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ في استنفاد إمدادات المياه في البلاد. إلى جانب الديناميكيات الإقليمية التي تؤثر على وصول العراق إلى موارد المياه العذبة وممارسات إدارة المياه السيئة يمر العراق بواحدة من أسوأ فترات ندرة المياه في التاريخ الحديث. للجفاف والتدهور البيئي آثار مباشرة على الوصول إلى مياه الشرب والزراعة والأمن الغذائي. في الواقع، مع انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف ونقص المياه، أصبح العراق يعتمد أكثر فأكثر على الواردات، مما يعرض البلاد أيضاً لمخاطر الأمن الغذائي في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتج عن انخفاض قيمة العملة في شهر كانون الأول ٢٠٢٠ مقابل الدولار الأمريكي. الدولار والحرب الأوكرانية الروسية.

وهذا يهدد النسيج الاجتماعي الهش بالفعل وقد يؤدي إلى عمليات نزوح جديدة ويؤجج النزاعات المحتملة على الموارد.

Iraq 19-World Health Organization (WHO) COVID ٧
 .who.int/region/emro/country/iq.Portal https://covid19
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
 20MOH_ENG.pd%-20%20UNICEF%20%20PR%Joint ٨
 البنك الدولي، المرصد الاقتصادي للعراق، ربيع ٢٠٢٢. ٩

٥ OECD States of Fragility 2022
 368/2022/S ٦

٢. برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة

خلايا التنسيق في المحافظات لتحديد أي المشاريع التي على برنامج إعادة الاستقرار بدي العمل على تنفيذها بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المحليين.

فوضت اللجنة التوجيهية برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة للعمل في ٣٢ منطقة ذات أولوية في المحافظات الخمس المحررة في العراق، وتحديدًا في كل من الأنبار وديالى وكركوك ونيوى وصلاح الدين. في عام ٢٠١٨ أضاف برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة خمس مناطق ذات أولوية جديدة وهي ببجي- الحضر وقضاء الحويجة بناوحيه والموصل وغربي الأنبار إضافة الى غربي نيوى. مازالت هذه المناطق تحتاج بشكل كبير الى الدعم والتمويل من اجل إرساء الاستقرار. وكان العديد من هذه المناطق تحت سيطرة تنظيم داعش لفترة طويلة حتى عام ٢٠١٧، وبالنظر لهذا التاريخ فان ذلك يعني ان برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة لم يستطيع البدء في العمل حتى عام ٢٠١٨. لكن ومع التحرير المبكر فان التجاذبات المذهبية والعرقية إضافة الى التحديات الأمنية حالت دون العودة الثابتة للنازحين في مناطق عمل ذات أولوية أخرى. في الوقت الذي تتبدد فيه هذه التحديات وتبدء حركة العودة للمناطق الاصلية فان برنامج إعادة الاستقرار سوف يستجيب بشكل مباشر لاحتياجات الاستقرار المستجدة.

تستمر جائحة فيروس كورونا بفرض تحديات غير مسبوقة بسبب العواقب الصحية المباشرة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المدى المتوسط. بالإضافة إلى التعديلات التشغيلية والاستراتيجية التي ميزت برنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة فيما يتعلق بالوضع الذي فرضته جائحة كورونا، فقد أعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً حزمة استجابة لجائحة كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية^{١٠} ووزارة الصحة والسلطات المحلية للمساعدة حكومة العراق للاستجابة لجائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط من خلال تعزيز الجاهزية وأنظمة الاستجابة واستراتيجيات التعافي للسلطات الوطنية. يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مشروع الاستجابة المتكاملة لفيروس كوفيد-١٩ من خلال الاستفادة من طرائق برنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة «المجربة والمختبرة» في ١٧ محافظة. يتم تنفيذ الاستجابة لجائحة كورونا من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتوازي مع مبادرات برنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة ويتم رفع تقارير الى المانحين بشكل منفصل حول هذا البرنامج.^{١١}

يقدم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الدعم للحكومة العراقية لإرساء الاستقرار في المناطق التي تحررت من تنظيم داعش. في شهر حزيران من عام ٢٠١٥ وبالاعتماد على التعهدات التي قدمها المجتمع الدولي، أسس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج إعادة الاستقرار الفوري من اجل تقديم المساعدة السريعة لتحقيق الاستقرار عبر أربع مجالات عمل، أو «نوافذ». النوافذ الأربعة، التي تم تحديدها على أنها حاسمة لتسهيل عودة النازحين واستعادة الثقة بين الحكومة والشعب، هي (١) إعادة تأهيل الأشغال العامة والبنى التحتية الخفيفة (٢) سبل العيش. (٣) دعم قدرات الحكومات المحلية و (٤) التماسك المجتمعي.

الفرضية التي وضعت آنذاك كانت على النحو التالي، بينما ينخرط برنامج إعادة الاستقرار الفوري في تنفيذ مشاريع الاستقرار الفوري تقوم الحكومة بالاستجابة الى احتياجات الاستقرار البعيدة الأمد. ولكن هذا الافتراض لم يتحقق بسبب مجموعة من العوامل منها محدودية توافر الإيرادات العامة في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي لا تزال الدولة تعتمد عليها بشكل كبير. ونتيجة لهذه العوامل تم تأسيس القناة الثانية من البرنامج في شهر نيسان من عام ٢٠١٦ تحت اسم برنامج إعادة الاستقرار الموسع من اجل تلبية احتياجات الاستقرار كبيرة وذلك من خلال تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتوسطة والكبيرة. وسوية فان برنامج الاستقرار الفوري وبرنامج الاستقرار الموسع يشكلان البرنامج الأكبر والأشمل وهو برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. ان برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة يتشارك نفس الإدارة ونفس عمليات التنفيذ وكذلك اليات المراقبة. فتفتح هذين القناتين الباب امام الدول المانحة لتقديم الدعم على مستويات مختلفة من عملية الاستقرار وتعمل المساعدة فيما يخص تعاقب المساهمات.

ثم يتم إعداد المشاريع من قبل المحافظات والسلطات المحلية، مما يدل على قيادة الحكومة العراقية في عملية تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش. تمارس خلايا التنسيق في المحافظات في المحافظات سلطة حقيقية في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين حيث يكون اعتمادها ضرورياً للمضي قدماً في أي نشاط معين لتحقيق الاستقرار. في كركوك، يتم تنفيذ نفس الدور من قبل لجنة إعادة إعمار المحافظات العامة. في نيوى، يتم تحديد الأولويات من قبل المديرية التنفيذية ويتم مشاركتها مع مكتب المحافظ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يعين المحافظ لجان الرقابة التي تشرف مع مراقبين من طرف ثالث على المشاريع على الارض. يلتقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بانتظام مع مكتب محافظ نيوى ويعمل بشكل وثيق مع المديرية التنفيذية للأمور الفنية. تجمع خلايا التنسيق بالمحافظات وما يقابلها في المحافظات من تشكيلات بين جميع المديرية الحكومية العراقية والمحافظين من اجل التنسيق وتحديد المشاريع التي المطلوب تنفيذها من اجل الحصول على الدعم الخارجي. يتسلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبات من

١٠ تدعم خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية لبيد منظمة الصحة العالمية في العراق ضد COVID-١٩ استجابة الحكومة العراقية وتوجه جميع مبادرات الأمم المتحدة في العراق فيما يتعلق باحتياجات الصحة والاستعداد.


١١ لمزيد من المعلومات حول استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لـ COVID-١٩، يرجى الرجوع إلى تقرير التقدم المخصص المتاح على

www.iq.org/content/iraq/en/home/coronavirus.html//



يعود أكثر من ٧٠٠ طفل إلى المدرسة في الأنبار بعد إعادة تأهيل مدرسة اليقظة الثانوية للبنات من خلال برنامج إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة في العراق.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.



السلامة والصحة بما في ذلك إرشادات السلامة الخاصة بفيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك حافظ مستشارو الاستقرار البلدي ومنسفو المناطق في برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة على مراقبة الوضع على الأرض عن كثب.

إن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة هو أداة تتمتع بالمرونة يمكن تكيفها بسهولة للاستجابة للاحتياجات الناشئة بسرعة. ومع ذلك في غياب التمويل الكافي وزيادة ملكية الحكومة العراقية فإن المكاسب التي حققها برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وشركائه في مناطق أخرى من العراق يمكن أن تضيق بسبب عدم الاستقرار والإحباط وخيبة الأمل. منذ إنشائه في عام ٢٠١٥، حشد برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ١,٥٢ مليار دولار أمريكي من ٣٠ جهة مانحة. مع إغلاق برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في شهر كانون الأول ٢٠٢٣ وكجزء من إستراتيجيته الانتقالية، ستكون الأهداف الرئيسية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة هي مواصلة تنفيذ الأنشطة الرئيسية التي تدعم احتياجات الاستقرار المهمة المتبقية عبر القطاعات، لا سيما في المواقع والسكان التي يصعب الوصول إليها، ودعم الحكومة العراقية من أجل (١) الحفاظ على المكاسب التي حققها برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وحمايتها و (٢) تولى احتياجات الاستقرار المتبقية.

في شهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠ صادقت الحكومة العراقية والشركاء الدوليون على تمديد عمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة لمدة ثلاث سنوات مع تقديم طلب لتخصيص مبلغ ٦٦٠ مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات ذات الأولوية المتبقية في المحافظات التي تم تحريرها من تنظيم داعش وهي الأنبار وديالى وكركوك ونيوى وصلاح الدين.

يشمل التفويض الممنوح لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة على ما يلي:

- التركيز على المناطق التي واجهت صعوبات في عودة النازحين.
- إعادة تأهيل البنى التحتية التي تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- أنشطة سبل العيش المستدامة التي تعزز فرص العمل.
- تعزيز تعميم مبادئ حقوق الإنسان، والاستدامة البيئية، ومراعاة النزاعات، والمساواة بين الجنسين في جميع قطاعات العمل.
- استراتيجية خروج واضحة في عامها الأخير ٢٠٢٣ وتسليم ملكية تنفيذ أنشطة تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط والمتوسط إلى الحكومة العراقية.

يعتمد برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في تنفيذ ٩٥٪ من مشاريعه على القطاع الخاص المحلي مما يقلل التكاليف، ويدعم الاقتصادات المحلية ويخلق فرصاً مدرة للدخل. تشرف فرق هندسية مكونة من مهندسين محترفين من الذكور والإناث على تنفيذ أعمال البنية التحتية. حيث يشرفون على الأعمال، ويحافظون على مراقبة الجودة ويتأكدون من اتباع بروتوكولات

٣. عام من التقدم والتكيف المستمر

ويظل تعزيز القدرات الحكومية لضمان استدامة مكاسب الاستقرار أولوية رئيسية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. ويتحقق ذلك من خلال استعادة الأصول العامة ذات الأهمية الحاسمة لأداء المهام الحكومية الأساسية وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين على المستوى المحلي. في الواقع، منذ بداية عام ٢٠٢٢، كان أحد مجالات التركيز المهمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو تعزيز القدرات الحكومية للحفاظ على المكاسب التي حققتها برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وتولي الحكومة أجندة أعمال تحقيق الاستقرار. وعلى مدار العام، زادت النتائج في هذا المجال تدريجياً وبسرعة لتحقيق ٩،٤٦٥، فرصة تراكمية لبناء القدرات للمسؤولين والموظفين الحكوميين بحلول نهاية عام ٢٠٢٢. وهذا يتجاوز بالفعل الأهداف السنوية لعامي ٢٠٢٢ (١،٥٠٠) و ٢٠٢٣ (٣،٥٠٠) لدعم القدرات «التدريبية».

الإنجازات الرئيسية

تميز عام ٢٠٢٢ بإنجازات رئيسية استمرت في دعم استعادة الخدمات الأساسية وخلق فرص كسب العيش وتعزيز التماسك المجتمعي لمجتمعات بأكملها في جميع أنحاء المحافظات الخمس المحررة.

وفي الأنبار، أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعادة تأهيل مستشفى العبيدي العام الواقع في ناحية العبيدي بقضاء القائم. وكجزء من الأعمال، تم تركيب مصنع للأكسجين الطبي، بالإضافة إلى مولدات ٧٥٠ كيلو فولت، وأنظمة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وقاعات عمليات، وخزان مياه سعة ٥٢ كيلو غراما مع مضخات. كان المستشفى يعاني من نقص الأكسجين الطبي خلال جائحة كوفيد-١٩ ويكافح من أجل تلبية احتياجاته. وفي الوقت نفسه، يسر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدريب الموظفين التقنيين على تشغيل مصنع الأكسجين وصيانته. خلال أيام التدريب، اكتسب المتدربون تعليمات ومعلومات مستفيضة.

يقول السيد خالد السلماني النائب الإداري «كنتيجة لتجهيز المصنع وتدريب الكوادر الفنية لا يقوم مستشفى العبيدي بتوفير الأكسجين الطبي لمرضاه فحسب، بل يتم توزيع أسطوانات الأكسجين على الوحدات الطبية التابعة للجيش العراقي ومنظمة داري وحالات الحجر المنزلي لكوفيد-١٩».

منذ عام ٢٠٢١ وبعد تحرير العراق من احتلال داعش، تقود الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود تحقيق الاستقرار المدني باستخدام برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة كوسيلة أساسية لتهيئة الظروف اللازمة للنازحين داخليا للعودة وإعادة بناء حياتهم بكرامة وسلام. ومنذ ذلك الحين، يمهد النهج المتكامل لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الطريق لتعافي شامل ومستدام في مرحلة ما بعد الصراع في العراق. من خلال الجمع بين جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الكبيرة عبر القطاعات الرئيسية، مثل التعليم والكهرباء والصحة والإسكان والخدمات البلدية وشبكات الطرق والجسور والصرف الصحي والمياه إضافة إلى التدخلات الاجتماعية والاقتصادية الفورية والمتوسطة الأجل لدعم سبل العيش ودعم قدرات الحكومات المحلية وكذلك مبادرات التماسك المجتمعي وبناء السلام.

بين ١ كانون الثاني/يناير و١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، أنجز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ١٥٤ مشروعاً (١٥،٣٠٠ منذ عام ٥١٠٢) في جميع قطاعات التدخل وفي المحافظات الخمس المحررة وهي الأنبار وديالى وكركوك وبنين وصلاح الدين (الشكل ٤) بقيمة إجمالية قدرها ٨١١ مليون دولار أمريكي (٤،٨٤٩ مليون دولار أمريكي منذ عام ٥١٠٢)، مما أدى إلى تقديم حوالي ٨،٤ مليون فائدة (٦،٨٢ مليون منذ عام ٥١٠٢) استفادت النساء من نصفها (الشكلان ٥ و ٦). وهذا يمثل ما يقدر بنحو ٦٤،٨ مليون مستفيد فردي منذ عام ٥١٠٢. وبحلول الفترة الزمنية نفسها، كان هناك ١٠٢ مشروع قيد التنفيذ، و٩٠ مشروعاً في مرحلة الشراء و٥٢٨،١ مشروعاً في طور الاعداد.

وبشكل عام، تظهر نتائج التقدم المحرز (الشكل ٧) أن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة تسير على الطريق الصحيح على الرغم من التحديات السياقية والتنشغيلية التي اتسم بها عام ٢٠٢٢. وفي حالات قليلة، تجاوزت الإنجازات الأهداف المحددة لهذا العام. ويفسر ذلك إلى حد كبير بالاستراتيجية «المحافظة» المتعمدة برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة لتحديد أهداف واقعية بالنظر إلى انخفاض الموارد المتاحة من الشركاء وما يتعلق بذلك من تقليص تدريجي للأنشطة في سياق الاستقرار الحالي في العراق.

١٢ يتم وضع علامة على مشاريع التماسك الاجتماعي، والتي تمتد عبر عدة

محافظات على هذا النحو ويتم الإبلاغ عنها ضمن «مواقع متعددة»

١٣ قد يتلقى الفرد فوائد متعددة من تدخلات المشروع في مختلف القطاعات في

موقع معين. تعتبر الاستفادة من التدخل القطاعي مستحقة للفرد عند الانتهاء من المشروع.

تعتبر المنافع المتأتبة من التدخلات القطاعية المختلفة متنافية ومن ثم فهي مستحقة. بالنسبة

لعملية إعداد التقارير هذه، فإن الفوائد المبلغ عنها هي تلك الناتجة عن المشاريع المكتملة

للبنية التحتية وسبل العيش وبناء القدرات، بالإضافة إلى المشاريع المكتملة والجارية للتماسك الاجتماعي.

الأساسية بالكامل والحفاظ على السلامة والأمن في المنطقة، مما يسهم في تهيئة الظروف السلمية لعودة المشردين داخليا.

كما واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التماسك المجتمعي والإدماج وبناء السلام والقدرة على الصمود ضد منع التطرف العنيف من خلال الوسائل الأفقية والرأسية، والتي ستستمر في دعم أهداف الاستقرار من جميع الاتجاهات. لقد أثبت عام ٢٠٢٢ أنه ضروري للتعامل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفقيين المعنيين. من أجل تعزيز التماسك المجتمعي وبناء السلام والتسامح والتطرف العنيف بنجاح، كان من الضروري المشاركة القوية مع المسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأعضاء المجتمع والآليات لإحداث تغيير مؤثر وشامل ومستدام. من خلال توفير فرص بناء القدرات وتمكين وتعزيز آليات الأفراد والمجتمع، يمكن غرس ممارسات ومبادئ التماسك المجتمعي والتسامح والسلام.

على مر السنين، واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل عن كثب مع حكومة العراق والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية واستعادة الخدمات الأساسية التي تضررت خلال النزاع. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٢، تم تخصيص ١,٥ مليار دولار أمريكي^١ لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ترك هذا المبلغ فجود تمويل تصل الى ٣٨٠ مليون دولار امريكي حيث كان من المخطط ان يحصل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة على تمويل بمبلغ يصل الى ١,٨٨ مليار دولار. ومع إغلاق برنامج إعادة الاستقرار في شهر ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٣ وكجزء من استراتيجية البرنامج الانتقالية، ستكون الأهداف الرئيسية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة هي مواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المهمة عبر القطاعات، بما في ذلك في المواقع والسكان الذين يصعب الوصول إليهم، ودعم الحكومة العراقية من أجل (أ) الحفاظ على المكاسب التي حققتها برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وحمايتها و(ب) تولى احتياجات الاستقرار المتبقية. وستستمر المشاورات المنتظمة مع الشركاء الدوليين لمناقشة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الانتقالية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

واستمر الحوار بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة العراقية في سياق تنفيذ الأهداف الانتقالية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وتسليمها وأحرز تقدماً. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٢، أيدت اللجنة التوجيهية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بالكامل الاستراتيجية الانتقالية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. وكجزء من جهود الحكومة العراقية لتولي جدول أعمال تحقيق الاستقرار، سيتم تشكيل أمانة لدعم

وفي ديالى، تم إعادة تأهيل منتدى بني سعد للشباب والرياضة، مما ساهم في استئناف الأنشطة الاجتماعية والتنمية للفتيان والفتيات في المنطقة. تم تنفيذ المشروع مع إيلاء اهتمام خاص لأهداف الاستدامة حيث اتبعت العديد من مكونات المبنى نهجا صديقا للبيئة مع طموح «إعادة البناء بشكل أفضل». تم تطوير التصميم للتخفيف من استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون. تم تطوير الإضاءة والتدفئة والتهوية بما يتماشى مع الظروف الطبيعية للمبنى. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب نظام شمسي لتوفير إمدادات الطاقة، ونظام لجمع مياه الأمطار لإعادة استخدامها لأغراض الري، وحوايات نفايات مخصصة لزيادة الوعي حول كيفية فصل النفايات عن المصدر الرئيسي، ونظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية، إضافة الى أمور أخرى.

وفي نينوى، تم ترميم مستشفى البعاج. يضم المستشفى الذي يضم خمسين سريرا عدة أقسام وسيقدم الخدمات الطبية لأكثر من ٧٠,٠٠٠ شخص. كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل كلية الهندسة في الشرجات وتم تنفيذ هذا التأهيل من خلال سبعة مشاريع. بعد انجاز هذا المشروع يدرس اكثر من ٢٠٠٠ طالب نصفهم من النساء في الكلية.

خلال عام ٢٠٢٢، أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنجاح ما مجموعه ٨٣ مشروعاً موزعة على قطاعات متنوعة في مدينة الموصل. وقد لعب تنفيذ هذه المشاريع دورا حاسما في العودة المستدامة للنازحين في الموصل. وقد أسفرت إعادة تأهيل ٤,١٩٠ منزلا عن تمكن أكثر من ٣٣,٠٠٠ مستفيد من العودة إلى ديارهم. وبالإضافة إلى ذلك، أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إصلاح أحد المستشفيات المعقدة الرئيسية في الموصل، وهو مستشفى ابن الاثير. ومن المتوقع أن يقدم المستشفى الخدمات الطبية لحوالي ٥٠,٠٠٠ طفل سنويا، وسيوظف حوالي ٤٠٠ من الطاقم الطبي (الأطباء والممرضين) و ٢٠٠ من الموظفين الإداريين.

ولا تؤدي إعادة التأهيل هذه إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال في المنطقة فحسب، بل تساعد أيضاً في الاحتفاظ بالمئات من العاملين الطبيين ذوي المهارات العالية وأعضاء المهن الصحية الأخرى في الموصل.

وفي صلاح الدين، تم إعادة تأهيل مركز التدريب المهني في تكريت. وقد تم بناء المركز في عام ٢٠٠٩ وتضرر جزئياً خلال النزاع، وسيتمكن الآن من دعم العاطلين عن العمل والأفراد المحتاجين لاكتساب المهارات الفنية للانضمام إلى سوق العمل لدعم سبل عيشهم والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبشكل عام، سيستفيد من المركز الآن حوالي ٢,٥٠٠ شخص كل عام. وبالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح مركز شرطة المزرعة في بيجي، الذي احتله تنظيم داعش لأكثر من عامين وتضرر بالكامل أثناء التحرير. وسيتمكن ضباط الشرطة الآن من استئناف واجباتهم

اللجنة التوجيهية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة للقيام بدورها الرقابي فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الانتقالية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. ومع ذلك، لا تزال الاختناقات في الميزانية على مستوى وظائف الإدارة العامة، بما في ذلك على المستوى اللامركزي، تشكل تحدياً لاستدامة إنجازات برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وقدرة السلطات على تولي الملكية الكاملة لجدول أعمال تحقيق الاستقرار والاستمرار في تلبية الاحتياجات المتبقية التي ستبقى للسنوات القادمة بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية وسبل العيش بسبب نزاع داعش.

التحديات

وقد اتسم هذا العام أيضاً بالتحديات التي لا تزال تميز السياق العراقي. تستمر الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي في خلق ضغوط على الأسعار ولا سيما على تكاليف المواد الخام والنقل، مما يدفع المفاولين إلى طلب تعديلات على الأسعار التعاقدية لضمان قدرتهم على الاستمرار في التسليم ضمن هوامش الربح المتوقعة. ومع ذلك، تسببت هذه التغييرات في تأخيرات كبيرة، وتجاوزات في التكاليف، وحتى إنهاء العقود في حالات قليلة.

كما استمر المستخدمون النهائيون في طلب تعديلات التصميم في مناسبات معينة، حتى بعد اعتماد المشروع رسمياً، بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك التغييرات في المتطلبات والاحتياجات غير المتوقعة. أدى دمج هذه التغييرات إلى استثمار مالي وزمني إضافي، مما أثر بدوره على النطاقات الأصلية لبعض المشاريع والجدول الزمنية لإنجازها.

كان التنسيق بين الكيانات الحكومية المركزية والمحلية صعباً في بعض الأحيان، بسبب الاختلافات في الأولويات، ومحدودية التواصل وعدم كفاية آليات التنسيق. وقد أدى ذلك إلى عدم الاتساق في صنع القرار وازدواجية الجهود، وعدم الكفاءة في تخصيص الموارد. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدم كفاية الموارد المالية المخصصة من الحكومة لتشغيل وصيانة أصول البنية التحتية المكتملة التي أعيد تأهيلها بعد عملية التسليم يشكل تحدياً كبيراً. علاوة على ذلك، في حين تم ترميم العديد من المدارس ومرافق الرعاية الصحية، لا يزال التوظيف وتوريد المعدات التي التزمت بها الحكومة يمثل تحدياً، لا سيما في المواقع النائية حيث يجد الموظفون الذين تم تعيينهم هناك حافزاً محدوداً للغاية للبقاء وبالتالي يقررون المغادرة إلى مدينة أكبر. وهذا يقوض استدامة الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.

ولا تزال الظروف الأمنية السيئة في بعض المناطق تخلق صعوبات في الوصول إلى الأنشطة وتنفيذها. كما أن التأخير

في الوصول إلى مواقع المشاريع عن طريق نقاط التفتيش (التي تفرض السماح بالدخول أحياناً)، ووجود الجماعات المسلحة والمليشيات لا يزال يشكل تحدياً. في سهل نينوى، على سبيل المثال، لا تزال قوات الحشد الشعبي تقيد الوصول، وفي بعض الحالات، تمنع الوصول إلى عدد قليل من مواقع المشاريع. ولا تزال التحركات والتأخيرات عند نقاط التفتيش مستمرة أيضاً. ففي الحويجة، على سبيل المثال، بينما يسمح بالوصول للمناطق لكن يتم قضاء ساعات في انتظار الحصول على تصريح من مركز العمليات الوطني في كركوك، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إلغاء زيارات مراقبة المشاريع. وتشمل عوائق الوصول الأخرى وجود الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، والبيئات المادية الصعبة، أو إعاقة وصول الأشخاص المتضررين من النزاع إلى الخدمات والمساعدات. وبالإضافة إلى ذلك، استمر اكتشاف أخطار وجود العووات الناسفة في عدد قليل من مواقع المشاريع تشكل تهديداً للموظفين، وتتطلب إزالة الألغام قبل بدء العمل في الموقع.

هنالك تحديات أخرى تتضمن قضايا الأراضي أو النزاعات والافتقار إلى القوى العاملة المحلية الماهرة لتنفيذ مشاريع نوعية في عدد قليل من المجالات، والإجراءات البيروقراطية الطويلة والمستهلكة للوقت داخل المديرية لإصدار المشاريع. وقد أدت جميعها إلى تعديلات في نشاطات البرنامج والجدول الزمني خلال عام ٢٠٢٢.

وواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطبيق سياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء الفساد والغش والاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش وغير ذلك من أنواع سوء السلوك. واستمر الاتصال بجميع الموظفين والمتعاقدين بشأن كيفية الإبلاغ عن حالات التهديدات والابتزاز وغير ذلك من المخالفات، واستمر إثبات فعالية آليات الاستجابة المضمنة في الهياكل الإدارية العامة لحالات التهديدات الموجهة إلى الموظفين أو المتعاقدين. وواصل البرنامج الإنمائي أيضاً اتباع طرق المتابعة والرقابة المتعدد المستويات أثناء تنفيذ المشروع للتخفيف من مخاطر الفساد أو غيره من أنواع سوء السلوك. في عام ٢٠٢٢، تم تسجيل ثلاث حالات. وأغلقت قضيتان بعد التقييم، وثبتت صحة واحدة وخضعت للتحقيق.

الدروس المستفادة

وقد تم استخلاص العديد من الدروس المستفادة خلال الفترة المشمولة بالتقرير وستستمر هذه الدروس بتشكيل هيكل الاستجابة

١٥ توجد آلية مراقبة قوية ومتعددة المستويات على أرض الواقع خلال مرحلة التنفيذ للإشراف عن كثب على العمل المتعاقد عليه وضمان (١) التقدم في المواعيد الزمنية، (٢) جودة العمل، (٣) الالتزام بمعايير جداول الكميات والمواصفات. تتضمن آلية المراقبة مهندسي FFS والمراقبين المتخصصين والرقابة الحكومية / المستخدم النهائي والمراقبة المتعمقة من طرف ثالث.

البرنامجية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. ومع انتهاء برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٣، سيركز اختيار المشروع على ان يتم انجازه ضمن هذا الإطار الزمني. وهذا يعني أن المشاريع المعقدة مثل المحطات الفرعية ومحطات معالجة المياه والمستشفيات والمعدات الطبية التي تتطلب عملية ضمان جودة داخلية واسعة النطاق، لن يتم تنفيذها في السنة الأخيرة من التنفيذ.

بعد خمس سنوات من العمل على ترميم البنية التحتية الكهربائية، لا يزال نقص توليد الطاقة قضية مركزية في العراق، والتي يجب معالجتها على المستوى الاتحادي. لقد تسببت سنوات من الدمار بسبب النزاع، فضلاً عن سوء الإدارة والإهمال في خسائر فادحة في البنية التحتية للطاقة في البلاد. ألحق إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية أضراراً تقدر بنحو ٧ مليارات دولار أمريكي بالبنية التحتية للكهرباء المتهالكة بالفعل، مما تسبب في خسارة فعلية تبلغ ٧ جيجاوات في قدرات التوليد ونقل الطاقة. لا يزال انقطاع التيار الكهربائي في العراق حدثاً يومياً لمعظم الأسر، حيث إن الطلب المتزايد على الكهرباء قد تجاوز زيادة قدرة التوليد، مدفوعاً بزيادة احتياجات التبريد في أشهر الصيف التي تشتد فيها درجات الحرارة. ويؤدي الطلب المتزايد إلى توسيع هذه الفجوة، حيث ينمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد عن ١ مليون نسمة سنوياً. تستخدم العديد من الأسر مولدات الأحياء المحلية لمعالجة هذه المشكلة، ولكن هذا تدبير مؤقت ومكلف. ونتيجة لوجود الميزانيات المحدودة والأضرار المترامية في هذا القطاع أن العراق لا ينتج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الحاجة المطلوبة التي سوف تزداد للضعف بحلول عام ٢٠٣٠، إن استمرار إدخال مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية يعتبر أمر بالغ الأهمية وسيظل يمثل إحدى الأولويات المهمة لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في سياق ضعف توليد الطاقة في جميع أنحاء البلاد. وقد زاد برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية في المواقع التي أعيد تأهيلها ويتلقى البرنامج طلبات متعددة لتقديم خدمات مماثلة خاصة في المناطق النائية حيث تكون الطاقة متقطعة و / أو منخفضة الجهد.

يعتبر كل من قطاع الإسكان وقطاع سبل كسب عيش من القطاعات التي ينبغي الاستثمار في إعطائهما الأولوية. تضرر قطاع الإسكان بشدة، ليس فقط بسبب الصراع ولكن أيضاً بسبب الافتقار إلى التخطيط الحكومي قبل وقت طويل من صراع ضد داعش. هناك عجز إسكان طويل الأمد في العراق يتفاقم بسبب النمو السكاني السريع. تم بناء معظم المساكن العامة متعددة الطوابق في ستينيات و سبعينيات القرن العشرين وتعتبر قضايا الإسكان من المشاكل التي ابتليت بها المحافظات العراقية. وقفا

لسياسة الإسكان الوطنية لوزارة الإسكان العراقية لعام ٢٠١٠، كان العراق يعاني من نقص في حوالي ١,٤ مليون منزل قبل النزاع، مع الحاجة إلى ٦٧٠,٠٠٠ وحدة سكنية إضافية كل عام لاستيعاب النمو السكاني البالغ ٣,١ في المائة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب عدم وجود سياسة إسكان وطنية والطبيعة غير المنضبطة للتخطيط الحضري. ولا تزال المناطق المستهدفة تتأثر بما يلي: (أ) غياب جهود إعادة إعمار المنازل المدمرة بالكامل أو التي لحقت بها أضرار بالغة، و(ب) التعويضات غير الثابتة التي تمولها الحكومة، (ج) استبعاد أصحاب المنازل المرتبطين بتنظيم داعش من جهود إعادة تأهيل المساكن. وفي الموصل وحدها، تشير التقديرات إلى أن حوالي ٢٢,٧٥٠ منزلاً لا تزال مدمرة بالكامل، مع تضرر ١٣,٠٠٠ منزل آخر بنسبة تقل عن ٦٠٪.

١٦ راجع برنامج إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «أولويات ٢٠٢٣-٢٠٢٢: خطورة الشروط ونتائج التقييمات»، يوليو ٢٠٢٢.




زود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محافظة الأنبار بـ ١٨ شاحنة حمل لضمان التشغيل السلس للخدمات التي تقدمها البلدية مثل أعمال الطرق والصرف الصحي وإصلاح المياه والكهرباء. ووزعت الشاحنات على مناطق القائم والكرابلة والرمانة وراوة والفلوجة.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.


ولتحقيق التقدم في تحقيق أهداف التماسك المجتمعي اصبح من الواضح أن التواصل المباشر مع أفراد المجتمع المحلي هو عنصر أساسي في التدخلات. من خلال العديد من المشاورات المجتمعية وجلسات الحوار التي عقدت بين أفراد المجتمع وممثلي الجهات الحكومية، بدأت تظهر رؤى أكبر حول القضايا المتعلقة بالتماسك المجتمعي وبناء السلام ومنع التطرف العنيف. سيطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرين يقومان بالتركيز على دور وسائل الإعلام العراقية في تعزيز التماسك المجتمعي وسينسق جلسات الوساطة بين أفراد المجتمع والشرطة وقطاع الأمن بهدف تطوير وتنفيذ مبادرات مجتمعية تساهم في تعزيز السلام والتماسك المجتمعي في اثنتي عشرة بلدة في نينوى وكركوك. وسينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً مشاريع مجتمعية اجتماعية - اقتصادية لتعزيز المجتمعات المحلية عن طريق تعزيز الخدمات العامة.

ولا تزال الزراعة أساسية لاستدامة سبل العيش والأمن الغذائي لا سيما في سياق انخفاض الإنتاج الدولي للمواد الغذائية الرئيسية وما يتعلق بذلك من ارتفاع في الأسعار فضلا عن الظروف المناخية المعاكسة. وسيظل تعزيز هذا القطاع من خلال إعادة تأهيل أصول البنية التحتية الحيوية وإدخال تقنيات جديدة ومستدامة للزراعة والري لتقليل الخسائر في سلة الغذاء أمرا بالغ الأهمية. وقد تم تحديد قطاع الزراعة كأحد مجالات التركيز الرئيسية في إطار محفظة سبل العيش، لأنه يسفر عن آثار إيجابية غير مباشرة تتجاوز الفوائد المباشرة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في هذا الصدد، فإنها لا تعالج بشكل كاف احتياجات الأمن الغذائي والتحديات الراهنة. وسيظل توفير الطاقة النظيفة محوريا للقطاع، لا سيما في القرى النائية حيث الزراعة هي المصدر الرئيسي لكسب العيش، من خلال توفير الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار العميقة لضخ المياه اللازمة لري المحاصيل الموسمية من قبل المزارعين. وستسمح مشاريع الطاقة الشمسية باستئناف الأعمال الزراعية وستسهم في إيجاد حلول دائمة للعائدين.


الشكل ٣. المشاريع المكتملة حسب المحافظة وحسب القطاع، ٢٠٢٢ (إجمالي)

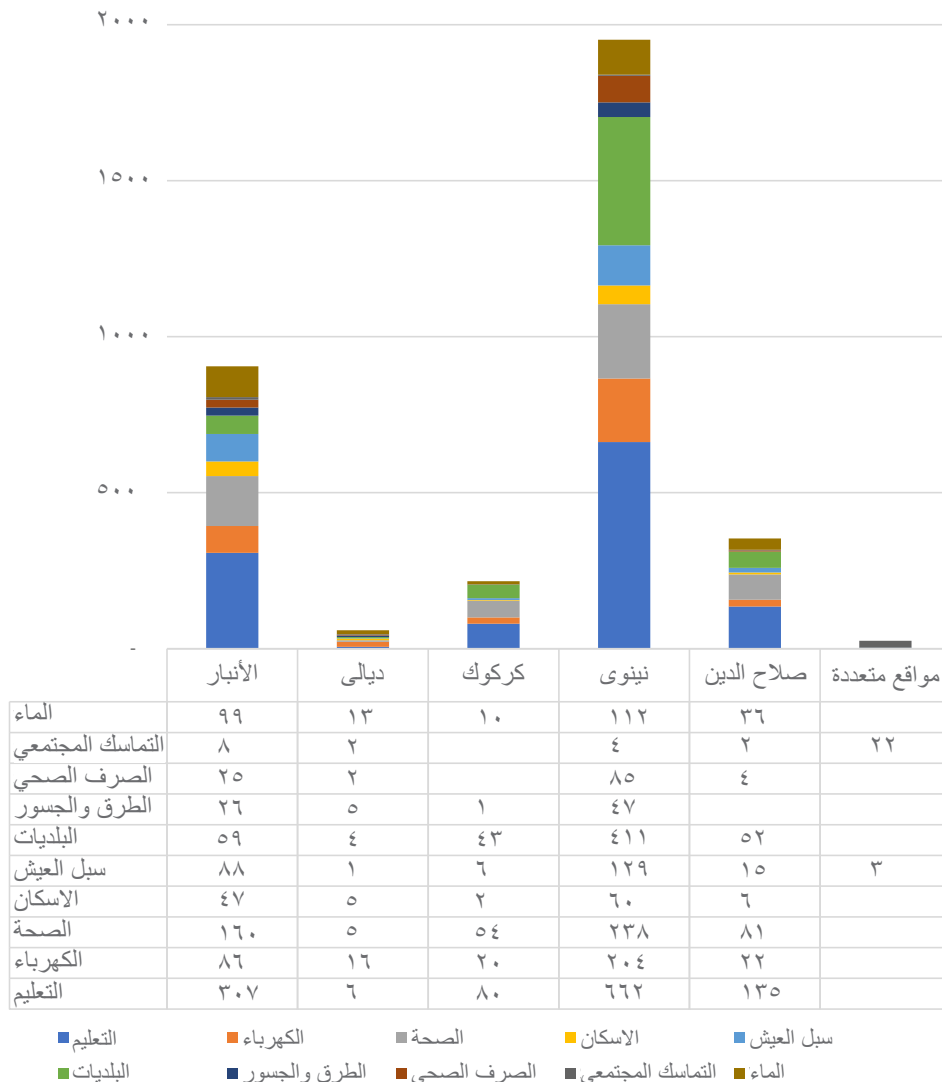


الشكل ٤. المنافع المتراكمة حسب المحافظة ٢٠٢٢

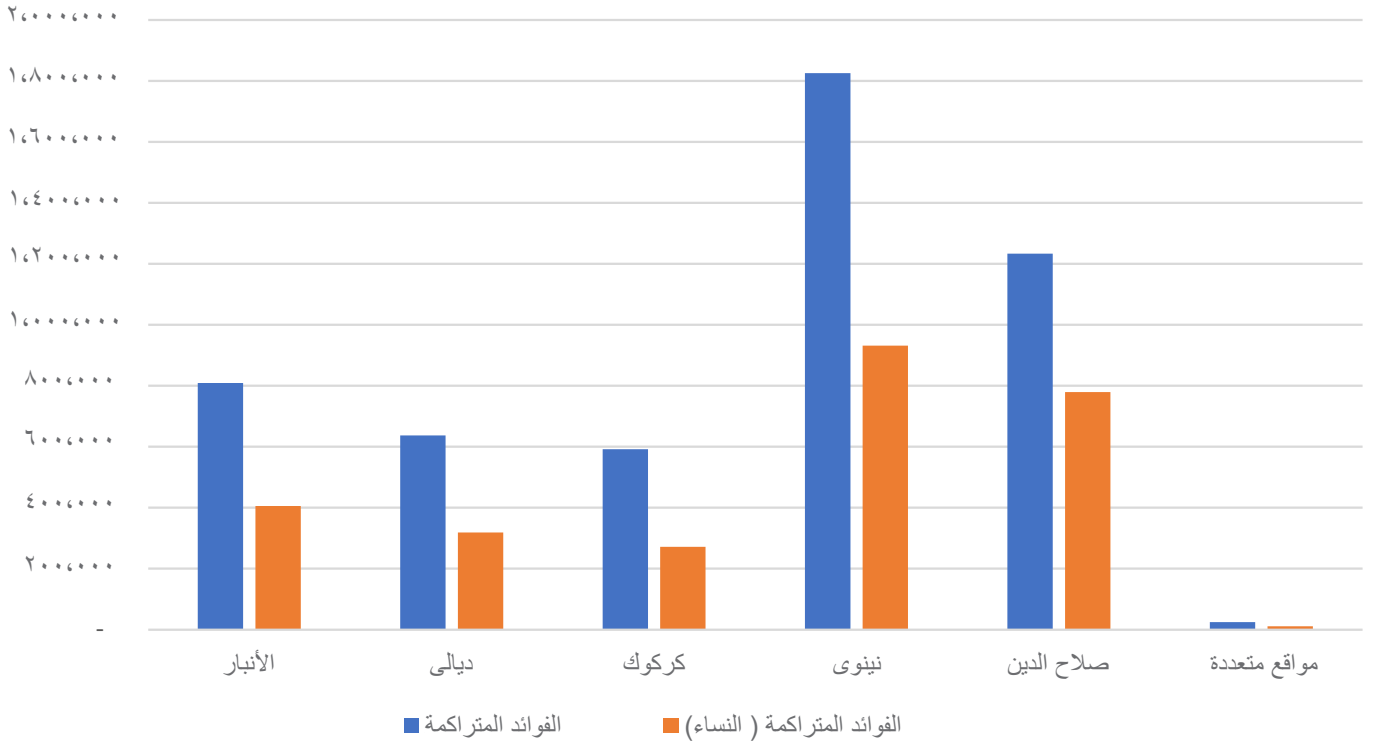

الشكل ٥. المنافع المتراكمة حسب المحافظة ٢٠٢٢ (اجمالي)

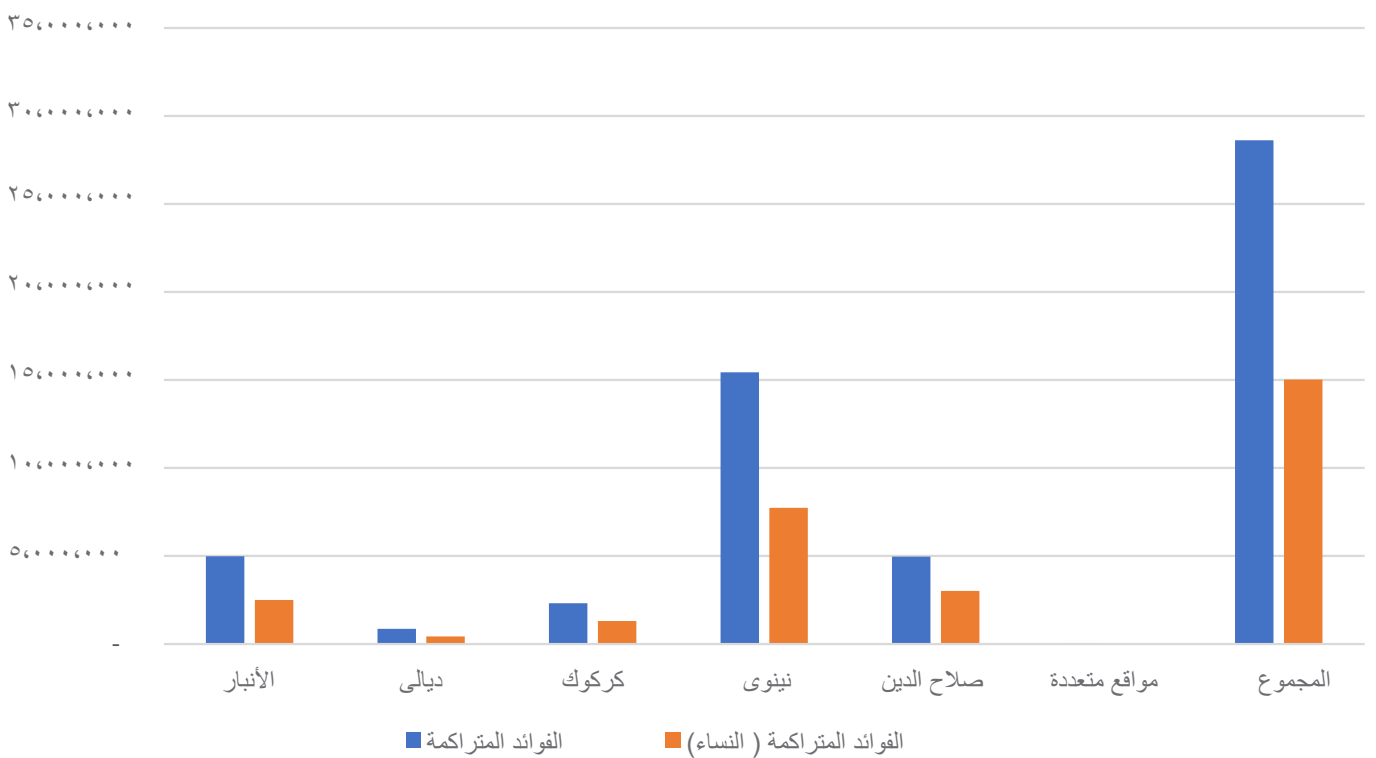

الشكل ٦. الربع الرابع اجمالي التقدم المحرز مقابل الأهداف الموضوعه لعام ٢٠٢٢

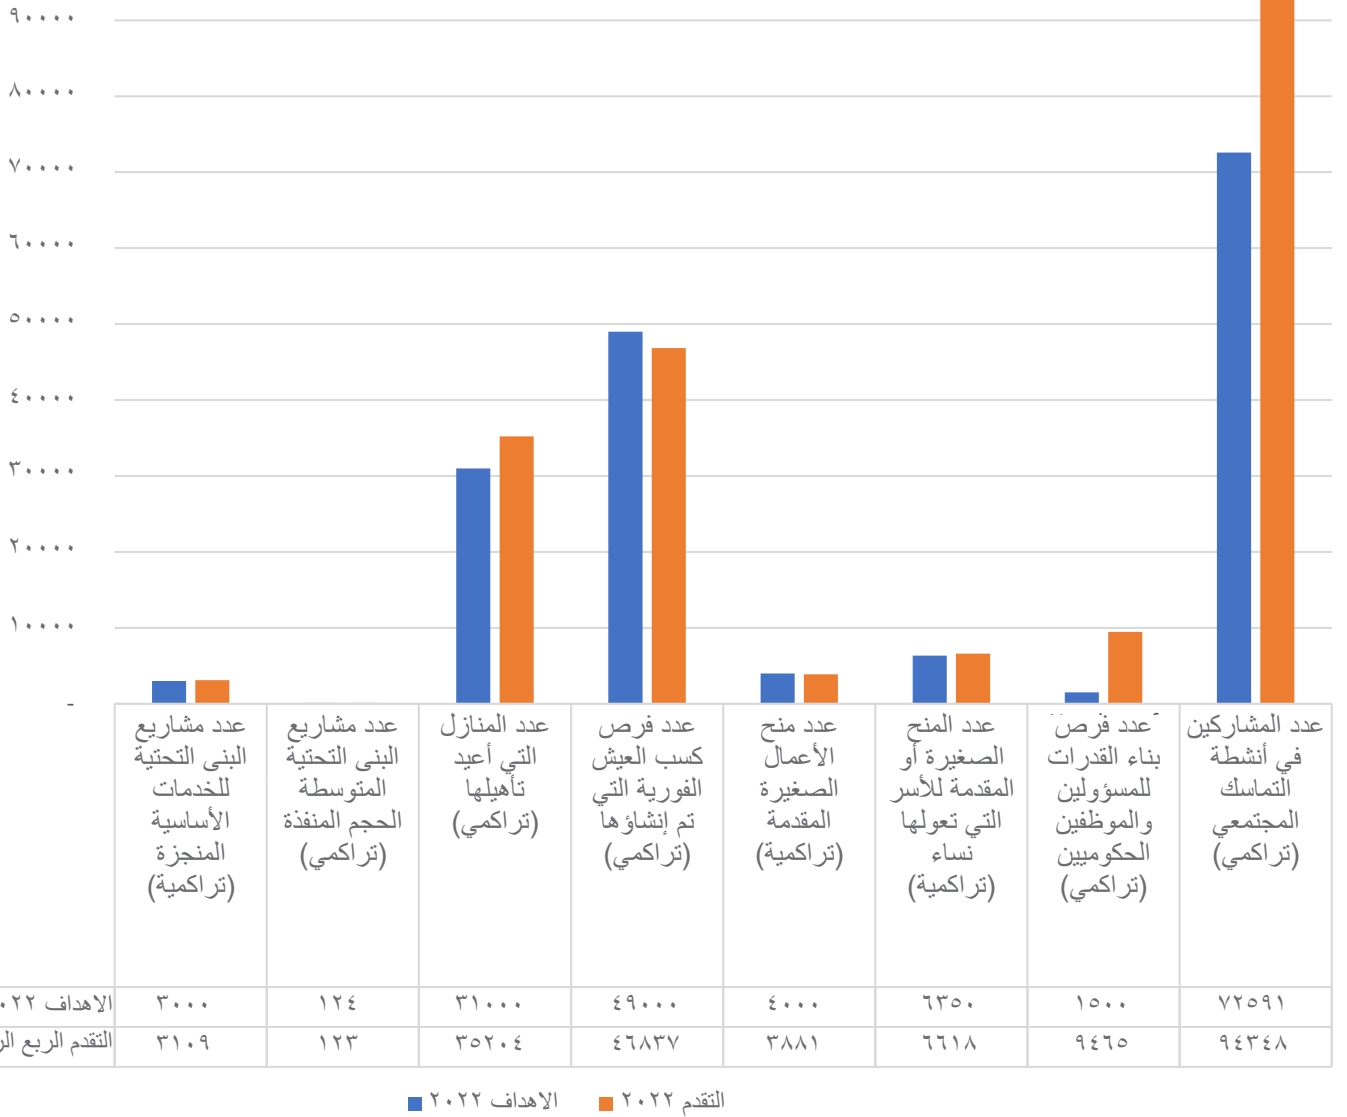


٤. النتائج حسب المحافظة


المدرجة في الجداول أدناه، يتم عرض النتائج في النافذة ٤ بشأن التماسك المجتمعي بشكل منفصل حيث إن المشاريع والمبادرات عادة ما تشمل عدة محافظات.

يقدم هذا القسم تفاصيل عن التقدم المحرز في المحافظات الخمس وهي الأنبار وديالى وكركوك ونيوى وصلاح الدين عبر النوافذ الأربعة وبعض أبرز الإنجازات. باستثناء الأرقام الإجمالية

الشكل ٧. المشاريع المنجزة حسب المحافظة ٢٠٢٢

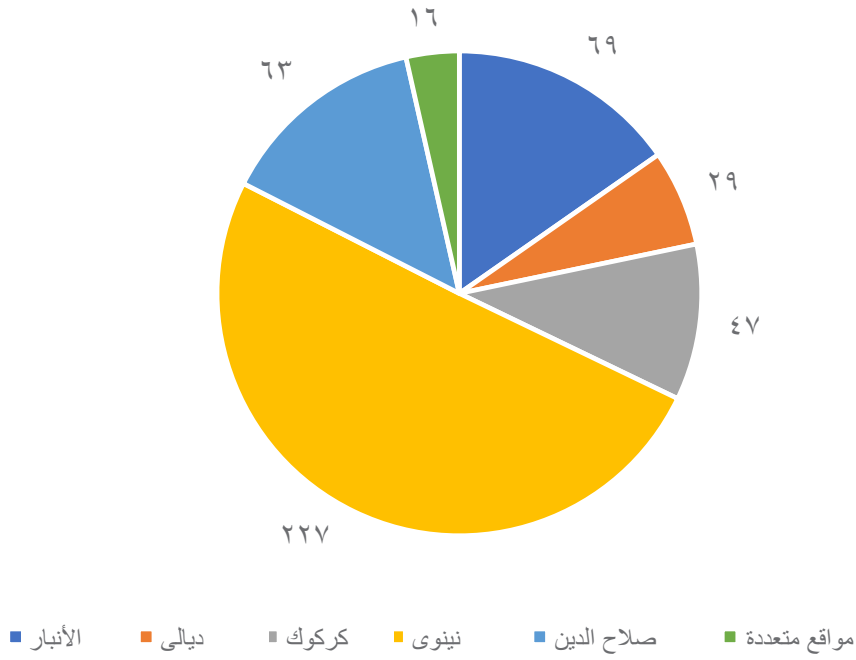

الشكل ٨. المشاريع المنجزة حسب المحافظة ٢٠٢٢ (تراكمي)

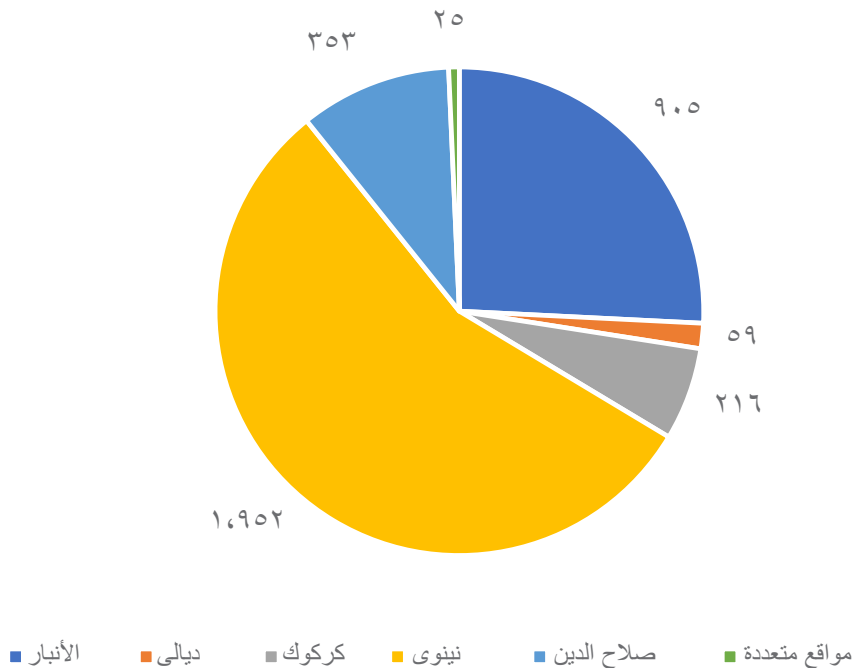



يحضر مولود ياسر محمد دورة تدريبية بمجال الحدادة في المركز التدريبي المهني في الانبار

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.

١,٤ الأنبار



بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ٦٩ مشروع في الأنبار بقيمة إجمالية قدرها ٢٠,٦ مليون دولار أمريكي نتج عنها ٨٠٩,٢١٥ فائدة من عدد استخدام هذه المرافق منها ٤٠٥,٢٥٧ فائدة للنساء والفتيات. تجاوز عدد السكان المقدر الذين استفادوا من مشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة المنجزة في الأنبار منذ عام ٢٠١٥ هو ١,٤ مليون مرة من عدد الاستفادة. وبحلول نفس الفترة الزمنية، كان هناك ٥٥ مشروعاً قيد التنفيذ و ٣٤ في مرحلة الشراء و ٥٦٣^{١٨} في مرحلة الإعداد.



الجدول ١. ملخص النتائج في الأنبار ٢٠٢٢

القطاع	المشاريع المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	عدد المستفيدين	عدد المستفيدين (النساء)
التعليم	٦	١,٦٣٣,٨٠٣	٨,٧٤٢	٤٩٩٣
الكهرباء	٨	٤,٤٠٢,٩٩٠	١٢٧,٠٠٠	٦٣,٥٠٠
الصحة	٣٢	٤,٠٤٦,٥٠٨	٣٧٢,٥٥٠	١٨٦,٣٠٠
سبل العيش	٣	١,٠٢٣,١٣١	٢١٥	٢٠٠
الاسكان				
خدمات البلدية	٦	٣,٣٢٨,٤٦٨	١٣٣,٠٠٠	٦٦,٥٠٠
الطرق والجسور	١	٦٨١,٧٢٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠
الصرف الصحي	١	١,٣٠٥,٦٣٥	٢٣,٠٠٠	١١,٥٠٠
التماسك المجتمعي	٣	٢,٨٦٩	٥٨	٢
المياه	٩	٤,١٤٠,٥٠٠	١٣٤,٦٥٠	٦٧,٢٦٢
العدد الكلي	٦٩	٢٠,٥٦٥,٦٢٣	٨٠٩,٢١٥	٤٠٥,٢٥٧

الجدول ٢. ملخص النتائج في الأنبار (التراكمي)

القطاع	المشاريع المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	الفوائد المتراكمة	الفوائد المتراكمة (نساء)
التعليم	٣٠٧	٦٩,٢٨٢,٢٦٢	١٦٥,٠٣٦	٧٦,٣٠٨
الكهرباء	٨٦	٤٨,٢٠٥,٧٣٠	١,١١٣,٩٢٦	٥٧٦,٧٥٥
الصحة	١٦٠	٣٩,٣٥٠,٧٨٣	١,٤٢٩,٦٥٠	٧١٤,٩٢٥
الاسكان	١٦٠	٣٩,٣٥٠,٧٨٣	١,٤٢٩,٦٥٠	٧١٤,٩٢٥
سبل العيش	٨٨	٢٨,١٩٤,١٢١	١٧,٨٥٨	٦,٧٨٧
خدمات البلدية	٥٩	٢٢,٦٣٠,٩١٣	١٩٨,٩٥٠	٩٦,٦٢٢
الطرق والجسور	٢٦	٣٢,٢٠٣,٢٧٨	٣٤٤,٠٠٠	١٧٢,٠٠٠
الصرف الصحي	٢٥	٦,٨٩٤,٠٥٣	١٦٩,٥٧٧	٨٤,٧٥٤
التماسك المجتمعي	٨	١١٣٨,٤٨	٢,٢٧٠	٩٠٢
المياه	٩٩	٣٤,٥٩٠,٥٥٩	١,٤١٢,٩٩٧	٧٠٤,٦٧٧
العدد الكلي	٩٠٥	٣١١,٣٠٤,٦٩٧	٤,٩٨٧,٩٩٢	٢,٥٠٤,١٠٥

النافذة ١. الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنية التحتية

- تم إنجاز ٦ مشاريع استفاد منها ٢٤٧,٨ طالبا / موظفا، نصفهم من الفتيات والنساء.
- تم الانتهاء من البوابة الرئيسية والطرق الداخلية والسور لمجمع كليات السكنية التابع لجامعة الفلوجة وتجهيز المختبرات.
- تم تأهيل مدرسة المجاهد العربي الابتدائية للبنات والبنين (٨١ صف دراسي) في الشهابي بالكرمة، ومدرسة اليقظة الثانوية للبنات ومدرسة راوة الصناعية.

التعليم

- تم الانتهاء من ما مجموعه ٨ مشاريع استفاد منها ٧٢١,٠٠٠ شخص في المحافظة، من بينهم ٣٦,٠٠٥ امرأة وفتاة.
- استهدف أحد المشاريع إعادة تأهيل مبنى قطاع توزيع الكهرباء في الرمادي، بينما استهدفت ٧ مشاريع أخرى إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمغذيات في العديد من المجتمعات بما في ذلك (أ) ناحية البو طيبان في قضاء هيت، (ب) حيي الحارة والموظفين في قضاء الرطبة، (ج) ناحية الوفاء في الرمادي، (د) مناطق الشهيد والملعب والزهور في ناحية العامرية، (د) منطقة الهاسة والقرى المحيطة بها في عنه، (ذ) أحياء مختلفة في قضاء الخالدية في الحبانية، (ر) منطقتي المسالمة والنعيمية في الفلوجة.

الكهرباء

- تم الانتهاء من ٢٣ مشروعاً يستفيد منها ٥٥٥,٢٧٣ شخصا، و ٦٨١,٠٠٣ امرأة.
- تم إنجاز مشروعين لإعادة تأهيل مباني المرافق الصحية مثل مركز الأطراف الصناعية في الفلوجة، في حين استهدفت ٦ مشاريع أخرى المستشفيات، مثل إعادة تأهيل عيادتين استشاريتين خارجيتين للولادة، واحدة في مستشفى الكرامة وواحدة في مستشفى الرمادي التعليمي للنساء والأطفال، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مستشفى العبيدي العام في القائم.
- كما أنجز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ٤ مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك مؤسسة البو علي الجاسم الفرعية في الرمادي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية الفرعية للطربولية في الخيرات، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية الفرعية لبني زيد القديمة في الكرامة، وعبادة القائم للصحة العامة.
- أنجز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ٨١ نشاطا إضافيا شملت توريد الأثاث والمعدات للعديد من المرافق الصحية. ومن بين إجمالي ٨١ مشروعاً، كان هناك ١١ مشروعاً تقوم بشكل رئيسي بتوريد الأثاث لمختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وهي مركز العامرية للرعاية الصحية الأولية، ومركز الرعاية الصحية الأولية الرئيسية لالتهاب الكبد في الفلوجة، ومركز أبو الجبر للرعاية الصحية الأولية، و مركز الجافة للرعاية الصحية الأولية في الفلوجة، ومركز الجميلة الفرعية للرعاية الصحية الأولية في الفلوجة، و مركز الأيس الفرعي للرعاية الصحية الأولية، ومركز التبولة للرعاية الصحية الأولية في الكرامة، ومركز الظفر الصحية الأولية في الفلوجة، ومؤسسة بني زيد للرعاية الصحية الأولية القديمة في الكرامة، ومركز الزوية الصحي الفرعي. ومركز البو علي جاسم للرعاية الصحية الأولية.
- كما قدم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة معدات طبية ل ٧ مرافق صحية، بما في ذلك مركز شط العرب الفرعي للرعاية الصحية الأولية في القائم، ومركز السكرية للرعاية الصحية الأولية في عنه، ومركز كونلا الفرعي للرعاية الصحية الأولية في القائم، ومركز الربوط الفرعي للرعاية الصحية الأولية في القائم، ومركز الباجوز الفرعي للرعاية الصحية الأولية في القائم، ومركز السجر للرعاية الصحية الأولية في الكرامة.

الصحة

- لا يوجد

الاسكان

- تم الانتهاء من جسر الشيحة في الفلوجة. ويستفيد من المشروع ما يقرب من ١٠,٠٠٠ من سكان المنطقة نصفهم النساء والفتيات.

الطرق والجسور

الصرف الصحي.

- تم الانتهاء من إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار في الجبيل (المنطقة ب) في حي الخضراء في الفلوجة. وسيستفيد من ذلك حوالي ٢٣،٠٠٠ من سكان المنطقة نصفهم من النساء والفتيات.

الماء.

- تم إنجاز ٩ مشاريع يستفيد منها أكثر من ٠٥٦،٤٣١ شخصا، بما في ذلك ٢٦٢،٧٦ امرأة. وشملت هذه المشاريع إعادة تأهيل مبنى مديرية المياه، وشبكات المياه، ومحطات معالجة المياه، وتوريد الأثاث والمعدات.

النافذة ٢. المساعدة على مستوى المعيشة والتشغيل

- تم إنجاز ٣ مشاريع منها النقد مقابل العمل، والتدريب المهني، وإعادة تأهيل مصنع الأسمدة العضوية، وقاعة التدريب، ونظام الطاقة الشمسية في حديثة. وهذا سيدعم الأنشطة الزراعية في المنطقة.

النافذة ٣. دعم القدرات للبلديات

- استفاد ٤،٧٣٨ موظفا حكوميا، من بينهم ٦٦١ امرأة، من أنشطة التدريب على بناء القدرات. استهدفت الدورات التدريبية قطاعات متعددة في المحافظة، مثل التعليم والزراعة والكهرباء والبلدية والمياه والطرق والجسور وغطت مجموعة واسعة من الموضوعات مثل إدارة المشاريع ودراسة الجدوى وتكنولوجيا المعلومات. وستضمن هذه الدورات التدريبية استدامة تدخلات برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال تزويد المستخدمين النهائيين بالكفاءات والمهارات اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية التي أعاد تأهيلها برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بنجاح.

- تم الانتهاء من ٥ مشاريع وهي إعادة تأهيل سوق بلدية القصابين في الحقلانية في حديثة والتي ستوفر فرص عمل مستدامة للجزارة الذين يبيعون اللحوم في هذه المحلات، يستفيد من هذه المشاريع ٢٠،٠٠٠ من السكان. وشملت المشاريع الأخرى التي تم إعادة تأهيلها مصنع الأسفلت البلدي في الرطبة الذي سيساعد في تعبيد الطرق، مما سيستفيد منه ٣٠،٠٠٠ من سكان المياه للوصول إلى طرق موثوقة. كما تمكن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من توفير المعدات الثقيلة لمحافظة الأنبار، بما في ذلك سيارة حمل صغيرة ذات كابينة مزدوجة وشاحنة ورشة متنقلة.

النافذة ٤. المجتمعات السلمية والتماسك المجتمعي

- انظر القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي



يطبق مفيد حميد حسين ما تعلمه من تدريبات معالجة المياه التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كان هو وأكثر من ٣٤٠ عاملاً من مديريات قطاع المياه في الأنبار وديالى وصلاح الدين جزءاً من أنشطة بناء القدرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.

٢,٤ ديالى



وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أنجز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ٢٩ مشروعاً في ديالى بقيمة إجمالية تصل الى ١١ مليون دولار أمريكي ونتج عن هذه المشاريع ٥٩١,٨٢٧ مرة من مرات الاستفادة نتيجة استخدام هذه المشاريع منها ٢٩٥,٤٨٧ استفادة للنساء والفتيات. يقدر عدد السكان الذين استفادوا من مشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة المنجزة في ديالى منذ عام ٢٠١٥ بأكثر من ٢٣٧,٥٠٠ نسمة. وبحلول الفترة الزمنية نفسها، كان هناك ٢٩ مشروعاً قيد التنفيذ، و٤ مشاريع في مرحلة الشراء و٣٦٢ مشروعاً في طور الاعداد.



الجدول ٣. ملخص النتائج في ديالى ٢٠٢٢

القطاع	البرامج المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	عدد المستفيدين	عدد المستفيدين (النساء)
التعليم	١	٣٧٥,٠٠٠		
الكهرباء	٧	٤,١٦٣,٦٢٨	١٣٦,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
الصحة				
الاسكان	٥	١,٦٣٠,٠٧٠	٤,٦١٢	١,٩٨١
سبل العيش	١	٣٢٨,٢٥٢	١٣٨	
البلديات	٢	٨٨٩,٧٤٩	١٢٥,٠٠٠	٦٢,٥٠٠
الطرق والجسور	٢	٨٦٤,٧٨٨		
الصرف الصحي	٢	٧٥١,٢٣٤	١٤٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
التماسك المجتمعي	١	٥٨,٧٤٤	٧٧	٦
الماء	٨	١,٩١٩,٠٢٣	١٨٦,٠٠٠	٩٣,٠٠٠
المجموع الكلي	٢٩	١٠,٩٨٠,٤٨٨	٥٩١,٨٢٧	٢٩٥,٤٨٧

الجدول ٤. ملخص النتائج في ديالى ٢٠٢٢ (التراكمي)

القطاع	البرامج المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	الفوائد المتراكمة	الفوائد المتراكمة (نساء)
التعليم	٦	٩٩٠,٢٥٥	١,٨٠٠	٩٠٠
الكهرباء	١٦	٥,٧٣٦,٥٩٤	٢٧٧,٠٠٠	١٣٨,٥٠٠
الصحة	٥	٣٨٦,٢٨٠	١٥,٠٠٠	٧,٥٠٠
الاسكان	٥	١,٦٣٠,٠٧٠	٦,٩٠٣	٣,٣٧١
سبل العيش	١	٣٢٨,٢٥٢	١٩٨	
البلديات	٤	١,٣١٠,٦٦٩	١٤٣,٠٠٠	٧١,٥٠٠
الطرق والجسور	٥	٥,٠٦٩,٠٣١	٣٥,٠٠٠	١٧,٥٠٠
الصرف الصحي	٢	٦٣,٤١٧	١٠٣	٦
التماسك المجتمعي	٢	٦٣,٤١٧	١٠٣	٦
الماء	١٣	٢,٧١٩,٣١٥	٢٣٩,٥٠٠	١٢٠,٧٥٠
المجموع الكلي	٥٩	١٨,٩٨٥,١١٦	٨٥٨,٥٠٤	٤٣٠,٠٢٧

١٩ تم اقتراح ٥٢٠ مشاريع (من بين ٣٩٣ مشروعاً قيد الإعداد) على الجهات المانحة للتمويل.

النافذة ١ . الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

- التعليم**
 - تم إنجاز مشروع واحد يسمح لعدة مدارس بالحصول على مقاعد مزدوجة للجلوس اضافة الى السيورات. عدد المستفيدين من المشروع يتجاوز آلاف الطلاب.
- الكهرباء**
 - تم إنجاز ما مجموعه ٨ مشاريع، استفاد منها ١٧٧،٠٠٠ شخص، نصفهم تقريبا من النساء والفتيات.
 - شملت ٣ مشاريع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في القرى، بما في ذلك أم الكرامي ١، وأم الكرامي ٢، وأعيان ليلة الدهيم في قضاء الخالص. ١ مشروع تضمن توريد مواد وقطع غيار للورشة الفنية لمديرية الكهرباء في ديالى، و٤ مشاريع ركزت على توريد المحولات لمناطق مختلفة (٧٨٢ محول كهربائي بسعة ٠.٥٢ كيلو فولت امبير و٠.٠٢ محول كهربائي بسعة ٠.٠٤ كيلو فولت امبير).
- الصحة**
 - غير متوفر
- الاسكان**
 - في المجموع، تم إنجاز ٥ مشاريع استفاد منها ٦،١٦٩ نسمة بما في ذلك ٣،٠٣٤ امرأة. وتوزعت هذه المشاريع بين المجتمعات المحلية والمناطق الريفية المختلفة في المقدادية. تم تأهيل ١٠٠ وحدة سكنية في قرى الصخر والنوفل بالإضافة إلى ١٠٥ وحدة سكنية في قرية بني ويس بالسعدية. كما تم تأهيل ١١٦ وحدة سكنية في المناطق الحضرية بأحياء السعدية منها الزهور والزيتون والسلام والنور، فضلا عن ١٠٣ وحدات سكنية في أحياء الأمين والربيع وحي سعد.
- الطرق والجسور**
 - غير متوفر
- الصرف الصحي**
 - غير متوفر
- الماء**
 - تم الانتهاء من ٩ مشاريع في قطاع الماء. ويشمل ذلك توريد و تنصيب المعدات وكذلك إعادة تأهيل شبكات المياه، بما في ذلك خط المياه ٥٠٠ ملم لمجمع المياه في ناحية بهرز اضا في الى مشاريع أخرى. يستفيد من هذه المشاريع ال ٩ الآن ١٨٨،٠٠٠ فرد، نصفهم من النساء و الفتيات.

النافذة ٢ . المساعدة على مستوى المعيشة والتشغيل

- تم الانتهاء من مشروعين للنقد مقابل العمل لدعم ترميم الأماكن العامة والحدائق في الخالص وفي السعدية / خانقين. ووفرت فرص عمل قصيرة الأجل ل ٨٩١ فردا.

النافذة ٣ . دعم القدرات للبلديات

- استفاد ٢،١٣٠ موظفا حكوميا، من بينهم ٦٩٣ امرأة، من أنشطة التدريب على بناء القدرات. واستهدفت الدورات التدريبية قطاعات متعددة في المحافظة مثل التعليم والزراعة والكهرباء والبلدية والمياه والطرق والجسور، وغطت مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك إدارة المشاريع ودراسة الجدوى وتكنولوجيا المعلومات. وستضمن هذه الدورات التدريبية استدامة تدخلات برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال تزويد المستخدمين النهائيين بالكفاءات والمهارات اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية التي أعاد تأهيلها برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بنجاح.
- تم الانتهاء من مشروعين يساهما في إعادة تأهيل ملقحي الشباب والرياضة في بني سعد والمقدادية.

النافذة ٤ . المجتمعات السلمية والتماسك المجتمعي

- انظر القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي



يعد منتدى شباب المقدادية، وهو أحد المباني الخضراء الأولى التي تعمل بالطاقة الشمسية في ديالى، بمثابة متنفس لسكان بعقوبة البالغ عددهم ٧٥,٠٠٠ نسمة للالتقاء والمشاركة والاستمتاع بنشاطات مثل الرياضة والشعر. كما تم تجهيز المنتدى بنظام مستدام لجمع مياه الأمطار، مما يمكنها من توفير ٢٥٪ من تكاليف المرافق سنويا.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.

٣,٤ كركوك



وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أنجز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ٤٧ مشروعاً في كركوك بقيمة إجمالية قدرها ٦,٧ مليون دولار أمريكي، مما أسفر عن ٥٩١,٧٣٤ فائدة، منها ٢٧١,٦٢١ فائدة مستحقة للنساء والفتيات. ويقدر عدد السكان الذين استفادوا من مشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة المنجزة في كركوك منذ عام ٢٠١٥ بأكثر من ١,٤ مليون نسمة. وبحلول الفترة الزمنية نفسها، كان هناك ٢١ مشروعاً قيد التنفيذ، و ١٤ مشروعاً في مرحلة الشراء و ٨١ مشروعاً في طور الإعداد.

٨١	١٤	٢١	٤٧
طور الإعداد	مرحلة المناقصة	قيد التنفيذ	مكتملة

الجدول ٥. ملخص النتائج في كركوك ٢٠٢٢

القطاع	البرامج المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	عدد المستفيدين	عدد المستفيدين (النساء)
التعليم	١٢	١,٣٨٣,٣٦٩	٢,٥٩٩	١,٠٩٢
الكهرباء	٦	٢,٠٦٦,٩٢٣	١٧٣,٠٠٠	٨٦,٥٠٠
الصحة	٤	٣٠٢,٤٢٠	٦٠,٠٠٠	٩٦,٥٠٠
الاسكان	٢	٩٨٩,٦٧٤	٧٠٠	٣٥٠
سبل العيش				
البلديات	٢٢	١,٧٤٤,٧٩٠	٧٤,٥٥٦	٣٦,٠٢٨
الطرق والجسور	١	٢٣٨,٤٤٦	١١٠,٠٠٠	٦٠,٥٠٠
الصرف الصحي				
التماسك المجتمعي				
الماء				
المجموع الكلي	٤٧	٦,٧٢٥,٦٢٣	٤٢٠,٨٥٥	٣٨١,٩٧٠

الجدول ٦. ملخص النتائج في كركوك ٢٠٢٢ (التراكمي)

القطاع	البرامج المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	الفوائد المتراكمة	الفوائد المتراكمة (نساء)
التعليم	٨٠	٣,٢٩٥,٢٨١	٩,٦٢٠	٣,٤٤٥
الكهرباء	٢٠	٦,٠٩٠,٢٢٥	١,٥٧٢,١٠٠	٧٨٦,٠٥٠
الصحة	٥٤	٢,١٧١,٠٦٦	١٣٣,١٢١	٢٥٠,٠٦٩
الاسكان	٢	٩٨٩,٦٧٤	٧٠٠	٣٥٠
سبل العيش	٦	٢,١٦٧,١٩٣	١,٤٨٤	٢٩٠
البلديات	٤٣	٥,٥٦٥,٩١٨	٢٤٨,٩٠٣	٨٥,٠٢٨
الطرق والجسور	١	٢٣٨,٤٤٦	١١٠,٠٠٠	٦٠,٥٠٠
الصرف الصحي				
التماسك المجتمعي				
الماء	١٠	٣,٨٢٦,٥٣٨	٢٣٩,٠٠٠	١٢٣,٨٠٠
المجموع الكلي	٢١٦	٢٤,٣٤٤,٣٤١	٢,٣١٤,٩٢٨	١,٣٠٩,٥٣٢

٢٠ تم اقتراح ٢١ مشروعاً (٧٦ مشروعاً قيد الإعداد) على الجهات المانحة لتمويلها.

النافذة ١. الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنية التحتية

- التعليم**
 - تم الانتهاء من تأهيل ١٣ مدرسة. وتشمل هذه المدارس ٣ مدارس متكونة من ١٨ غرفة صف و ٩ مدارس متكونة من ٦ غرفة صف وروضة أطفال اضافة الى مدارس أخرى. وقد ساهمت هذه المشاريع بشكل كبير في توفير خدمات التعليم وتشجيع العودة في المناطق المستهدفة. وقد عاد ما مجموعه ٦,٥٩٠ طالبا وانضموا إلى مدارسهم في مجتمعاتهم المحلية.
- الكهرباء**
 - أدى تركيب شبكة الكهرباء وتسليم محطة فرعية متنقلة إلى منطقة الحويجة الصناعية إلى إحياء المنطقة الصناعية، ليس فقط مع افتتاح ورش التصنيع باستخدام المعدات التي تحتاج إلى حمولة ثقيلة مستقرة من الكهرباء ولكن أيضاً الورش الميكانيكية وورش العمل ومطاعم الوجبات السريعة. وهذا يعني أن الحويجة أصبحت أكثر اكتفاء ذاتيا لأنها لم تعد مضطرة للاعتماد على كركوك لتصنيع قطع الغيار ولكن يمكن أن تكون مصنوعة محليا، مما يعني أنها ساعدت المزارعين بشكل مستدام لأنها خفضت تكاليف النقل.
- الصحة**
 - تم الانتهاء من ٤ مشاريع. وتشمل هذه إعادة تأهيل جناح الأطفال في مستشفى الحويجة، وصالة الولادة في الرياض، وقاعة الولادة في الزاب، وتوفير الأثاث والأرفف لمستودع الأدوية في مستشفى الحويجة.
 - لم تكن هناك وحدة العناية بالأطفال في الحويجة قبل انشائها من قبل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. اعتاد المواطنون في الحويجة على اصطحاب أطفالهم إلى مستشفى كركوك لتلقي العلاج. مع اكتمال جناح الأطفال، يتم توفير الخدمات الصحية لجميع الأطفال في الحويجة.
 - وبالمثل، لم تكن هناك صالات للولادة في ناحيتي الرياض والزاب، وكان على مواطني هاتين المنطقتين السفر لمسافات طويلة عندما يكون لديهم حالات ولادة. والآن، مع اكتمال قاعتي الولادة، يتم توفير خدمات صحة الأمومة لأكثر من ١٣٠,٠٠٠ شخص في الرياض والزاب.
 - مع اكتمال مستودع الأدوية في مستشفى الحويجة الآن، أصبح من الممكن الآن تخزين الأدوية وتوزيعها على أقسام المستشفى.
- الاسكان**
 - تم إعادة تأهيل ٣٨٨ منزلا، استفادت منها ٣٨٨ أسرة (٢,٣٢٨ فردا).
 - يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي ٨٠٠٠ منزل لا تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل. وقد ثبت أن إعادة تأهيل المساكن خطوة حاسمة لدعم المشردين داخليا للعودة إلى مناطقهم الأصلية.
- الطرق والجسور**
 - تم تأهيل جسر شميط الذي يربط قضاء الحويجة بناحية الزاب. يتم الآن تسهيل النقل لحوالي ٧٠,٠٠٠ مواطن من الزاب، الذين يمكنهم السفر إلى الحويجة وكركوك عبر نهر الزاب. يمكن لمواطني الزاب الآن السفر بسهولة إلى الحويجة وكركوك، للتسوق والتجارة والذهاب إلى المدرسة، وللمزارعين لنقل وبيع محاصيلهم في مدينة كركوك.
- بناء القدرات**
 - تم تقديم حزم من الدورات التدريبية في كركوك لتدريب الموظفين الحكوميين في مجالات كهرباء تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية وريادة الأعمال النسائية والطب الحيوي والبيئة، لتمكينهم من التعامل مع تشغيل وصيانة الأصول التي أعيد تأهيلها من قبل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. ويبلغ مجموع عدد المتدربين في مجموعات التدريب المذكورة أعلاه ٦٩٠ متدربا (٣٦١ رجلا و ٣٢٩ امرأة).

- تم الانتهاء من تمديد شبكات الأنابيب والتوزيع في سفيرات، مينيلا، جمالية، سليمان الغرب، البرغلية، العريشة، في الحويجة. ومع اكتمال شبكة توزيع المياه، أصبح بإمكان أكثر من ٧,٢٠٠ شخص من ٧ قرى الحصول على المياه الصالحة للشرب. قبل الانتهاء من هذا المشروع، كان الناس معرضين لخطر كبير من الأمراض التي تنقلها المياه.
- تم الانتهاء من إعادة تأهيل محطة البريج للماء بسعة (١٠٠ م^٣ لكل ساعة) في منطقة الرياض الفرعية. ويوفر هذا المشروع المياه الصالحة للشرب ل ١٥,٠٠٠ شخص في منطقة البريج.

الماء.

النافذة ٢. المساعدة على مستوى المعيشة والتشغيل

النافذة ٣. دعم القدرات للبلديات

النافذة ٤. المجتمعات السلمية والتماسك المجتمعي

- انظر القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي



أعيد افتتاح مديرية شرطة زمار ومركز شرطة تحدي ومركز شرطة كيسك في نينوى هذا العام. وستدعم هذه المرافق التي تضررت خلال النزاع ضد داعش، إدارة الشرطة العراقية في إنفاذ القانون والحفاظ على السلامة العامة.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.

٤,٤ نينوى



٤٤٩

طور الاعداد



١٧

مرحلة المناقصة



٥٨

قيد التنفيذ



٢٢٧

مكتملة

وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أنجز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ٢٢٧ مشروعاً في نينوى بقيمة إجمالية قدرها ٦٣,٦ مليون دولار أمريكي، مما أسفر عن ١,٨٢٥,٣٧٢ فائدة حصل عليها المجتمع هناك منها ٩٣١,٦٠٧ منافع حصلت عليها النساء والفتيات. ويقدر عدد السكان الذين استفادوا من مشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة المنجزة في نينوى منذ عام ٢٠١٥ بأكثر من ٣,٧ مليون نسمة. وبحلول الفترة الزمنية نفسها، كان هناك ٥٨ مشروعاً قيد التنفيذ، و ١٧ مشروعاً في مرحلة الشراء و ٤٩٩ في طور الاعداد.

الجدول ٧. ملخص النتائج في نينوى ٢٠٢٢

القطاع	البرامج المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	عدد المستفيدين	عدد المستفيدين (النساء)
التعليم	٤٢	٥,٢٠٥,٢٦٠	٩٨,٠٤٥	٤٩,٦٦٧
الكهرباء	٢٣	٦,٧٩٦,٨١٩	٢٧١,٧٠٠	١٣٧,٧٠٠
الصحة	٣٧	١٤,٨٧٧,١٣٣	٢٩٠,٣٠٠	١٧٠,٤١٥
الاسكان	١٥	١١,٩٢٠,٩٦٢	٣٥,٨٦١	١٠,٧٨٩
سبل العيش	١٣	٤,١٩١,٩٧٠	٢,٤٧٦	١,٢٣٥
البلديات	٨٢	١٤,٢٨٧,٧٣٨	٨٤٥,٠٢٢	٤٢٥,٢٥٤
الطرق والجسور				
الصرف الصحي				
التماسك المجتمعي	٢	١,٦٢٧,٦٠٢	٣١,٦٠٩	١١,٣٣٨
الماء	١٣	٤,٦٥٢,٣٢٥	١٤٦,٧٥٠	٧٣,٥٠٠
المجموع الكلي	٢٢٧	٦٣,٥٥٩,٨٠٨	١,٧٢١,٧٦٣	٨٧٩,٦٣٣

الجدول ٨. ملخص النتائج في نينوى ٢٠٢٢ (التراكمي)

القطاع	البرامج المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	الفوائد المتراكمة	الفوائد المتراكمة (نساء)
التعليم	٦٦٢	٦٨,٦٧٩,٩٦٦	٧٢٤,٥٨٩	٣٠٩,٦٥٦
الكهرباء	٢٠٤	١٤٦,١٧٣,٠٠٨	٣,٧٨٢,٧٠٠	١,٨٧٤,٨٥٠
الصحة	٢٣٨	٥٢,٨٧٢,٦٦٢	١,٧٦٩,٠٠٠	٩٧٩,٠١٠
الاسكان	٦٠	٤٢,٥١٠,١٧٧	١٢٣,٢٤٢	٣٩,٩٢٢
سبل العيش	١٢٩	٥٧,٢٠٦,٤٧٠	٤١,٣١٩	١١,١٦٦
البلديات	٤١١	٥٥,٤١٠,٥٩٣	٢,٤٠١,٠٦٧	١,٢٠٤,٠٨٠
الطرق والجسور	٤٧	١٤,٨٩٥,٨٩٩	٢,٨١٨,٠٠٠	١,٤٤٠,٥٠٠
الصرف الصحي	٨٥	٥,٥٥٢,٦٢٢	١,٠٩٧,٠٤٨	٥٤١,١٠١
التماسك المجتمعي	٤	١,٧٣٩,٠٠٠	٣١,٧٢٨	١١,٣٤٢
الماء	١١٢	٥١,٥٨١,٥٣١	٢,٦٤٥,٨٨٢	١,٣٢٣,٦٢٥
المجموع الكلي	١,٩٥٢	٤٩٦,٦٢١,٩٢٨	١٥,٤٣٤,٥٧٥	٧,٧٣٥,٢٥٢

٢١ تم اقتراح ٢٢١٠٧ مشروعاً (من أصل ٤٤٩ مشروعاً قيد الإعداد) على الجهات المانحة لتمويلها.

النافذة ١ . الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنية التحتية

- التعليم**
 - تم تأهيل وتأثيث ١٨ مدرسة إلى جانب مدرستين مجهزتين بألواح شمسية للاستخدام النهاري كمشروع تجريبي، والذي كان ناجحاً حتى الآن مع صيانة المستخدم النهائي للألواح بشكل جيد.
- الكهرباء**
 - تم الانتهاء من ٨ مشاريع كهربائية، تركز بشكل أساسي على معدات الصيانة والاختبار للحفاظ على المحطات الفرعية ال ١٢ التي تم إنشاؤها على مدار السنوات الست الماضية في مأمّن من الأعطال أو الأعطال الكهربائية
- الصحة**
 - تم الانتهاء من إعادة تأهيل مستشفى ابن الاثير، أحد المستشفيات الرئيسية في الموصل. ومن المتوقع أن يقدم المستشفى الخدمات الطبية لحوالي ٥٠,٠٠٠ طفل سنوياً، وسيوظف حوالي ٤٠٠ من الطاقم الطبي (الأطباء والممرضين) و ٢٠٠ من الموظفين الإداريين. ولا تؤدي إعادة التأهيل هذه إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال في المنطقة فحسب، بل تساعد أيضاً في الاحتفاظ بالمئات من العاملين الطبيين ذوي المهارات العالية وأعضاء المهن الصحية الأخرى في الموصل.
 - تم إعادة تأهيل مستشفى البعاج وتأثيثه وتجهيزه، وإعادته إلى المستخدم النهائي مما يسمح للسكان المحليين البالغ عددهم ٧٠,٠٠٠ نسمة باستخدام الخدمات الطبية.
- الاسكان**
 - تم إعادة تأهيل ٤,١٩٠ منزل في الموصل، مما أدى إلى تمكن أكثر من ٣٣,٠٠٠ مستفيد من العودة إلى منازلهم.
 - تم تجديد ما يقرب من ٥٠٠ منزل في منطقة سنجار، واستهدف أحد المشاريع مجمع دوميز الذي يوازي قرية خالية، وتجديد شبكة المياه، والتوصيلات الكهربائية، والتعليم، والمنازل، مما أدى إلى عودة أكثر من ١٦٠ أسرة إلى موقعها الأصلي.
- الطرق والجسور**
 - غير متوفر
- الصرف الصحي**
 - غير متوفر
- الماء**
 - تم تركيب محطتين لمعالجة المياه، و ٧ شبكات داخل المدن، وأكثر من ٣٨ كم من أنابيب التغذية التي تم تركيبها بعد إعادة تأهيل ١٢ بئراً.

النافذة ٢ . المساعدة على مستوى المعيشة والتشغيل

- تم بناء ٣ بيوت دواجن هذا العام في سهل نينوى، للمساعدة في إحياء تجارة الدواجن، مما سمح لهؤلاء المزارعين بإنتاج ما يقرب من ٤٠٠٠٠ كتكوت كل ٤ أشهر وأخذها إلى السوق ثم بيعها للذبح. وقد سمح ذلك للمفاسق وسوق الدجاج بإعادة التأسيس واستئناف الأعمال.

النافذة ٣ . دعم القدرات للبلديات

- أعيد بناء ٣ مبان قضائية/محاكم، و ٥ مباني للأمن الوطني، و ٤٥ مركز/مديرية للشرطة في جميع أنحاء نينوى، مما ساعد الشرطة على استعادة السيطرة على المناطق من الجيش، وبالتالي إعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق.

النافذة ٤ . المجتمعات السلمية والتماسك المجتمعي

- انظر القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي



أعيد افتتاح مركز التدريب المهني في تكريت هذا العام من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحافظة صلاح الدين، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويعد هذا المرفق مركزاً مهماً للمهارات المهنية في العراق، حيث يقوم بتدريب أكثر من ٢٥٠٠ شخص كل عام.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.

٤, ٥ صلاح الدين



وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أنجز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ٦٣ مشروعاً في صلاح الدين بقيمة إجمالية قدرها ١٢,٨ مليون دولار أمريكي نتج عنها ١,٢٣٣,٠٦٩ فائدة، منها ٧٧٨,٩٤٨ فائدة للنساء والفتيات. ويقدر عدد السكان الذين استفادوا من مشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في صلاح الدين منذ عام ٢٠١٥ بأكثر من ١,٣ مليون نسمة. وبحلول الفترة الزمنية نفسها، كان هناك ٣٦ مشروعاً قيد التنفيذ، و ٢٠ في مرحلة الشراء، و ٣٦٧ مشروعاً قيد الشراء.



الجدول ٩. ملخص النتائج في نينوى ٢٠٢٢

القطاع	البرامج المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	عدد المستفيدين	عدد المستفيدين (النساء)
التعليم	١٥	١,٣٨٢,١٩٤	٨,٢٣٤	٦,٦٨٣
الكهرباء	٦	١,٦١٦,٨٤٥	١٥٠,٤٥٠	٧٥,٢٢٥
الصحة	٩	١,٨٧٧,٧٣٤	١١٢,٠٠٠	٥٦,٧٠٠
الاسكان	٣	٨٤٠,٧٣٨	٣,٤٣٥	١,٦٩٩
سبل العيش	٣	٧٥٢,٣٣٩	٤١٨	٢٣
البلديات	١٨	٢,٤٨٥,٣٨١	٢٧٦,٢٣٠	٢٤٧,٥٠٠
الطرق والجسور				
الصرف الصحي				
التماسك المجتمعي				
الماء	٩	٣,٨٣٨,٤٣٧	٦٧١,٠٠٠	٣٣٥,٥٠٠
المجموع الكلي	٦٣	١٢,٧٩٣,٦٦٧	١,٢٢١,٧٦٧	٧٢٣,٣٣٠

الجدول ١٠. ملخص النتائج في صلاح الدين ٢٠٢٢ (التراكمي)

القطاع	البرامج المكتملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	الفوائد المتراكمة	الفوائد المتراكمة (نساء)
التعليم	١٣٥	٦,٨٤١,٥٥٨	٧٤,٩١٩	٣٧,٧٥٢
الكهرباء	٢٢	٧,٢٥١,٤٠٠	١,٣٨١,٤٥٠	٦٩٠,٧٢٥
الصحة	٨١	٤٧,٢١٦,٧٠٥	١,٣٨٤,٦٠٣	٦٩٢,٥٢٧
الاسكان	٦	٣,٠١٦,٧٣١	١٠,٠٣١	٥,٠١١
سبل العيش	١٥	٤,٧٦٣,٦٢٤	٢,٨٢٣	١٤٨
البلديات	٥٢	٦,٥١٥,٣٩٤	٩٨٧,٢٤٩	١,٠٢٩,٢٢٧
الطرق والجسور				
الصرف الصحي	٤	٤١٧,٩٥٣	٨٢,٠٠٠	٤١,٠٠٠
التماسك المجتمعي	٢	٩٣,٥٢٦	٢,٥٨٠	١,٢٥٢
الماء	٣٦	١٦,٢٨٦,٩٤٠	١,٠٣٣,٠٠٠	٥١٧,٤٥٠
المجموع الكلي	٣٥٣	٩٢,٤٠٣,٨٣١	٤,٩٥٨,٦٥٥	٣,٠١٥,٠٩٢

٢٢ تم اقتراح ٤٧ ٢٣ مشروعاً (من بين ٣٩٩ مشروعاً قيد الإعداد) على الجهات المانحة للتمويل.

النافذة ١. الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنية التحتية

- تم إنجاز ١٩ مشروعاً استفاد منها ٨،٢٣٤ طالباً، نصفهم من النساء والفتيات.
- تم الانتهاء من تأهيل مركز التدريب المهني في تكريت، بالإضافة إلى توريد وتركيب المعدات والأثاث. سيوفر المركز فرص التدريب لآلاف الشباب والباحثين عن عمل.
- كما شملت تدخلات برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة إعادة تأهيل وتأثيث ٦ مدارس ابتدائية و ٤ مدارس ثانوية، وهي ٣ مدارس ابتدائية في الشرقاط تشمل مدرسة الراشدين ومدرسة ابن سيرين للبنين ومدرسة التواضع للبنين. تقع المدارس الأخرى التي تم تأهيلها وتأثيثها في جميع أنحاء المحافظة بما في ذلك مدرسة الجفار الحار الابتدائية المختلطة ومدرسة تولول الباج الثانوية للبنين ومدرسة الإمام علي الثانوية للبنين.
- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمكن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من دعم كلية الهندسة في الشرقاط من حيث توفير وتركيب طاولات العمل للورش الهندسية، إلى جانب تقسيم مباني الورش وكذلك خدمة أكثر من ٢٧٥٠ طالبا وطالبة من أصل ١٣٠٠ امرأة مستفيدة.

التعليم

- وقد تم إنجاز ما مجموعه ٦ مشاريع استفاد منها ١٣٣،٠٠٠ شخص، نصفهم تقريبا من النساء والفتيات. وشملت المشاريع أ) مشروع إعادة تأهيل مبنى مديرية كهرباء بيجي حيث سيقوم موظفو مديرية الكهرباء، وعددهم ١٥٠ موظفا فنيا وإداريا، بتمكين الموظفين من تقديم الدعم اللازم للسكان المستهدفين في مدينة بيجي على شكل أداء واجبات منتظمة مثل صيانة الشبكات الكهربائية والمحولات ب) ٤ مشاريع لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء في مركز بيجي، في قضاء مكحول وفي القادسية (الكفاءات) في تكريت وفي الديوم في تكريت ج) مشروع يركز على إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي ١١ كيلو فولت أمبير في سليمان بك

الكهرباء

- تم الانتهاء من ٦ مشاريع تتعلق بتوريد الأثاث والمعدات. وتشمل هذه التدابير تركيب المعدات الطبية والمخبرية في بنك الدم في مستشفى تكريت التعليمي، ب) توريد الأثاث في ٥ مراكز رعاية صحية أولية، ج) توريد المعدات الطبية إلى مركز تولول الباج للرعاية الصحية الأولية، ب) تركيب مغذيات الطاقة لمستشفى تكريت التعليمي، ت) توريد وتركيب وحدة لمعالجة النفايات الطبية لمستشفى تكريت التعليمي، و سادسا) توريد وتركيب الأثاث الطبي في مستشفى تكريت التعليمي.
- وتسمح إعادة تأهيل المرافق الصحية ل ١١٢،٠٠٠ من سكان المنطقة، نصفهم من النساء والفتيات بالحصول على الخدمات الصحية.

الصحة

- تم تأهيل ٣٤٢ وحدة سكنية في التأميم في بيجي يستفيد منها ٢٢٤٠ من السكان، نصفهم من النساء والفتيات.
- تم تأهيل ٢٥٣ وحدة سكنية في حيي العسكري وتل الزعتر في بيجي.

الاسكان

- غير متوفر

الطرق والجسور

- غير متوفر

الصرف الصحي

- تم الانتهاء من ٩ مشاريع، بما في ذلك ٧ مشاريع تركز على إعادة تأهيل الأصول المادية للعديد من محطات معالجة المياه وهي وحدة الحمراء المدمجة في بيجي بسعة (١٠٠ م ٣ / ساعة) و محطة الصينية بسعة (٦٥٠ م ٣ / ساعة) و جهاز الضخ والسحب لمحطة المزرعة ومحطة معالجة المياه المركزية في تكريت (٣٢٥٠ م ٣ / ساعة)، محطة معالجة المياه لمركز تكريت بسعة (٥٠٠ م ٣ / ساعة) توسعة وحدة البو جوارى المدمجة في بيجي إضافة الى توسعة وحدة الزوية المدمجة في بيجي. وشمل المشروعان المتبقيان المنجزان إعادة تأهيل واستبدال المرشحات لمحطة محطات التوريد في محطة الطوز - الكفري للمحطات بسعة (٤٠٠٠ م ٣ / ساعة) - المرحلة ٢، وإعادة تأهيل خط إمداد الطاقة في حالات الطوارئ لمحطات الزوية في بيجي.
- ان إعادة تأهيل مرافق المياه تسمح ل ٦٧١،٠٠٠ من سكان المنطقة، نصفهم من النساء والفتيات بالحصول على مياه آمنة ونظيفة للاستخدام المنزلي مثل الشرب والطهي والغسيل.

النافذة ٢ . المساعدة على مستوى المعيشة والتشغيل

- تم انجاز ٣ مشاريع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وشملت هذه المشاريع إزالة الأنقاض من أحياء متعددة في الصينية في بيجي، وإزالة الأنقاض وتطهير الأماكن العامة في التأميم في بيجي، وإزالة الأنقاض لأحياء متعددة (الرسالة والعسكري وتل الزعتر) في بيجي. واستفاد من هذه المشاريع ٨١٤ عاملا غير ماهر، من بينهم ٣٢ امرأة حصلن على فرص عمل قصيرة الأجل.

النافذة ٣ . دعم القدرات للبلديات

- استفاد ٧٨٣ موظفا حكوميا من بينهم ٢٦١ امرأة، من أنشطة التدريب على بناء القدرات. استهدفت الدورات التدريبية قطاعات متعددة في المحافظة، على سبيل المثال، التعليم والزراعة والكهرباء والبلدية والمياه والطرق والجسور وغطت مجموعة واسعة من الموضوعات مثل إدارة المشاريع ودراسة الجدوى وتكنولوجيا المعلومات. وستضمن هذه الدورات التدريبية استدامة تدخلات برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال تزويد المستخدمين النهائيين بالكفاءات والمهارات اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية التي أعادت إعادة تأهيلها برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بنجاح.
- تم توريد وتنصيب الأثاث في مركز التدريب المهني في تكريت. بالإضافة إلى ذلك، تم توريد المعدات إلى مركز التدريب في الشرقاط.
- تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين يستهدفان قطاع الأمن في شكل إعادة تأهيل وتأثيث مديرية شرطة كل من الساحل الايسر ومركز شرطة الساحل الايمن في الشرقاط.
- تم إعادة تأهيل مصنع/مصنع بيجي للأسفلت. وهذا سيمكن البلدية من تعبيد الشبكة الداخلية للطرق.

النافذة ٤ . المجتمعات السلمية والتماسك المجتمعي

- انظر القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي



مؤتمر يتألف من ١٠ مجموعات شبابية ونسائية من أجل السلام من ٥ محافظات
محرة في شباط ٢٠٢٣.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق.

٤, ٦ التماسك المجتمعي

عقب التدريبات المقدمة إلى ٣١٧ منظمة مجتمعية حول بناء القدرات في المحافظات الخمس المحررة بشأن صياغة المقترحات ووضع المشاريع وتنفيذها، تم تنفيذ ٣٥٠ مبادرة مجتمعية بقيادة منظمات المجتمع المدني المحلية حيث تغطي مجموعة من المواضيع حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي. ومع إغلاق هذا المشروع الآن، تم إشراك ما مجموعه ١٠٣٩٥ شخصاً (٤٥٣١ امرأة) من خلال أنشطة مختلفة. كما تم دعم المجموعات النسائية والمجموعات الشبابية ومؤيدي التماسك المجتمعي لتنفيذ مبادراتهم المجتمعية الخاصة. ونفذ ما مجموعه ٥٨ مبادرة من بينها عرض فيلم وثائقي عن الهوية وتعزيز النقاش بشأن التماسك المجتمعي. من خلال مشاركة أعضاء المجموعة والمؤيدين وأعضاء المجتمع المحلي، تم إشراك ٩٠٦٤٤ شخصاً (٣،٨٩٧ امرأة).

دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطوير وتمكين لجان الخدمة المجتمعية في ٣٠ قرية مستهدفة في البعاج والحضر وتل عبطة في محافظة نينوى لمعالجة التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجهها المجتمعات والإجراءات ذات الأولوية التي ينبغي اتخاذها في محاولة لتعزيز عودة النازحين وإعادة إدماجهم وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود ضد التطرف العنيف. ولزيادة تعزيز منع التطرف العنيف وثقافة السلام والتسامح بين مختلف المجموعات، تم تنفيذ ٣٠ مبادرة مجتمعية من قبل أعضاء لجان الخدمة المجتمعية. وفي محاولة لزيادة تعزيز التماسك المجتمعي من خلال أساليب مختلفة، تم دعم ٥ مجموعات من المجتمع المدني والمجتمع المحلي لتصميم وتنفيذ المبادرات وتوزيع المعدات والأثاث على المدارس في القرى المختارة، حيث وصلت إلى أكثر من ٢٠،٠٠٠ طالب وتم توزيع ٣٠ مولدا كهربائيا على القرى المختارة.

لتعزيز الوعي والقدرات المجتمعية في مجال منع التطرف العنيف وممارسة التعايش بين مختلف فئات المجتمع بما في ذلك قبول إعادة دمج الأسر العائدة التابعة لتنظيم داعش والنازحين داخليا، وللتخفيف من أي توترات مستقبلية، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المسؤولين المحليين وقادة المجتمع والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال السلام لمنع التطرف العنيف من خلال التدريبات وجلسات بناء القدرات وتنفيذ المبادرات المجتمعية في المناطق المختارة على أساس مدى التعقيد والهشاشة وخطر التطرف العنيف في محافظات الأنبار وديالى ونيوى وصلاح الدين.

شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل وثيق مع المواطنين الصحفيين والشخصيات الإعلامية ودعمهم من خلال جلسات بناء القدرات حول الصحافة الأخلاقية ومفاهيم التماسك المجتمعي وكيفية التعامل مع خطاب الكراهية ومنع التطرف العنيف من خلال وسائل الإعلام والصحافة. كما نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ١٤ حلقة نقاش مع السلطات الإعلامية الحكومية ومديري المؤسسات الإعلامية والأساتذة الأكاديميين لمناقشة القضايا والتحديات والتوصيات المتعلقة بالمشهد الإعلامي في العراق. وهناك تقرير يفصل دور الإعلام في العراق والعلاقة التي تربطه في المجتمع العراقي هو حاليا في المراحل النهائية من المراجعة والترجمة، ومن المتوقع نشره في أوائل عام ٢٠٢٣. تم تشجيع الصحفيين الشباب المشاركين في التدريبات على نشر المقالات ومقاطع الفيديو والمنتجات الإعلامية الأخرى على موقع تنوع، الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام ٢٠٢١ لتوفير منصة للصحفيين المواطنين وأسفر عن نشر أكثر من ٧٠٠ منتج إعلامي. بالتزامن مع اليوم الدولي للسلام في شهر كانون الأول/ سبتمبر ٢٠٢٢، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهرجان السلام والتعايش للأفلام القصيرة لجمع صانعي الأفلام من جميع أنحاء البلاد لعرض التماسك المجتمعي والسلام. تم تقديم أكثر من ١٥٠٠ فيلم من ١٠٢ دولة مع لجنة تحكيم لاختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لأفضل فيلم قصير وأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل فيلم وثائقي.

لتعزيز عمليات إدارة النزاعات والحوار التشاركية والشفافية بين أفراد المجتمع والسلطات المحلية في محاولة لتحقيق السلام والاستقرار والثقة والتخفيف من أي صراع محتمل واضطرابات مدنية، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز آليات المجتمع المحلي لتمكين المشاركة مع السلطات المحلية من خلال التدريبات على حل النزاعات والحوار والوساطة وكذلك تطوير اتفاقيات السلام المحلية للمصالحة وتنفيذ أنشطة المشاركة في مجتمعات مختارة. وقد شارك في هذه الجهود ما يقرب من ٢٥٠٠ شخص (٦٠١ امرأة) بمن فيهم الزعماء الدينيون وأفراد المجتمع المحلي والسلطات المحلية وأعضاء المجتمع المدني.

لزيادة إشراك ودعم الشباب والنساء في العراق، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمراً مع جميع أعضاء ١٠ مجموعات شبابية ونسائية من أجل السلام من المحافظات المحررة الـ ٥ لمناقشة تأثيرهم في مجتمعاتهم، والتحديات التي واجهوها في تعزيز التماسك المجتمعي، وكيف يمكنهم إحداث تأثير أكبر في مجتمعهم. وفي إطار البرمجة التكميلية في إطار برنامج التماسك المجتمعي، سيدعم البرنامج الإنمائي عملها وتنفيذ المبادرات المجتمعية خلال السنة القادمة.

لاستكمال سلسلة من المؤتمرات للقادة الدينيين من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونيوى، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمراً رابعاً للقادة الدينيين من ديالى لتوفير منصة لمناقشة النهوض بالتماسك المجتمعي والتعايش ومكافحة التطرف العنيف والكرهية، وتشجيع عودة العائلات وإعادة إدماجها في جميع أنحاء المحافظات. ومن خلال البرامج التكميلية، عقد أيضاً مؤتمراً خامساً للزملاء الدينيين من كركوك.

مع انتهاء مذكرة التفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكاديمية فولك برنادوت وسويس بيس هذا العام، عقدت جلستان ختاميتان مع أعضاء لجنة السلام المحلية حول تعميم مراعاة المنظور النوع الاجتماعي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن بناء السلام والوساطة، على التوالي.

٥. الملحق ١. إطار النتائج

النتائج المستهدفة، (الواردة في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ / إطار النتائج والموارد لوثيقة البرنامج القطري ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤):

إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، النتيجة ٣,٢: لقد تحسنت قدرة سكان في العراق والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ولا سيما النساء، على القيادة والمشاركة والمساهمة في تصميم وتقديم خدمات عادلة تلبي الاحتياجات، ولا سيما لفئات السكان الضعيفة.

مؤشرات النتائج،الواردة في إطار النتائج والموارد لوثيقة البرنامج القطري (٢٠٢٠ - ٢٠٢٤)، بما في ذلك خط الأساس والأهداف:

إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، النتيجة ١- ١ : عدد المحافظات التي تستخدم آليات

تتيح للمجتمع المدني المشاركة في جميع جوانب خطط التنمية، من أجل تقديم خدمات عادلة تلبي الاحتياجات، وتعمل

بانتظام وشفافية.

خط الاساس : ٣ ٢٠٢١

الاهداف : ١٠ ٢٠٢٤

المخرجات القابلة للتطبيق من الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (٢٠١٨ - ٢٠٢٢):

الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النتيجة ١- ١- ٢: تمكين الفئات المهمشة، ولا سيما الفقراء والنساء وذوي الإعاقة والنازحين، من الوصول الكامل إلى الخدمات الأساسية والأصول المالية وغير المالية، من أجل بناء قدرات إنتاجية، والاستفادة من سبل العيش والوظائف مستدامة.

مؤشرات النتائج التكميلية:

زيادة نسبة النازحين العائدين إلى المناطق المحررة.

نسبة العائدين الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى تحسين ظروف المعيشية (بالنظر الى أنشطة برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في جميع النواض الأربعة) في المناطق المستهدفة.

المخرج ١. برنامج إعادة الاستقرار الفوري

دعم الحكومة العراقية لمواجهة التحديات العاجلة لعودة النازحين داخلياً في المناطق المحررة

مؤشرات المخرج ^{٢٣}	خط الأساس (السنة)	اهداف المخرجات (٢٠٢١)	التقدم (الربع الثالث) (٢٠٢٢)	اهداف المخرجات (٢٠٢٢)	اهداف المخرجات (٢٠٢٣)	
١,١ النسبة المئوية لتقييمات الاحتياجات التي تم إجراؤها في المناطق المستهدفة	٠ (٢٠١٥)	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	
٢,١ عدد مشاريع البنى التحتية للخدمات الأساسية مثل التعليم والكهرباء والصحة، المياه التي تم استعادتها ^{٢٤} في المناطق ^{٢٥} المستهدفة (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٢,٧٧٣	٣,٠٨٩	٣,٠٨٩ التعليم: ١١١٥ الكهرباء: ٣٤٦ الصحة: ٥١٨ الإسكان: ١٢٠ الخدمات البلدية: ٥٦٤ الطرق والجسور: ٥٠ الصرف الصحي: ١١٤ الماء: ٢٦٢	٣,٠٠٠	٣,٣٠٠
٣,١ عدد المنازل التي اعيد تأهيلها في المناطق المستهدفة (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٢٧,٥٠٠	٣٤,٩٥١	٣٤,٩٥١ ^{٢٧}	٣٢,٠٠٠	
٤,١ عدد فرص سبل العيش الفورية التي تم توفيرها للأفراد بما في ذلك النساء والشباب ^{٢٦} في المناطق المستهدفة (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٤٠,٠٠٠	٤٥,٩٩٩ ^{٢٧}	٤٥,٩٩٩ ^{٢٧} عدد ٨,٠٢٠ النساء: ١٧,٧٧١ عدد الشباب (٤٩,٠٠٠ ٧,٢٥٠) عدد النساء: ٢٠,٠٠٠ الشباب)	٥٣,٠٠٠ ٧,٥٠٠ نساء; ٢٢,٠٠٠ شباب]
٥,١ عدد منح الأعمال المقدمة في المناطق المستهدفة (مصنفة حسب الجنس) (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٥,٢٠٠	٣,٤٨١	٣,٤٨١ (٣,٠٢٨ نساء)	٤,٥٠٠ [٣,٠٠٠ نساء]	
٦,١ عدد المنح الصغيرة المقدمة للأسر التي تعيلها نساء (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٦,٥٠٠	٦,٦١٨	٦,٦١٨	٦,٥٠٠	
٧,١ عدد فرص التدريب و / التوظيف التي تم توفيرها للأفراد، بما في ذلك النساء والشباب، في المناطق المستهدفة (تراكمي) ^{٢٨}	محدود (٢٠٢٠) ^{٢٩}	٠	٠	٠	١,٥٠٠ [٤٥٠ نساء]	
٨,١ عدد ونوع قدرات الدعم الاستشاري التقني الموجودة لدعم السلطات لتخطيط وتنفيذ أنشطة تحقيق الاستقرار في المناطق المستهدفة	محدود (٢٠١٥) ^{٢٩}	يوجد ٣ من أخصائيو تحقيق الاستقرار ^{٣٠} و ٣ منسقي مناطق و ١٠ مستشارين بلديين لتحقيق الاستقرار	أخصائيو تحقيق الاستقرار ^٣ منسقي مناطق ٦ مستشارين بلديين لتحقيق الاستقرار	أخصائيو تحقيق الاستقرار ^٣ منسقي مناطق ٣ منسقي مناطق ١٠ مستشارين بلديين لتحقيق الاستقرار	٣ أخصائيو تحقيق الاستقرار ^٣ منسقي مناطق ١٠ مستشارين بلديين لتحقيق الاستقرار	

٢٣ نظراً لحجم المشروع وتعقيده، والسياق القطري المتطور، سيتم إجراء المراجعات للمؤشرات والأهداف وتوثيقها جنباً إلى جنب مع مبررات التغييرات.

٢٤ تشمل كلمة «مرمم» التجديد/ إعادة التأهيل و/ أو توفير المعدات والأثاث المقبولين رسمياً من قبل نظرائهم في الحكومة العراقية.

٢٥ سيؤخذ في الاعتبار عدد مشاريع البنى التحتية القائمة على احتياجات المرأة التي تمت استعادتها عند إعداد التقارير.

٢٦ أن يكون عمرك أقل من ٣٠ عاماً.

٢٧ تم الإبلاغ عن ٤٦,٢٣١ فرصة فورية لكسب العيش في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، يُظهر تمرين دمج البيانات الجديد أنه تم توفير ٤٥,٩٩٩ فرصة بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٢٨ تم تضمين مؤشر المخرجات الجديد في وثيقة برنامج إعادة الاستقرار المنقحة، والتي أقرتها اللجنة التوجيهية في ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠.

٢٩ حدثت تدخلات مماثلة في سبل كسب العيش في بعض المناطق المحررة في إطار برامج أخرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (على سبيل المثال، ICRRP) أو المنظمات الشريكة، ولكن

من الصعب تحديد خط أساس لهذا المؤشر. تتسق مدرسة المزارعين الحقلية مع مجموعة سبل المعيشة في حالات الطوارئ وفريق الأمم المتحدة القطري لضمان عدم وجود فائض في المناطق المستهدفة /

المستفيدين عند تنفيذ المشاريع ذات الصلة.

٣٠ يتوافق مع منصب/ دور مستشار الاستقرار المشار إليه في هدف نتيجة ٢٠١٨.



٣,٠٠٠ [٩٠٠ نساء]	١,٥٠٠ [٤٠٠ نساء]	٠	٠	٠	٩,١	عدد فرص دعم القدرات التي تم توفيرها للمسؤولين والموظفين الحكوميين (مصنفة حسب نوع الجنس)
---------------------	---------------------	---	---	---	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------

١١٠,٠٠٠ [٤٤,٠٠٠ نساء]	٧٢,٥٩١ [٣٢,٠٢٤ نساء]	٦٦,٧٤٠ ^{٣١} (٢٧,٩٥٢ نساء)	١٠٤,٨٩٤ [٤٢,٤٨٨ نساء]	٠ (٢٠١٥)	١٠,١	عدد المشاركين في أنشطة التماسك المجتمعي (مصنفة حسب نوع الجنس مصنفة حسب نوع الجنس) (تراكمي)
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------

المخرج ٢. برنامج إعادة الاستقرار الموسع

إعادة تأهيل مشاريع البنى التحتية ذات التأثير الشديد ومتوسطة الحجم للحفاظ على مكاسب الاستقرار في المناطق المحررة

١٢٥	١٢٤	١٢٣	١٢٤	٠ (٢٠١٥)	١,٢	عدد المشاريع المتوسطة الحجم للبنى التحتية المنفذة في المناطق المستهدفة (تراكمي)
-----	-----	-----	-----	-------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------

المخرج ٣. استراتيجية الخروج لبرنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة

تمت صياغة استراتيجية الخروج بالتشاور مع حكومة العراق بشأن المحافظات المحررة

يتم تنفيذ استراتيجية الانتقالية	تمت الموافقة على استراتيجية الانتقالية	بدأت صياغة استراتيجية الانتقالية	بدأت صياغة استراتيجية الانتقالية	٠ (٢٠١٥)	١,٣	صياغة وإقرار وتنفيذ استراتيجية الانتقال ^{٣٢} للاستقرار وأعمال التنمية في المناطق المحررة في مرحلة ما بعد برنامج إعادة الاستقرار
---------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٣١ تم الإبلاغ عن ٦٧,١٥٠ مشاركاً في أنشطة التماسك الاجتماعي في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، يُظهر تمرين تسوية البيانات الجديد أن ٦٦,٧٤٠ فرداً قد شاركوا في أنشطة التماسك المجتمعي بحلول ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢.

٣٢ أعيدت تسميتها رسمياً باسم استراتيجية الانتقال خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ نتيجة للمشاورة مع الشركاء والحكومة.

٦. الملحق ٢ التحديث المالي

#	الشركاء	المساهمات (بالدولار الأمريكي)	المساهمات المستلمة (بالدولار الأمريكي) (في ٣٠ ايلول ٢٠٢٢)	المساهمات (بالدولار الأمريكي) التي اعيد توجيهها للاستجابة لجائحة فيروس كورونا
١	استراليا	٢٠,٢٧١,٠٣١,٦٤	٢٠,٢٧١,٠٣١,٦٤	-
٢	النمسا	٦,٦٩٧,٠٢٥,٩٣	٦,٦٩٧,٠٢٥,٩٣	-
٣	بلجيكا	١٦,٣٧٦,٤٧٧,١٧	١٦,٣٧٦,٤٧٧,١٧	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠-
٤	بلغاريا	٢٢٧,٢٧٢,٧٣	٢٢٧,٢٧٢,٧٣	-
٥	كندا	٣٩,٨٤٤,٧٧٠,٥٢	٣٩,٨٤٤,٧٧٠,٥٢	١,٨٢٤,٨١٨,٥٢-
٦	جمهورية التشيك	١,٧٥٦,٠٦٤,٨٣	١,٧٥٦,٠٦٤,٨٣	-
٧	الدنمارك	٥٣,٩٤٠,٤٢٢,٨٢	٥٣,٩٤٠,٤٢٢,٨٢	-
٨	استونيا	٢٩,٤١١,٧٦	٢٩,٤١١,٧٦	-
٩	الاتحاد الاوروبي	٧٤,٠٨٠,٤٦٨,٠١	٧٤,٠٨٠,٤٦٨,٠١	-
١٠	فنلندا	١١,٦٣٠,٣٧٣,٨٤	١١,٦٣٠,٣٧٣,٨٤	-
١١	فرنسا	٦,٢٣٤,٧٣٩,٧٢	٦,٢٣٤,٧٣٩,٧٢	-
١٢	المانيا ^{٣٢}	٣٨٢,٤٨٥,٩٢٤,٩٧	٣٨٢,٤٨٥,٩٢٤,٩٧	-
١٣	اليونان	٥٩,٤٢٠,٠٠	٥٩,٤٢٠,٠٠	-
١٤	العراق	٣٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠	١٦,٨٥٣,٧٩٧,٠٠	-
١٥	ايطاليا ^{٣٤}	٢٢,٠٦٩,٧٧٩,٢٧	٢٠,٠٧٥,٧٦١,٣٢	-
١٦	اليابان	٣٦,٥٧٥,٧٣٢,٨١	٣٦,٥٧٥,٧٣٢,٨١	-
١٧	الكويت	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	-
١٨	مالطا	٣٤,٢٨٥,٧١	٣٤,٢٨٥,٧١	-
١٩	هولندا	١٠٧,٤٥٨,٤٧٨,٠١	١٠٧,٤٥٨,٤٧٨,٠١	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠-
٢٠	نيوزيلندا ^{٣٥}	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	-
٢١	النرويج	٧٢,٠٠١,١٦٦,٠٠	٧٢,٠٠١,١٦٦,٠٠	-
٢٢	بولندا	٢,٧٦٩,٩٠١,٥١	٢,٧٦٩,٩٠١,٥١	-
٢٤	جمهورية كوريا ^{٣٦}	٢٧,٣٥٠,٤٩٥,٠٠	٢٧,٣٥٠,٤٩٥,٠٠	-
٢٣	رومانيا	٥٦,٣٠٦,٣١	٥٦,٣٠٦,٣١	-
٢٥	سلوفاكيا	١١٣,١٢٥,٧٩	١١٣,١٢٥,٧٩	-
٢٦	السويد	٥٩,٦٤٥,٧٣٢,١٣	٥٩,٦٤٥,٧٣٢,١٣	-
٢٧	تركيا	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	-
٢٨	الامارات العربية المتحدة	٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	-
٢٩	المملكة المتحدة ^{٣٧}	٤١,٨٠٧,٩٩٣,٦٥	٤١,٨٠٧,٩٩٣,٦٥	-
٣٠	الولايات المتحدة الأمريكية	٤٣٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٣٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٢٦,١٠١,٠٠٠-
	المجموع الكلي	١,٥١٨,٣١٦,٤٠٠,١٣	١,٤٩٧,٩٢٦,١٧٩,١٨	١٦,٨٥٠,٩١٨,٥٢-

٣٣ يشمل مساهمات من بنك التنمية الألماني (KfW)، نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ووزارة الخارجية الفيدرالية (Auswärtiges Amt).
 ٣٤ يشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
 ٣٥ يشمل مساهمات من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في إطار برنامج المعونة النيوزيلندية.
 ٣٦ يشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).
 ٣٧ يشمل مساهمات من وزارة التنمية الدولية (DFID) ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، اللتين اندمجا في سبتمبر ٢٠٢٠ لإنشاء وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO).

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بغداد، العراق

www.iq.undp.org

