Projet 16 Quartiers 6 Camps (16/6)

Status du Projet

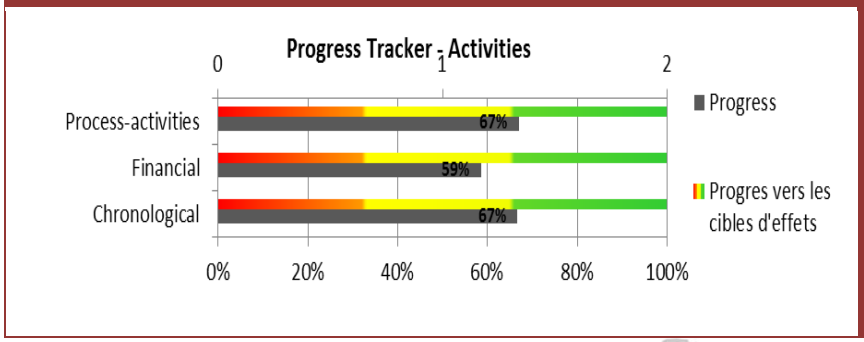

- ✓ **Fonds disponible: 51.5 millions USD**
  - **30 millions de FRH**
  - **20 millions de CIDA**
  - **1.5 millions de KOREA**
- ✓ **Partenaires : Gouvernement Haïtien et PNUD, OIM, UNOPS, BIT**
- ✓ **Durée de Projet : 24 mois**

COMPOSANTES DU PROJET

1
Processus de Retour
Les familles de déplacés des 6 camps associés aux 8 quartiers ont trouvé une solution de logement amélioré

2
Logement
Le retour vers 8 quartiers d'origine est facilité par la reconstruction de l'offre de logement de qualité

3
Réhabilitation des quartiers
La rehabilitation améliorée des 8 quartiers ciblés est promue sur la base des priorités de leurs habitants

4
Suivi et Evaluation & Gestion de connaissances
Systèmes, outils et systématisation du Modèle Logique pour la réplication du projet

BREVE DESCRIPTION DU PROJET

But du Projet: Réhabilitation de **huit (8) quartiers** et retour volontaire des familles des **6 camps associés** afin d'améliorer les conditions de vie à travers la participation communautaire.

Le Projet 16/6 est une initiative pilote du Gouvernement d'Haïti d'une durée de 2 ans avec le support des Nations Unies, à travers 4 de ses agences: le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Bureau International du Travail (BIT), l'Organisation Internationale de Migration (OIM) et United Nations Office for Project Services (UNOPS). Ce programme conjoint vise à faciliter la réhabilitation de seize quartiers à travers la reconstruction améliorée des Logements, l'accès aux services de base priorisés par la communauté et la création d'opportunités génératrices de revenu. En même temps, le projet vise à faciliter le retour aux personnes déplacées vivant dans six camps qui accueillent actuellement environ 5.000 ménages provenant principalement de ces seize quartiers, répartis sur les communes de Port-au-Prince, Delmas et Pétion-Ville.

Modèle d'intervention du Projet

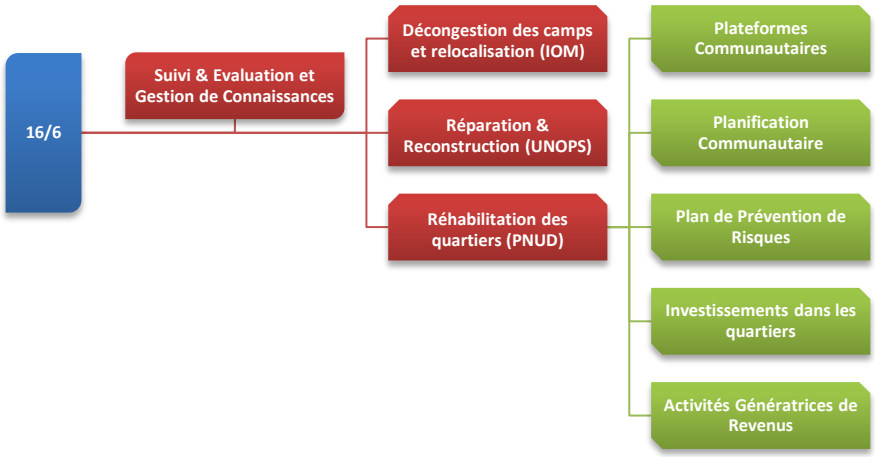

TABLEAU DE BORD MENSUEL – PROJET 16 QUARTIERS 6 CAMPS, HAITI Juin 2013

Plus de 11000 familles relocalisées



50 camps fermés

939 Maisons jaunes réparées Plus de 1,413 familles ont bénéficié d'un logement amélioré

Plus 60 maisons rouges reconstruites

Plus de 115 ouvriers formés en construction parasismiques

14 kiosques d'eau installés

5 Places publiques construites

3205 ml de routes réhabilitées



3657 ml de caniveaux construits

Plus de 3440 ml de trottoirs construits

Plus de 300 ml de murs de soutènement construits

Plus de 2700 ml de canaux de drainage construits

Près de 500 lampadaires installés

Plus de 3600 emplois créés

780 femmes formées en développement personnel, formation professionnelle et gestion d'entreprises

527 sont des micro-entreprises créées par des femmes

8 plateformes communautaires validées et formées

IOM • OIM

PNUD Haïti

1. PROCESSUS DE RETOUR

➲ **Qu'est-il arrivé et pourquoi?**

Toutes les activités relatives à la composante Retour du Projet ont été finalisées à date. Des activités additionnelles liées à la création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de l'information ont été entreprises et complétées au début du mois de l'année 2013.

Composante Retour en chiffres

1. Réalisation des 2 projets combinés

16/6 & Champs de Mars

- **50 Camps fermés**
- **11032 familles enregistrées**
- **11008 familles relocalisées**

2. Relocalisation VS Période

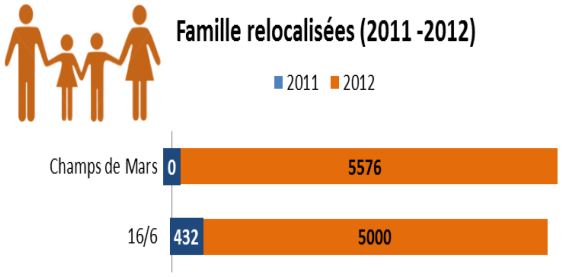

2. LOGEMENT

Réparation de Maisons endommagées

Réparation de Maisons endommagées (Jaunes & Rouges) avec UNOPS

➲ **Qu'est-il arrivé et pourquoi?**

Les activités du volet réparation des maisons endommagées du projet de logement ont été clôturées au cours du mois de février 2013.

Les habitants des quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Morne Hebo, Jean-Baptiste et Bois-Patate ont pu bénéficier des travaux de réparation et de renforcement de leurs maisons endommagées.

✓ **Participation communautaire**
Le projet a favorisé la participation des habitants des quartiers ciblés dans tout le processus de la réhabilitation des quartiers, c'est-à-dire que l'implication de la communauté a été constatée tout au long de l'implémentation du projet. Les ouvriers de chantiers ont été recrutés directement dans les zones d'intervention du projet, respectant ainsi les exigences du projet qui stipulait que 75% de la main d'œuvre de chantier devait être recruté dans les zones d'exécution du projet.

✓ **Création d'emplois**
Le projet a donné à plus de **362 personnes** des zones d'intervention la possibilité d'avoir **accès à des emplois rémunérés** par la création de plus de 9500 jours de travail.

✓ **Information en construction parasismique**
Un programme de formation élaboré par l'UNOPS a donné aux bénéficiaires, soit 1215 familles, la possibilité d'avoir accès à des séances de formation sur les principes de bases en matière de construction.

Les ouvriers de chantiers, soit un total de 87 maçons et contremaîtres des quartiers ciblés ont aussi bénéficié de formation dispensée par le MTPTC et UNOPS sur la réparation de petits bâtiments.

- ✓ Le projet a contribué également à rehausser le sentiment de fierté des bénéficiaires grâce à l'ajout de peinture ; les murs ont été également renforcés grâce à un crépissage.

➲ Ce qui a bien fonctionné?

Au cours de l'implémentation du projet de renforcement des maisons endommagées, des ajustements ont été apportés suites aux différentes leçons apprises lors de l'exécution du projet :

- ✓ la formation et l'accès à l'information de tous les bénéficiaires faisant partie du programme de réparation.
- ✓ la peinture des maisons qui a eu un impact sur l'esthétique des quartiers et a contribué à faire sortir des éléments de structure tel que les poutres et colonnes, offrant ainsi un élément d'éducation au niveau des bonnes pratiques de constructions.
- ✓ La décision de procéder à l'enduisage de la façade extérieure des maisons réparées a grandement augmenté la visibilité du projet.
- ✓ Les méthodes d'implémentation directes et indirectes ont été appliquées parallèlement, c'est-à-dire que des compagnies de construction locales ont eu la chance de participer aux appels d'offres lancés par le projet. Ces compagnies locales de tailles moyennes pour la plupart, ont pu bénéficier d'appuis techniques dans la préparation et l'élaboration de documents techniques pouvant leur permettre de participer aux appels d'offres lancés par le projet.

➲ Ce qui a été amélioré?

- ✓ Une meilleure collaboration entre les plateformes communautaires et les agences évoluant sur le terrain a été observée au cours de l'implémentation du projet de réparation.
- ✓ Une meilleure gestion des plateformes communautaires a été faite par le projet.
- ✓ Afin de rendre pérenne les réalisations du projet 16/6 dans les quartiers, il est fortement recommandé d'augmenter les capacités techniques des plateformes communautaires au travers de formations continues.

<u>Réparation de Maisons endommagées avec Carmen à Villa Rosa</u>

La méthodologie de réparation de Carmen : owner-driven est utilisée pour réparer les maisons endommagées de Villa Rosa. Jusqu'à ce jour, un total de **297 maisons a été évalué et 204 maisons ont été complètement réparées**.

Les leçons apprises de la première phase de réparation a permis à l'équipe de CARMEN de faire des ajustements quant à la méthodologie. Des ajustements ont aussi et surtout permis d'améliorer le rendement, la qualité de la réparation, le rapport avec les bénéficiaires, la gestion des ingénieurs et des maçons, la finition et la peinture des maisons et de réduire considérablement la durée de réparation des maisons. Par exemple la décision d'effectuer les transferts de fonds via le système E-voucher, c'est-à-dire, les bénéficiaires ne pourront plus recevoir du cash via Tchotcho mobile, mais seront obligés d'acheter de la peinture dans une quincaillerie inscrite dans le programme. Cette mesure a été prise pour contraindre les bénéficiaires à achever leurs maisons jusqu'à la peinture pour rester dans l'objectif du projet 16/6. En effet, le 1er groupe de 98 maisons avait été réparé en plus de 7 mois, alors que le 2e groupe de 106 maisons l'a été seulement en 1 mois et 1 semaine.

<u>Réparation de Maisons endommagées à Fort-National dans le cadre de la Réhabilitation de Champs de Mars</u>

La méthode Agency-driven ayant donné des résultats satisfaisants jusqu'à présent a été maintenue pour les interventions futures dans le quartier de Fort-National dans le cadre du Projet de Réhabilitation de la zone de Champs de Mars.

Par ailleurs, le projet de réparation de maisons endommagées du Champ-de-Mars a débuté en janvier 2013, par l'identification des quartiers d'intervention. Ce projet, qui est une réplique du projet 16/6, est financé par l'ACDI.

Les évaluations ont déjà commencé dans le quartier de Fort-National.

Reconstruction de Maisons rouges

➲ Qu'est-il arrivé et pourquoi?

Phase terminale de maison sur le site de logement collectif à Morne Hercule

- ✓ Phase pilote de construction de 60 maisons dans les quartiers de Nérette, de Morne Hercule et Morne Lazare;
  - 17 maisons de 33 unités finalisées à Morne Hercule ;
  - 14 maisons en phase finale d'achèvement à Nérette ;
  - 29 maisons en phase finale d'achèvement à Morne Lazare ;
- ✓ 5 entreprises de construction locales ont été retenues pour la construction de 350 maisons sur des sites individuels et collectifs dans les quartiers ciblés du projet.

➲ Leçons apprises et recommandations

La construction des 17 logements du site collectif de Morne Hercule est pratiquement arrivée à sa fin.

Le projet pilote de Morne Hercule qui s'annonce déjà comme un succès en termes de nouvelle approche de logement sociaux en Haïti, a retenu l'attention de beaucoup de secteurs : bailleurs internationaux, gouvernement, secteur privé, etc. Ce projet ne consiste pas seulement à reloger les habitants, suite à la destruction de leur maison mais représente, une nouvelle façon de construire (construction plus sécuritaire, meilleures pratiques en matière de construction) et surtout un changement de mentalité dans le domaine de la construction en Haïti en introduisant le concept de cession d'espace pour le bien de la communauté.

Ce projet a nécessité des ajustements au cours de son implémentation. Il a fallu commencer par la sensibilisation de la population sur ce nouveau concept et accompagner la population tout au long du processus par des sessions de focus groupes afin de permettre une participation active des bénéficiaires dans le programme.

La question foncière a constitué une contrainte non négligeable et l'équipe du logement a dû s'adapter en faisant appel à des professionnels en termes de questions foncières, ainsi une firme locale a été engagée á cet effet.

Les contraintes liées à la particularité du sol et des zones d'intervention (quartiers) ont rendu difficile l'acheminement des matériaux sur les chantiers ce qui a causé des retards dans l'exécution du projet.

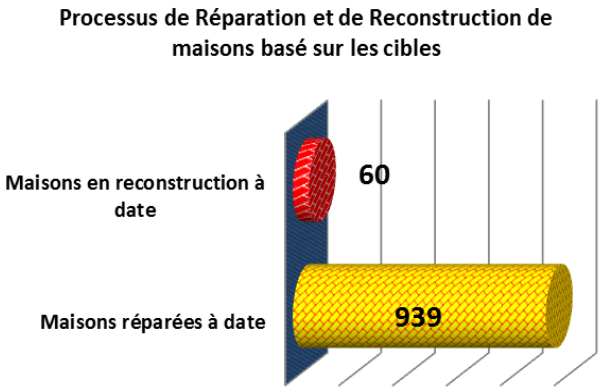

<u>Formation en construction parasismique et maçonnerie chainée</u>

Résultats à date

- ✓ 63 formateurs d'ouvriers (sur les 60 prévus) ont été formés, certifiés en obtenant graduellement une Attestation d'Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de l'INFP.

- ✓ **Sélection et formation des ouvriers semi qualifiés**

Le programme de formation des ouvriers en construction parasismique a débuté le 17 septembre 2012, dans le quartier de Morne Hercule, suivant le calendrier établi par l'équipe de réparation. Vu l'étroitesse du site de construction et le nombre limité des premières maisons, 28 contremaitres et ouvriers sont formés et certifiés pour la phase pilote,

directement sur le site de Morne Hercule, sur les constructions des 4 premiers blocs de maisons, (qui représentent 19 logements).

✓ **Placement des personnes formées après Attestation**

Après avoir obtenu leur AAP, les ouvriers attestés seront engagés pour reconstruire d'autres maisons dans les quartiers du «projet 16/6». Sous la supervision de formateurs, ils pourront acquérir, après 900 heures de travail sur le site, une Certification d'ouvrier qualifié (CAP) dispensée par l'INFP. Ces ouvriers devront se référer à l'UNOPS et aux autres contractants. L'activité des formateurs et des ouvriers formés sur les chantiers du 16/6 se limite actuellement à la reconstruction de « maisons rouges ». Toutefois, à échéance plus lointaine, les formateurs et les «boss» (artisans /ouvriers) seront sollicités pour la réhabilitation des «maisons jaunes ». Une initiation en ce sens et une visite de chantier ont été incluses pour cela dans le programme de formation des formateurs.

✓ **Renforcement des capacités de gestion des petites entreprises de la construction**

- 16 formateurs certifiés au module de formation « Améliorer Son Entreprise de la Construction (ASECO) »
- 7 entrepreneurs formés au module de formation « Améliorer Son Entreprise de la Construction (ASECO) »
- La capacité de 15 entreprises a été directement renforcée et soutenue

3. REHABILITATION DES QUARTIERS

Plateformes communautaires

Aujourd'hui, après leur création, leur validation par la communauté, les autorités locales et gouvernementales, les huit (8) plateformes communautaires ont la possibilité de fonctionner comme une véritable institution et personne après avoir obtenu leur certificat de reconnaissance légale, non seulement auprès des mairies concernées (Port-au-Prince et Pétion-Ville, mais également du Ministère des Affaires Sociales et du Travail).

✓ **Renforcement des Capacités des Plateformes Communautaires**

Suite au premier kit de formations reçu par les plateformes communautaires sur plusieurs thématiques, des focus groupes ont été réalisés avec les membres des plateformes communautaires pour évaluer leurs besoins en formation additionnelles et leur motivation et disponibilité. Dans cette perspective d'autres séances de formation sont prévues dans les prochains mois. En ce sens, une firme de formation est en train d'être recrutée.

✓ **Petits projets**

A ce niveau, de grands pas ont été effectués. Une commission d'évaluation de validation des petits projets a été créée avec un acte constitutif comme termes de référence. Une grille d'évaluation des petits projets a été validée par la commission. Avec l'aide de l'équipe de mobilisation communautaire et des ingénieurs, quatre plateformes communautaires dont celles de Jean-Baptiste, Bois-patate, Villa Rosa et Morne Hercule, ont déjà élaboré plusieurs projets, soient (12) au total qui ont été présentés et défendus devant la commission d'évaluation par les Plateformes communautaires respectives. A date, neuf (9) petits projets ont été validés et approuvés par la Commission d'Evaluation, soit deux (2) sur trois (3) pour Bois-Patate, deux (2) sur deux (2) pour Jean-Baptiste, trois (3) sur quatre (4) pour Villa Rosa et deux (2) sur trois (3) pour Morne Hercule. Un Accord de type Micro capital Grant doit être signé avec les plateformes pour un montant total de 20000usd pour l'exécution des Petits projets. Pour cela, chaque plateforme communautaire a été dotée d'un compte bancaire. Les Accord sont actuellement en signature. Idéalement, l'exécution des premiers petits projets sera lancée à la mi-août 2013. Pour les autres quartiers, le processus d'identification et d'élaboration de petits projets est en cours.

Probablement, ils seront prêts pour être présentés et défendus devant la commission d'évaluation et de validation dans les prochaines semaines.

✓ **Centres communautaires**

Les démarches continuent dans les différents quartiers et auprès des mairies afin de faire l'acquisition soit d'un terrain privé, ou un terrain public sur lequel le centre communautaire peut être construit. A Pétion-Ville, il y a déjà trois quartiers sur quatre où le terrain a été déjà identifié et acquis, notamment Nérette, Jalousie et Morne Hercule. Pour Morne Lazare, les discussions sont en cours avec le propriétaire d'un terrain identifié capable d'héberger le centre communautaire. Dans le cas de Morne Hercule, c'est une maison qui a été acheté et qui va être démolie pour construire le centre communautaire. Les centres communautaires de Nérette et Jalousie devraient déjà commencer à construire avec la Firme de construction dénommée SOFONIAS. Compte tenu des imprévus et des délais pris dans l'acquisition des espaces, SOFONIAS ne sera plus en mesure de réaliser la construction des centres communautaires. Un accord a été signé avec Entrepreneur du Monde pour la construction des différents centres communautaires. Des visites d'étude géophysique ont été effectuées avec Entrepreneur du Monde pour évaluer l'appropriation des terrains par rapport au type de construction souhaité. Les consultations avec les plateformes communautaires ont déjà débutées.

Pour pallier les problèmes fonciers qui peuvent se poser, le recrutement d'un conseiller juridique est en cours.

Planification communautaire

16/6

Dans le cadre du Projet 16/6, la planification communautaire dans les 8 quartiers ciblés a été finalisée et a permis l'élaboration des scenarios d'investissement.

Champs de Mars

Un exercice consultatif en 3 phases similaire à celui du projet 16/6 a été initié dans le quartier de Fort National, quartier de retour sélectionné dans le cadre du Projet de Réhabilitation de la zone de Champs de Mars :

✓ **Etablissement d'une structure de travail avec la communauté pour la réalisation du diagnostic urbain**

Dans le cadre du Projet de Réhabilitation de Champs de Mars, la phase préliminaire de création de la cellule communautaire de Fort-National est finalisée avec 9 membres élus. Sur la demande du coordinateur du projet, la représentativité doit être améliorée. Les ateliers de consultation avec la communauté seront organisés sur cette base en faisant intervenir un plus grand nombre d'acteurs impliqués dans le quartier.

✓ **Plateforme de coordination avec la Mairie et le MTPTC pour la validation technique du diagnostic**

Une unité de coordination a été établie avec la Mairie de Port-au-Prince ainsi qu'avec les services de la Direction des Travaux Publics (SPU, SGU).

✓ **Réalisation du diagnostic urbain**

L'identification du bâti et des infrastructures a débuté mi-juin tout comme la création d'un SIG.

Plan de Prévention de Risques

La cartographie des risques a été réalisée dans les quartiers du 16/6. Les résultats ont été pris en compte dans la sélection des maisons pour la réparation et la reconstruction ainsi que pour la réalisation des projets d'infrastructures dans le cadre des investissements publics.

Un amendement a été signé avec IMSRN pour la réalisation de la cartographie de Jalousie, quartier de retour du 16/6 non prévu, la zone élargie de Canapé-vert selon la nouvelle délimitation faire lors des exercices de planifications et le quartier de Fort National dans le cadre du Projet de Réhabilitation de la zone de Champs de Mars.

Investissements publics dans les quartiers

➲ **Qu'est-il arrivé et pourquoi?**

✓ **Présentation de scenarios d'interventions à la communauté**

La présentation et le choix de scenarios ont été réalisés dans les quartiers ciblés. Tous les quartiers ont

pu choisir massivement le type d'investissement à réaliser au profit de leurs communautés. Les travaux vont bon train jusqu'à présent et devraient être finalisés d'ici la fin du mois d'Aout 2013. Tous les huit (8) quartiers prioritaires sont en chantier avec des interventions variées, notamment, des travaux de mitigation, l'installation de lampadaire, réaménagement de sentier pour piétons, construction de centres communautaires, aménagement de routes, restauration des services de base comme des kiosques d'eau, électrification, etc.

✓ **Construction de routes, sentiers, de drainage et réalisation de travaux de mitigation**

- Le projet de réhabilitation des infrastructures communautaires a contribué à créer plus de 2036 emplois dans les communautés de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Canapé-vert, Bois-Patate et Morne Hebo et Jean-Baptiste ;
- 3188 ml de route construites dans trois quartiers: Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ;
- 2683 ml de trottoirs dans trois quartiers : Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ;
- 3657 ml de caniveaux dans trois quartiers : Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ;
- Travaux sanitaires ont été entamés au Canapé-Vert ;

✓ **Aménagement sur le site pilote de Morne Hercule et de la rue de la Paix**

Des travaux d'aménagement sont en train d'être effectués sur le site pilote de Morne Hercule par la composante «Infrastructures Communautaires». En effet, la rue de la Paix totalisant 0 .486 km et donnant accès au site pilote est en train d'être aménagée. Des espaces récréatifs, de circulation, des conduits de drainage et des fresques murales sont en train d'être réalisés au niveau du site par l'équipe d'infrastructure communautaire.

✓ **Lampadaires solaires installés à Jean-Baptiste et à Canapé- Vert**

- **Eclairage et électricité**

Les activités d'installation de lampadaires ont été achevées à plus de 100 %. 243 lampadaires solaires additionnels sont été installés par le projet 16/6 portant le nombre total d'installation de lampadaires à 492 dans 7 quartiers du projet (Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Bois Patate, Canapé Vert, Morne Hebo et Villa Rosa).
Les habitants des quartiers bénéficiant des lampadaires solaires témoignent de l'amélioration de l'éclairage et de la sécurité dans leur communauté.

D'un autre côté, les travaux préparatoires pour l'installation de 13 transformateurs dans les quartiers de Nérette et de Bois-Patate ont été initiés. Un appel à proposition pour la soumission d'offres par les entreprises locales a été publié dans les journaux locaux.

✓ **Assainissement**

Le projet a commencé avec l'implémentation des différents projets issus du choix des communautés. Ainsi les interventions dans le domaine de l'assainissement ont débuté dans 3 quartiers : Bois-Patate, Morne Hebo, Villa Rosa/ Morne Rosa.

Des interventions portant sur le curage des latrines, la distribution de poubelles, de sacs poubelles, l'installation de bennes à ordures, la distribution de motocyclettes et la réparation de douches publiques existantes dans les quartiers sont les principales interventions réalisées au cours de la période.

✓ **Réseau d'eau Potable**

Les travaux de construction et de réhabilitation des fontaines d'eau dans les quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare et le quartier de Nérette entament leur phase finale d'implémentation ; 98 % du travail de construction des kiosques d'eau, d'installation de tuyauterie et de réservoirs d'eau ont été effectués par l'équipe d'infrastructure communautaire via les firmes d'ingénierie locales IMCO et GL. La prochaine étape, consistera au branchement par la DINEPA à son réseau.

Parallèlement, le projet est en train de mettre en place les différents comités de gestion dont les comités de gestion d'eau dans les quartiers de Morne Hercule et de Bois-Patate.

NB : À noter que les comités de gestion d'eau pour les quartiers de Nérette, de Morne Lazare, de Villa Rosa et de Morne existaient déjà dans ces zones.

✓ **Comités de gestion dans les communautés**

La mise sur pied des comités de gestion dans les communautés représente une activité importante dans la réalisation des objectifs du projet 16/6.

Au cours de la période, l'équipe de la mobilisation communautaire a procédé à l'organisation d'élection dans les quartiers afin de mettre en place différents comités de gestion dans les quartiers. À date, 12 comités ont été institués dans 5 quartiers du projet : Morne Hercule, Bois-Patate, Morne Hebo, Nérette Villa-Rosa et de Morne Lazare.

✓ **Construction d'espace récréatif**

La construction des espaces récréatifs dans les quartiers de Nérette et Morne Lazare sont en cours d'exécution. L'équipe a déjà achevé les fouilles dans les deux quartiers et est présentement en train de réaliser les travaux de terrassement et la construction de murs de soutènement et de caniveaux. L'équipe d'infrastructure communautaire prévoit de terminer avec les travaux á la fin du mois de Juin.

➲ **Leçons apprises et recommandations**

Le projet d'infrastructure communautaire a complété la réalisation du projet d'éclairage dans les quartiers identifiés par les bénéficiaires du 16/6. En effet, à la fin du mois de Mai 2013 l'équipe d'infrastructure communautaire complétait l'installation de 243 lampadaires solaires dans 7 quartiers du 16/6. Ce projet a été réalisé avec succès malgré certains retards provoqués par l'entreprise locale sous-contractée.

Les habitants des quartiers n'ont pas caché leur satisfaction par rapport à l'installation de ces lampadaires. Il reste cependant à déterminer le taux réel de satisfaction au travers d'une enquête de satisfaction. Le succès du projet d'éclairage peut être cependant attribué á la bonne collaboration entre les agences partenaires et le projet 16/6.

En effet, des exercices de planifications communautaires ont été faits par les techniciens de l'organisation « Architecte de l'Urgence », GOAL, et « Architect for Humanity » afin de déterminer les endroits les plus appropriés dans les quartiers dans le cadre de l'installation de ces lampadaires. La cartographie des quartiers d'interventions a été réalisée en collaboration avec l'UNFPA et l'OTI.

L'éclairage des quartiers permettra certainement une amélioration de la sécurité des habitants, en particulier des couches les plus vulnérables notamment des femmes et des enfants.

L'électrification d'un pays est très importante pour son développement. Des projets d'éclairage à l'énergie solaire devraient être encouragés car ces derniers permettront à l'état d'économiser en utilisant l'énergie du courant de ville à d'autres fins. Et en dernier lieu, Haïti étant un pays tropical et généralement ensoleillé, il est donc recommandé d'utiliser les ressources naturelles disponibles c'est-à-dire le soleil, afin de donner accès aux services de bases (électricité) au plus grand nombres.

➲ **Comment cela a-t-il contribué à l'autonomisation, l'épanouissement et la sécurité des femmes**

Pour la première fois, les femmes ont pu participer dans la planification de leur communauté, de leur quartier. Elles ont pu faire passer leur besoins et priorités en terme de services de base, nécessaires dans les quartiers pour leur propre épanouissement, comme par exemple l'emplacement des lampadaires solaires dans des zones réputées comme dangereuses pour les femmes surtout la nuit, des zones où des cas de viols et de vols ont été perpétrés sur des femmes par le passé.

Activités Génératrices de Revenus

➲ **Qu'est-il arrivé et pourquoi?**

Dans le cadre des activités Génératrices de revenus, parmi les initiatives lancées, il y a PDF et Ann Ale qui sont en cours et progressent au fur et à mesure dans le but de dynamiser et renforcer les secteurs économique et commercial au niveau des quartiers du 16/6 et dans le pays d'une manière générale.

HAÏTI
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES FOURNISSEURS
CRÉATIONS DES MARCHÉS INCLUSIFS

Réalisations

✓ **16 consultants accrédités dans la méthodologie du programme**

Un cours de formation a été organisé au profit de 34 consultants afin de pouvoir les accréditer dans la méthodologie de développement des fournisseurs. Le cours s'est fait à distance à l'aide d'une plateforme virtuelle avec des sessions présentielles. Le cours est à 80% pratique ce qui exige à chaque consultants de choisir une entreprise pour appliquer la méthodologie et produire l'analyse des résultats. Les rapports de chaque Consultant sont soumis à l'appréciation des Consultants- formateurs et l'équipe de Gestion du Programme.

A la fin du cours, 16 consultants ont obtenu la note suffisante pour être accrédité dans la Méthodologie de Développement des Fournisseurs.

Le résultat qu'on a eu est similaire aux autres pays où le PDF est en train d'être implémenté et cela se trouve justifié par la rigueur du cours de formation.

✓ **68 Entreprises appuyées par le programme dans la phase pilote**

Pendant 3 mois, les consultants en formation ont implémenté la méthodologie PDF dans 68 entreprises, dont 34 leaders et 34 fournisseuses. Ils ont fait un diagnostic objectif de la réalité de chacune de ces entreprises, proposé un plan d'amélioration et implémenté certains projets d'amélioration au profit de ces entreprises. Plusieurs de ces entreprises ont témoigné le bienfait de l'exercice et d'autres veulent reprendre le processus dans une plus large envergure.

On y comptait des entreprises de service, des entreprises agroindustrielles, entreprises de distribution, etc. L'exercice a permis également aux consultants de voir que la Méthodologie PDF s'applique dans toutes les entreprises peu importe le secteur d'activité.

✓ **Mise en place d'un système de recherche d'institutions d'appui aux PME en Haïti (www.pdf.com.ht)**

La Méthodologie PDF à la grande vertu de vouloir toujours chercher à établir une synergie avec les autres institutions et programmes d'appui aux PME. En ce sens, des protocoles sont en cours de signatures avec des institutions comme la SOFIHDES, OCPAH, ZAFEN, etc. En outre on a développé une base de données en ligne contenant tous les programmes et institutions d'appui, Personne contact, Information de base et adresse, dans tout le pays afin de faciliter les PME dans leur recherche d'information.

✓ **Appui aux chaînes de valeur**

Le PDF est sur le point de finaliser plusieurs négociations visant le démarrage prochain de plusieurs chaines de valeur.

Chaîne de Valeur avec l'UNOPS- dans le but de renforcer les entreprises de construction on a déjà signé 3 contrats il y en deux autres.

Dans la chaine avec Total, 3 entreprises acceptent de participer au programme, il en reste une troisième pour compléter l'étape de promotion.

On est en train de conduire l'étape promotion avec plusieurs chaînes de valeur dans les filières de Tourisme, cacao, vétiver, Brasserie, construction etc.

Pour plus d'informations sur le PDF, vous pouvez consulter le site du programme : http://www.pdf.com.ht. Là-dessus, vous y trouvez la vidéo de présentation de la méthodologie du PDF.

16/6 ANN ALE

Le Projet Ann Ale avance à grand pas selon la planification. Suite à l'enquête réalisée pour recenser les commerces se trouvant dans les quartiers du 16/6. Plus de 1628 commerces ont été recensés. Cependant, n'ayant pas la capacité d'appuyer tous les commerces recensés, un total de 950 bénéficiaires a été choisi pour être appuyé par le projet 16/6 à divers niveau, notamment avec des formations sur plusieurs thématiques liés au commerce, des produits renforcement de la visibilité et d'amélioration de la qualité des services fournis.

Réalisations

Une firme de formation a été recrutée pour les séances de formations à partir d'un appel d'offre lancé sur plusieurs canaux. Elle est connue sous le nom de QMG.

Les séances de formation ont débuté dans la commune de Pétion-Ville depuis 3 juin 2013 dans les quartiers de Morne hercule, Morne Lazare et Nérette. Pour ces trois quartiers 30 personnes sont choisis pour commencer avec 10 sur chacun. Cependant, il y a que 23 qui suivent les formations actuellement compte tenu de certaines absences constatées.

Trois modules de formations sont dispensés aux bénéficiaires. Ces derniers sont connus respectivement sous les noms de : Gestion d'entreprise, Comptabilité et Marketing. On est déjà au troisième et dernier module pour mettre aux séances de formation pour ce premier groupe de personne à raison de 30 heures par module sur 10 jours.

Acquisition de deux camions pour tenir les séances de formation après aménagement en salle de classe. L'un d'eux est quasiment aménagé, mais le système d'électrification pose encore des difficultés. Il n'arrive pas à faire fonctionner les airs conditionné pendant toute une journée. Donc, ce qui a obligé au responsable du programme à trouver un autre local fixe pour faire les formations pour les bénéficiaires des trois quartiers. Des stratégies sont en train d'être imaginées pour résoudre le problème d'électricité. On essaie de voir avec la mairie et EDH si on peut alimenter les camions en termes d'électricité aux heures exactes des séances de formations. Pour l'autre camion, le processus d'aménagement est en cours. Notons que pour Canapé-Vert, aucune séance de formation n'a été encore réalisée. Et même l'acquisition des camions ne sont pas encore faite.

Au niveau des lignes graphiques, le processus progresse considérablement. 30 doivent être fournies pour les trente bénéficiaires du premier groupe. 5 options sont proposées à chaque personne qui doit choisir l'une d'entre elles. Pour l'instant 15 personnes ont déjà fait leur choix. Le processus continue pour le reste.

Certains produits de visibilité dans la ligne graphique sont déjà disponibles. Nous voulons parler d'un bloc de reçu, d'une carte de visite et l'applique murale. Déjà deux personnes ont bénéficié du kit de visibilité contenant de l'applique murale ou une enseigne en plywood et les autres produits précités.

4. SUIVI ET EVALUATION ET GESTION DE CONNAISSANCES

➲ **Renforcement de l'équipe de Suivi et Evaluation et Gestion de Connaissances**

- ✓ Le recrutement d'un éditeur pour les produits de connaissances est en cours.
- ✓ Un consultant en ligne graphique a été recruté avec l'aide de l'équipe de Panama. Plusieurs propositions de ligne graphique sur le document des plateformes communautaires ont été présentées pour commentaires.
- ✓ Un processus de formalisation de l'équipe de production de gestion de connaissances a été entamé. Au lieu de stagiaires, ils ont maintenant un statut de consultants étudiants juniors. Toutes les formalités ont été remplies. Le processus de signature de contrat avec ces derniers a été finalisé.

➲ **Systématisation des Leçons apprises et bonnes pratiques**

- ✓ Les productions des consultants juniors sur les différentes thématiques prévues continuent. Certaines sont déjà disponibles et seront compilées bientôt.
- ✓ 1er produit de connaissances sur les plateformes communautaires en phase d'achèvement.
- ✓ 2eme produit de connaissances sur le processus de retour en phase de correction et de révision.

➲ **Data Warehouse (Base de données globale)**

La mission pour le test de finalisation a été réalisée avec l'équipe de Panama au cours du mois de février. A date, la construction de la base de données et la collecte de données des agences continuent. Certaines informations clés sont déjà disponibles pour consultation. La collecte des données continue auprès des différentes agences

d'exécution et partenaires pour faciliter l'achèvement de la base de données globales.

- **Reporting (Trimestriel et Annuel)**

✓ Soumission de rapport trimestriel le 24 juin 2013
✓ Soumission de rapport annuel 15 Mars 2013

- **Visites de suivis**

Des visites périodiques sont prévues et sont effectuées dans les quartiers afin de suivre le déroulement des activités sur le terrain.

- **Enquête de satisfaction**

✓ **Maisons réparées finalisée.**
Le rapport a été soumis. Une restitution des principaux résultats a été faite le 20 mai 2013.

✓ **Plateformes communautaires finalisée à la fin du mois de mai.**
Environ 1248 personnes ont répondu aux questions des enquêteurs. Le rapport est en cours de finalisation et doit être soumis bientôt.

✓ **Processus de retour à réaliser à la mi-juillet.**

- Termes de références et méthodologie en cours d'élaboration
- Elaboration des outils d'enquête en cours

- **Comité de pilotage**
Le 2e Comité de Pilotage a été réalisé au cours du mois de février comme prévu. Depuis, il a été décidé de tenir le comité de pilotage tous les trois mois. Par conséquent, une nouvelle session doit être réalisé sous peu.

- **Evaluation et Formation des Plateformes communautaires**

Un focus groupe a été réalisé avec les différents membres des plateformes communautaires sur le volet formation dans le cadre leur renforcement de capacité depuis le mois de mars. Comme mentionné plus haut, une firme de formation est en train d'être recrutée afin de dispenser les séances de formation selon les thématiques demandées par les plateformes communautaires.

- **Réalisations de Vidéos et documentaires du projet**

Deux firmes ont été embauchées pour la réalisation de vidéos et documentaires informatifs du projet dans le cadre de la systématisation de l'expérience du projet : Ciné Institute réalise des vidéos et documentaires sur l'ensemble des composantes et activités du projet et Kanaki qui réalise des Histoires de vie illustrant la vie dans les quartiers du 16/6. Des vidéos et documentaires ont déjà été finalisés. Des séances de screening sont en cours afin de les quartiers pour les diffuser aux membres de Plateformes communautaires et leurs communautés respectives.

- **After Action Review**
Le 1er After Action Review devait se tenir au cours du mois d'avril. Il a été reporté compte tenu de l'indisponibilité de certains membres clés de l'équipe du projet au cours de la période. Il a été est prévu pour le mois de septembre 2013.

- **Plan annuel des activités et Révision budgétaire 2013** de Suivi et Evaluation & Gestion de Connaissances finalisés

- **Dashboard**- Draft du 5e Dashboard envoyé et partagé pour commentaires

5. COMMUNICATION

Avec The Edge, la firme de communication recrutée, plusieurs produits sont déjà réalisés, dont les cahiers de formation pour le programme Ann Ale, les gilets pour les travailleurs de chantiers et de terrain, les tabliers pour les commerçants, le jingle de promotion du projet, les cartes zonages des différents quartiers, un package de visibilité sur les quartiers (Article, Photos, vidéos), les panneaux métalliques sur les scénarios d'investissements effectués dans les quartiers, les plaques métalliques à placer sur les lampadaires et les kiosques d'eau. L'installation des panneaux métalliques a débuté depuis la mi-juin au niveau des quartiers Morne Lazare, Nérette et Morne Hébo. Tandis que pour les plaques, l'installation doit

commencer au début du mois de juillet.

Plusieurs actions de communication sont prévus pour les prochains mois, notamment une activité dénommée « le projet 16/6 en photos tous les derniers vendredi du mois » ; la formation pour des jeunes en Photographie et vidéographie ; ; la diffusion dans les quartiers et sur la TNH des vidéos déjà produites, la réalisation de trois émissions sur Radio MINUSTAH sur les thèmes (Contrôle de qualités MTPTC, Implication des plateformes et stratégie de pérennité), mais qui ont déjà commencé ; la réalisation de photos et vidéos des travaux en cours dans les différents quartiers.

- **Vidéos de présentation des agences et institutions impliquées dans le 16.6 à réaliser**

- **Web site du projet 16/6 maintenant opérationnel (www.projet16-6.org)**

- ✓ Les informations qui s'y trouvent varient en fonction des différents volets du projet, notamment : Fiches sociodémographiques et historiques des huit (8) quartiers prioritaires, Vidéos sur les travaux réalisés dans les quartiers, Vidéos d'opinion des membres des plateformes sur les travaux réalisés par 16/6, les types d'investissements qui se font, les cartes de zonage des quartiers, etc.

- ✓ Partage de lien sur les différents partenaires du projet.
- ✓ Présentation des différentes agences exécutantes et les partenaires et leurs modes d'intervention
- ✓ Des liens de connexions sont créés avec le compte Facebook du projet et celui de Twitter.

16/6 SEIZE QUARTIERS / SIX CAMPS

HISTOIRE DE LA PERIODE

Nos bénéficiaires nous parlent !

Je m'appelle Clotilde Dady Joseph, je suis bénéficiaire du projet de reconstruction des maisons rouges (maisons collectives). Je travaille présentement comme manœuvre sur le site de construction du chantier de Morne Hercule.

J'ai eu connaissance du projet 16/6 par les agents d'information de l'UNOPS. Ils recherchaient d'éventuels propriétaires de maisons détruites afin de créer un projet pilote de construction de maisons collectives ; j'ai aimé ce nouveau concept et je me suis empressée de m'inscrire dans ce programme. Et depuis lors, j'ai suivi toutes les séances de formation et d'information du projet.

Il faut vous dire aussi que j'habite depuis le début des travaux chez ma fille qui habite la zone aussi, la vie n'est pas toujours très rose, vous savez lorsqu'on ne vit pas chez soi. Mais je suis très confiante que cette situation prendra fin très bientôt puisque ma maison est pratiquement finie et ce matin encore je pouvais constater que l'eau coulait dans les robinets. C'est tout simplement extraordinaire pour moi ! J'ai pu constater, malgré mon âge avancé qu'il est possible de recommencer et de retrouver l'espoir après la ruine.

J'adore ma nouvelle maison, et je dirais, plus encore, j'ai participé aux travaux de construction et j'ai même contribué financièrement à hauteur de 850.00 $ us en termes de matériaux. Je suis assurée de la bonne qualité des matériaux et des bonnes pratiques de construction.

Je peux dire que le projet 16/6 a complètement changé ma vie. Avant, le tremblement de terre, je possédais une quincaillerie mais les affaires n'allaient pas trop forts. Grâce au projet et l'emploi que j'ai pu avoir ; je suis en mesure d'aider ma famille, ma mère qui est âgée et j'économise aussi pour relancer mon affaire à la fin du projet.

Source : Marjorie Jasmin Charles-Marc/M&E Associate UNOPS

Je ne crains point cette saison pluvieuse

Félix Emmanuel, 54 ans, s'est levé ce matin, a remercié Dieu pour cette nuit sans pépins. La tasse de café que lui a préparée sa chère femme sirotée, Félix peut commencer sa ronde habituelle du quartier. Bonjour, commère Jeanne ! Je ne vois plus mon filleul. J'espère que tout va pour le mieux. Bonjour, les jeunes ! Vous tenez le coup ? Félix, Père Fe pour les jeunes, est une référence pour la zone, un modèle de sagesse. De plus, il milite pour le changement depuis sa tendre jeunesse. Membre de plusieurs organisations de son quartier, il aime montrer les réalisations avec lesquelles on peut associer son nom.

D'un pas léger mais respectant la configuration des lieux, le quinquagénaire descend les interminables marches de cet escalier qui conduit au bas de la rue Mirambeau, une des voies principales de Morne Hebo, le quartier de tous ses souvenirs heureux et malheureux. Jusqu'au mois de mars de cette année, sa tournée matinale était faite de pauses chez quelques amis d'enfance et de jeunesse pour discuter de football et des faits saillants de l'actualité, mais depuis qu'ont débuté les travaux dans la ravine, notre homme s'en va sans arrêt en un endroit la surplombant. Ce lieu, c'est le mur juste en face du Collège Mixte La Sainte Divinité, là où ses amis y vont aussi pour voir hommes et femmes à l'œuvre, entre 7 heures 30 AM et 4 heures PM.

A l'entrée de cette voie qui fait à peine un mètre de large, se trouve une boutique. Le propriétaire écoute et permet à ses clients potentiels d'écouter grâce à une batterie usée l'actualité du jour. On parle de la saison cyclonique, des 18 cyclones dont 9 ouragans. L'année dernière, à pareille heure, cette information aurait laissé les gens de glace. Mais aujourd'hui, la peur a quitté les visages. Mine de rien, Père Fe, avec un visage traversé par les feux de la fierté, lâche pour nos oreilles et celles de son entourage tout aussi heureux de constater les grands changements et espoirs qu'apportent ces travaux : » Je ne crains point la saison pluvieuse. Mon quartier est prêt à faire face aux inondations pour la première fois depuis que j'y habite. Honneur au 16/6 ! »

Sa voisine Syllia qui rejoint le groupe quelque temps plus tard est du même avis : »En période pluvieuse, nous dormions un œil ouvert, un œil fermé, c'est-à-dire prêts à fuir si le pire devait arriver. Les travaux sont en phase terminale, mais déjà nous ne nous faisions aucun souci ».

Au Morne Hebo, quartier de Canapé-Vert, un vote des scenarios a eu lieu en date du 02 février 2013. La population avait eu à choisir dans un processus tout à fait démocratique l'option des travaux de mitigation parmi les priorités définies lors des exercices de planification communautaire. Les travaux démarrés quelques jours après ont permis à des dizaine hommes et femmes de cette communauté de travailler, contribuer au changement physique de leur quartier tout en gagnant de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

La plateforme communautaire de ce quartier, validée, légalisée et bientôt détentrice d'un compte bancaire, exécutera sous peu des petits projets communautaires qu'elle a elle-même identifiés, élaborés. Une commission d'experts et renforcée par des représentants des mairies de Port-au-Prince et de Pétion-Ville a validé les projets conformes au plan d'aménagement du territoire national et, en particulier, à celui des communes concernées. L'exécution des petits projets sont vus par les communautés comme des investissements supplémentaires qui renforcent la prise en main de leur développement.

Source : Charlito Louissaint/ Communications 16/6

16/6 SEIZE QUARTIERS / SIX CAMPS
