



Срок реализации:
28.12.2022 -
31.12.2025

ДОКУМЕНТ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА

Название Совместного проекта: Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития

Исполняющий партнер: Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Дата начала Совместного проекта: дата регистрации Совместного проекта в базе данных проектов и программ международной технической помощи

Дата окончания Совместного проекта: 36 месяцев с даты регистрации Совместного проекта в базе данных проектов и программ международной технической помощи

Дата заседания комитета по оценке Совместного проекта: 20.10.2022

Краткое описание


Республика Беларусь привержена идеям и принципам устойчивого развития. Положения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня – 2030) нашли свое отражение в стратегических и программных документах, таких как Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, государственные программы и планы. Эффективное функционирование созданных в Республике Беларусь механизмов по имплементации и продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР) является важным элементом для ускорения реализации Повестки дня – 2030. Эффективное функционирование этой системы требует дополнительного финансирования, которое предусматривается Совместным проектом.


Совместный проект содействует Республике Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития и включает мероприятия, предусматривающие поддержку функционирования национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР, содействие во включении ЦУР в систему регионального планирования, а также развитие и функционирование системы сбора, мониторинга и оценки данных по Целям устойчивого развития.

Дополнительный результат: Дополнительные результаты отражены в странных программах агентств ООН как указано в Матрице результатов Совместного проекта	Общая сумма требуемого финансирования:	3,462,891 доллар США	
	Общая сумма выделенного финансирования	3,462,891 доллар США	
		Софинансирование (ресурсы агентств системы ООН)	Нет
		Донор (Правительство Российской Федерации через Офис многопартнёрского трастового фонда ПРООН):	3,462,891 доллар США
		Правительство:	Нет
	Взносы в натуральной форме:	Нет	
Неподтвержденный бюджет:	Нет		

СОГЛАСОВАНО:

Организации ООН	Министерство иностранных дел Республики Беларусь
<p><i>Александра Соловьёва</i></p>   <p>Постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь</p> <p>Дата</p>	<p><i>Юрий Амбразевич</i></p>   <p>Заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь</p> <p>Дата</p>
<p><i>Рустам Хайдаров</i></p>   <p>Представитель ЮНИСЕФ в Республике Беларусь</p> <p>Дата</p>	
<p><i>Ольга Атрощенко</i></p>   <p>Глава офиса ЮНФПА в Республике Беларусь</p> <p>Дата</p>	

<p><i>Д-р Сергей Диордица</i></p>  <p>Представитель ВОЗ в Беларуси / Руководитель Странового офиса ВОЗ в Беларуси</p> <p>Дата</p>	
--	--



Оглавление


<i>Список сокращений</i>	5
<i>I. Проблема развития</i>	7
<i>II. Стратегия</i>	8
<i>III. Результаты и партнерства</i>	11
<i>IV. Управление Совместным проектом</i>	22
<i>V. Матрица результатов</i>	25
<i>VII. Многолетний рабочий план</i>	48
<i>VIII. Механизмы руководства и управления</i>	76
<i>IX. Правовые рамки</i>	79
<i>X. Управление рисками</i>	80
ПРИЛОЖЕНИЯ	84
Приложение 1. Предоставление услуг страновых офисов ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ по сопровождению реализации Совместного проекта.....	85
<i>Приложение 2: Типовая форма социального и экологического опроса</i>	89
<i>Приложение 3. Анализ рисков</i>	96
<i>Приложение 4. Примерные технические задания Координационного комитета Совместного проекта и ключевого персонала Совместного проекта</i>	100
<i>Приложение 5. Бюджет Совместного проекта</i>	103



Список сокращений

Белстат	Национальный статистический комитет Республики Беларусь
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
Дорожная карта по ЦУР	Дорожная карта по реализации ЦУР в Республике Беларусь ¹
ДПС ВОЗ	Двухгодичный план сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2022–2023 годы
ДСП ПРООН	Документ страновой программы ПРООН для Республики Беларусь на 2021–2025 годы
ДСП ЮНИСЕФ	Документ страновой программы ЮНИСЕФ для Республики Беларусь на 2021–2025 годы
ДСП ЮНФПА	Документ страновой программы ЮНФПА для Республики Беларусь на 2021–2025 годы
КК	Координационный комитет
МИД	Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Минздрав	Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Мининформ	Министерство информации Республики Беларусь
Минобразование	Министерство образования Республики Беларусь
Минприроды	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Минтруда и соцзащиты	Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
МПТФ	Офис многопартнёрского трастового фонда Программы развития ООН
Нацбанк	Национальный банк Республики Беларусь
Национальная архитектура управления процессом достижения ЦУР	Национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию, Парламентская группа устойчивого развития; Партнерская группа устойчивого развития; Общественный совет по формированию и мониторингу стратегий устойчивого развития; Региональные группы устойчивого развития; Группа по координации средств массовой информации по продвижению ЦУР; Молодежные послы ЦУР
НИЗ	Неинфекционные заболевания
НППО	Национальная платформа представления отчетности по Целям устойчивого развития Республики Беларусь
НСУР – 2030	Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года

¹ Дорожная карта по реализации ЦУР – документ по реализации Повестки дня - 2030, разработанный экспертами MAPS миссия https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/FINAL_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%A3%D0%A0_RU_25_06.pdf



НСУР – 2035	Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года
Облисполкомы	Областные исполнительные комитеты
ОГО	Организации гражданского общества ²
ООН	Организация Объединенных Наций
ПК ООН	Постоянный координатор ООН
Платформы ускорения ЦУР	Платформы ускорения достижения ЦУР ³
Повестка дня – 2030	Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
ПРООН	Программа развития ООН
Росстат	Федеральная служба государственной статистики
Совместный проект	Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития» ⁴
ЦУР	Цели устойчивого развития
ЮНИСЕФ	Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
ЮНФПА	Фонд ООН в области народонаселения
MAPS миссия	Миссия ООН «Интеграция, ускорение и поддержка политики» ⁵



² Организации гражданского общества - общественные организации, профессиональные ассоциации.

³ Платформы ускорения достижения ЦУР – направления развития, осуществление которых сможет помочь преодолеть вызовы и достичь результаты развития, способствуя получению наилучшего эффекта от преобразований для всех ЦУР («Зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту, Ориентация на будущие поколения; Цифровые трансформации и социальные инновации; Гендерное равенство в обществе).

⁴ Совместный проект - проект, реализуемый Республикой Беларусь при поддержке ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ

⁵ MAPS миссия – миссия сотрудников ООН в Республику Беларусь, которая была организована ООН в сотрудничестве с Правительством Республики Беларусь для анализа достижений Республики Беларусь в области устойчивого развития и ее долгосрочных приоритетов

I. Проблема развития

Республика Беларусь привержена выполнению Повестки дня - 2030 и предпринимает ряд важных шагов для ее осуществления на национальном и местном уровнях. Сформирована национальная архитектура управления процессом достижения ЦУР в Республике Беларусь. Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 181 учрежден Институт Национального координатора по достижению ЦУР. Этим же Указом определен перечень государственных органов и иных организаций, ответственных за реализацию ЦУР и входящих в состав Совета по устойчивому развитию. К работе Совета могут привлекаться представители деловых кругов, общественных организаций и международных организаций. Обеспечение деятельности Национального координатора по достижению ЦУР и Совета по устойчивому развитию осуществляется МИД.

В Республике Беларусь с учетом оценки результатов выполнения НСУР-2030 и принципов Повестки дня - 2030 разработана и одобрена НСУР – 2035. Процесс подготовки НСУР-2035 совпал с процессом подготовки и утверждения Программы социально-экономического развития на 2021–2025 годы и государственных программ в рамках нового пятилетнего программного цикла в сферах демографической безопасности, социального обеспечения, образования, охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, энергосбережения, инновационного развития. ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ оказывали содействие в разработке НСУР–2035 и взаимодействовали с Минприроды, Минздравом, Минтруда и соцзащиты, и другими государственными органами по разработке государственных программ на 2021–2025 годы с учетом ЦУР.

В 2017 году была сформирована Национальная система показателей для мониторинга достижения ЦУР, которая по состоянию на 1 августа 2022 г. включает 267 показателей, из них 168 показателей соответствуют глобальному перечню и 99 показателей прокси, данные по которым косвенно отвечают требованиям, а для 84 показателей установлены национальные целевые значения.

В 2018 году начала работу разработанная Белстатом при поддержке ПРООН и ЮНИСЕФ Национальная платформа представления отчетности по Целям устойчивого развития Республики Беларусь <http://sdgplatform.belstat.gov.by>. Данный ресурс позволяет в режиме реального времени отслеживать прогресс в достижении Республикой Беларусь ЦУР.

В 2019 году при поддержке ЮНИСЕФ завершено Многоиндикаторное кластерное обследование (МИКС 6), ставшее источником данных для 21 индикатора ЦУР. По ряду показателей ЦУР со стороны Белстата, государственных органов, ответственных за достижение ЦУР, отмечается недостаток целевых значений, национальных методологий, эквивалентных международным методикам расчета показателей ЦУР, а также практики, компетенции и надлежащего потенциала для проведения сбора данных по ЦУР, осуществления мониторинга и оценки уровня достижения ЦУР и установленных индикаторов ЦУР.

В Республике Беларусь осуществляется работа по вовлечению молодежи в процесс достижения ЦУР, на конкурсной основе выбраны молодежные послы ЦУР, утверждена Стратегия развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года с учетом ЦУР.

В Республике Беларусь проводится работа по информированию различных целевых групп о Повестке дня – 2030, национальных усилиях по ее выполнению и освещению деятельности

Национального координатора по достижению ЦУР, Совета по устойчивому развитию и других элементов национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР. В этих целях ведется специальный сайт sdgs.by, а также соцсети Facebook, Instagram, Twitter. Мининформ обеспечило создание и функционирование Группы по координации средств массовой информации по продвижению ЦУР.

В 2018 году в Республике Беларусь проведена MAPS миссия, по ее итогам подготовлена Дорожная карта по реализации ЦУР в Республике Беларусь, которая включает следующие Платформы ускорения ЦУР (акселераторы ЦУР):

- i) «Зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту (ЦУР 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15);
- ii) Ориентация на будущие поколения (ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16);
- iii) Цифровые трансформации и социальные инновации (ЦУР 4, 8, 10, 11, 12, 16,17);
- iv) Гендерное равенство в обществе (ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16).

Дорожная карта по реализации ЦУР в Республике Беларусь представлена на заседании Совета по устойчивому развитию и принята к сведению членами Совета (протокол заседания Совета по устойчивому развитию от 26 июня 2019 г. №3). Для ее реализации требуется дополнительное финансирование, в том числе по таким направлениям как региональные аспекты планирования, мониторинг и оценка имплементации ЦУР.

II. Стратегия

Целью Совместного проекта является оказание содействия Республике Беларусь по национализации и локализации Целей устойчивого развития.


Задачами (компонентами) Совместного проекта являются:

1. Обеспечение функционирования Национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР и укрепление потенциала в достижении ЦУР⁶.
2. Содействие в разработке и реализации стратегических документов прогнозирования и планирования с учетом ЦУР и поддержка достижения ЦУР на местном уровне.
3. Совершенствование системы мониторинга достижения ЦУР на национальном и местном уровнях.
4. Обеспечение эффективного управления, мониторинг и оценка Совместного проекта.

Для достижения цели Совместного проекта мероприятия сгруппированы в рамках 4 задач (компонентов).

Мероприятия Задачи (компонента) 1 направлены на обеспечение функционирования Национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР и укрепления потенциала лиц, принимающих решения в вопросах ЦУР на национальном и региональном уровнях, непосредственной вовлеченности граждан (в том числе молодежи), ОГО, бизнес-сообществ в процессы имплементации ЦУР, поддержку государственно-общественного диалога по тематике устойчивого развития, а также разработки методологических основ для принятия решений с учетом ЦУР

⁶ Укрепление потенциала в достижении ЦУР – процесс развития и укрепления навыков, знаний, опыта, ресурсов государственных служащих и ОГО для эффективной реализации Повестки дня - 2030



(методологии оценки проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия ЦУР, проведения экспертизы нормативных правовых актов с точки зрения демографического устойчивого развития, а также расчета показателей ЦУР и др.). Данная деятельность будет дополнена проведением информационных кампаний по популяризации принципов и идей ЦУР и прогресса по их достижению.


В рамках Задачи (компонента) 2 планируется оказание экспертной поддержки в локализации ЦУР и включении ЦУР в систему планирования и прогнозирования. Кроме того, для выполнения этой задачи в рамках Совместного проекта будут реализованы пилотные инициативы по ЦУР, демонстрирующие практические результаты достижения ЦУР на местном уровне с акцентом на Платформы ускорения ЦУР.

В рамках Задачи (компонента) 3 будет оказана поддержка по совершенствованию системы сбора, мониторинга и оценки данных по ЦУР. Центральное место в этом компоненте занимает процесс совершенствования методологий сбора и оценки данных по отдельным показателям ЦУР.

Задача (компонент) 4 включает обеспечение эффективного управления Совместным проектом и координацию как между агентствами системы ООН, так и национальными партнерами.


Начиная с 2017 года агентства ООН активно поддерживают усилия Республики Беларусь по выполнению Повестки дня – 2030 и реализуют проекты по тематике устойчивого развития, используя внутренние ресурсы агентств ООН. В настоящее время МИД при поддержке ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ реализует проект, направленный на поддержку функционирования Национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР в Республике Беларусь.

Настоящий Совместный проект, реализуемый МИД совместно с другими государственными органами при координации Национального координатора по достижению ЦУР и при экспертной и технической поддержке ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ, станет продолжением совместной работы Республики Беларусь и агентств системы ООН по выполнению Повестки дня - 2030.



Теория изменений

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

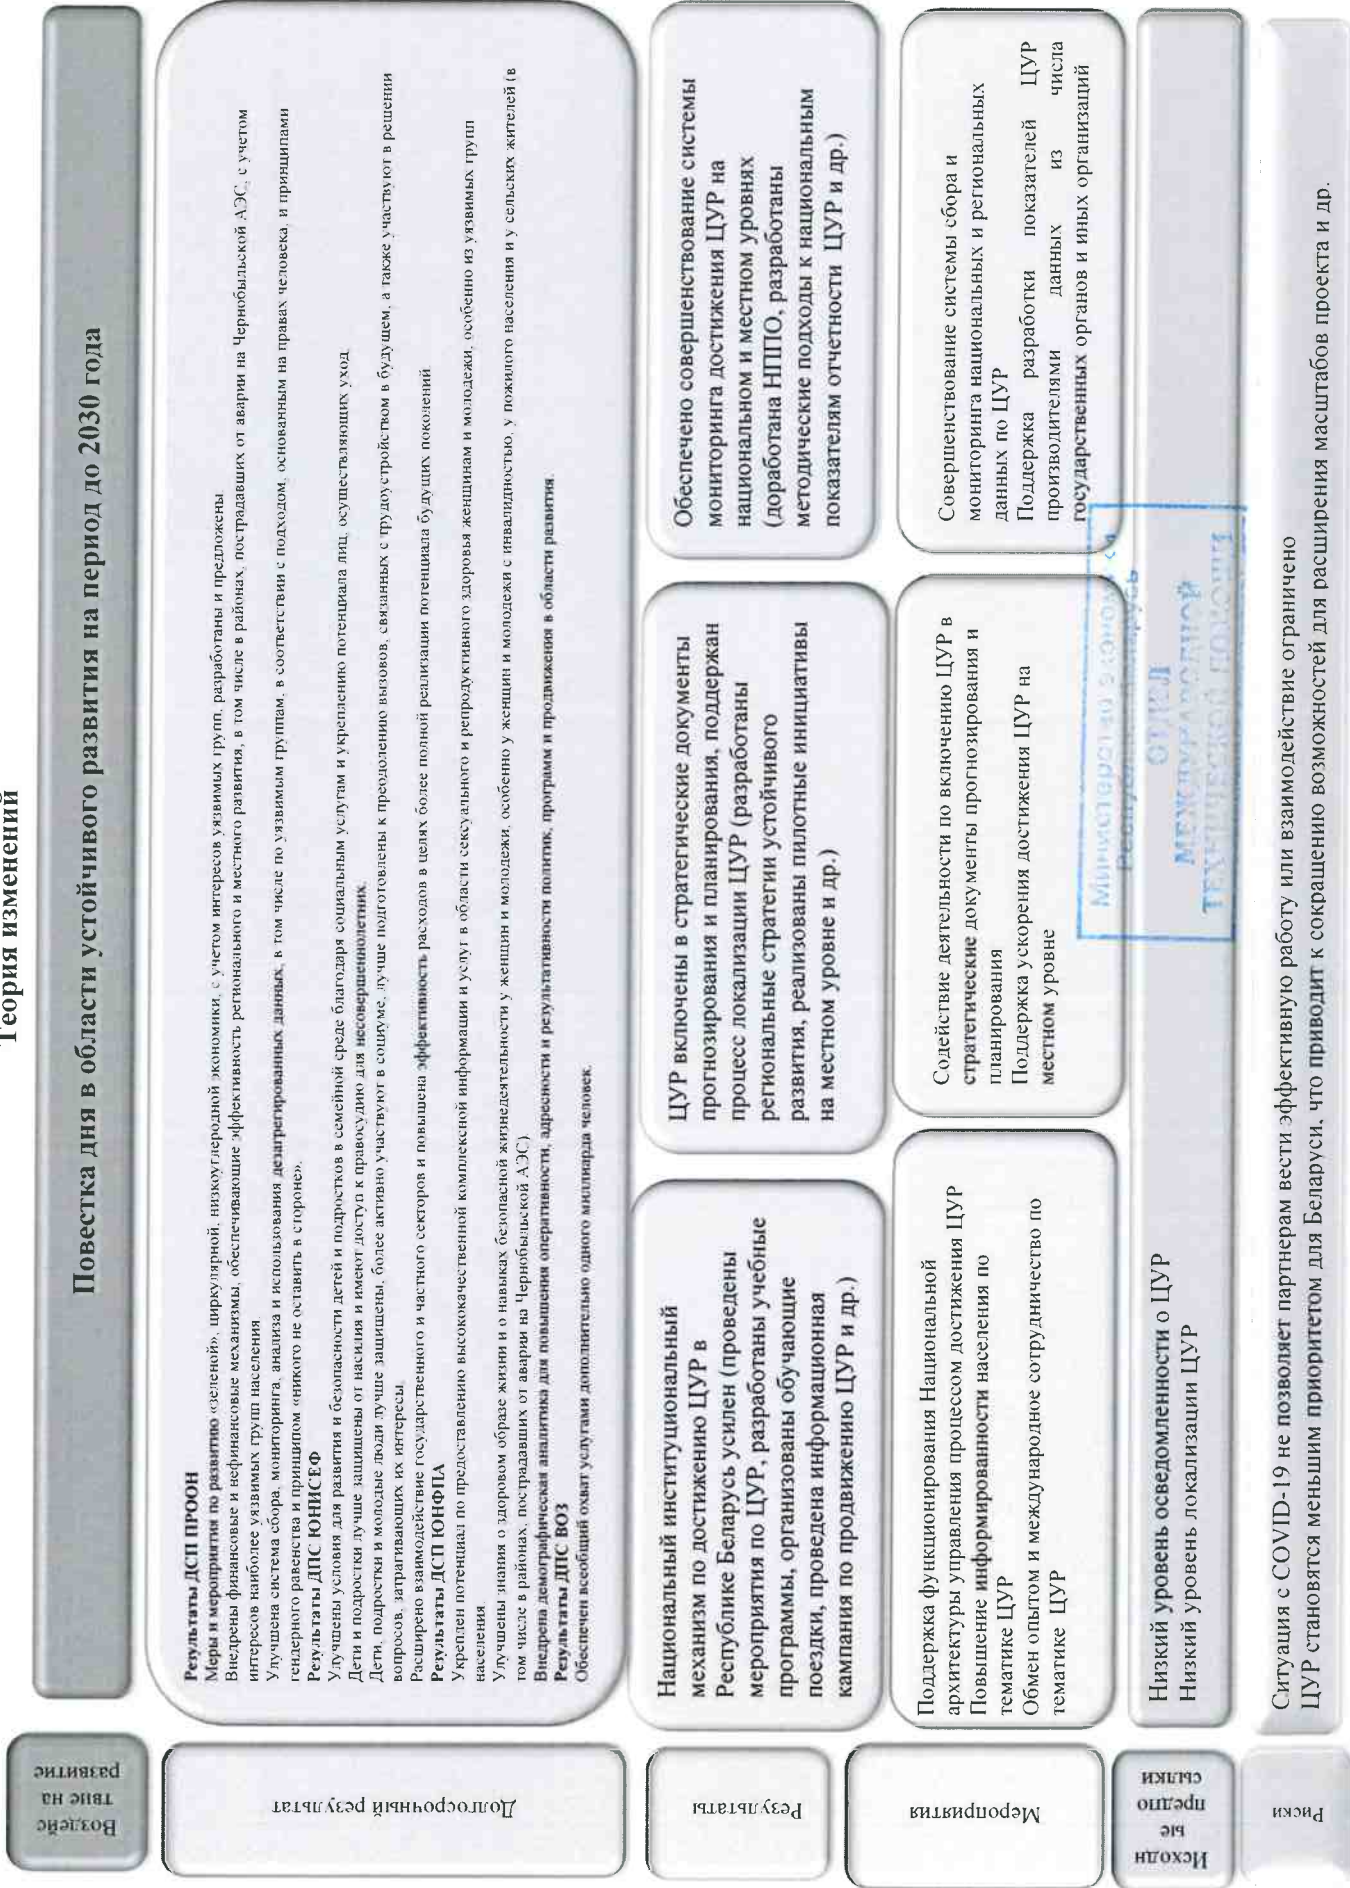

III. Результаты и партнерства

Результаты и мероприятия:

Для достижения цели Совместного проекта в рамках задач (компонентов) будут осуществляться следующие мероприятия:

ЗАДАЧА (КОМПОНЕНТ) 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР И УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ДОСТИЖЕНИИ ЦУР

Результат 1. Национальный институциональный механизм по достижению ЦУР в Республике Беларусь усилен

Мероприятие 1.1. Поддержка функционирования Национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР и разработка методологических основ для принятия решений с учетом ЦУР

1.1.1. Для поддержки и расширения государственно-общественного диалога по теме устойчивого развития ПРООН окажет содействие Национальному координатору по достижению ЦУР, МИД, другим государственным органам и организациям, входящим в Национальную архитектуру управления процессом достижения ЦУР, в проведении мероприятий по тематике устойчивого развития, включая мероприятия, предусмотренные в Плане работы Совета по устойчивому развитию (*привлечение экспертов (организаций) для проведения круглых столов, форумов, конференций, заседаний и других мероприятий*).


1.1.2. На основании анализа международного опыта (включая российский) ПРООН окажет содействие МИД в разработке методологии оценки проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия ЦУР, и апробировании методологии на примере одного проекта нормативного правового акта (*привлечение экспертов (организаций) для разработки методологии и ее апробировании, проведение мероприятий по обсуждению проекта методологии с заинтересованными и др.*).

1.1.3. ЮНФПА окажет содействие Минтруда и соцзащиты в повышении потенциала сотрудников Минтруда и соцзащиты и других государственных органов в области учета демографических факторов при разработке проектов нормативных правовых актов (*привлечение экспертов (организаций) для проведения образовательных мероприятий, разработки рекомендаций и др.*).

1.1.4 ЮНФПА окажет содействие Минздраву в проведении оценки законодательства в сфере охраны репродуктивного здоровья для мужчин и женщин в контексте ЦУР, обсуждении с национальными партнерами и подготовке рекомендаций по его совершенствованию. Поддержка также будет оказана в развитии практических подходов по укреплению репродуктивного здоровья в регионах страны и организации их обсуждения с заинтересованными сторонами (*привлечение экспертов (организаций) для проведения оценки законодательства, подготовки рекомендаций и др.*).

Мероприятие 1.2. Повышение информированности населения по тематике ЦУР

1.2.1. ПРООН окажет содействие МИД в проведении республиканского социологического опроса среди различных социальных групп и категорий населения (мужчины, женщины, молодежь, пожилые люди, люди с инвалидностью и др.) на предмет их знания ЦУР (*привлечение экспертов (организаций) для проведения социологического опроса и др.*).



1.2.2. ПРООН окажет содействие Мининформу в разработке и реализации коммуникационной стратегии по продвижению ЦУР в Республике Беларусь. При разработке коммуникационной стратегии будет учитываться опыт в этом направлении России, других стран ЕАЭС. Реализация этой стратегии будет направлена на популяризацию ЦУР и инструментов их достижения в обществе и на повышение осведомленности граждан по тематике устойчивого развития *(привлечение экспертов (организаций) для разработки коммуникационной стратегии, проведение мероприятий по ее обсуждению, привлечение экспертов (организаций) для реализации коммуникационной стратегии, включая производство видеороликов, изготовление и размещение билбордов и др.)*.

1.2.3. ПРООН окажет содействие МИД в подготовке и проведении конкурса «Чемпионы ЦУР» среди государственных органов, общественных организаций, частных компаний. Победителями конкурса станут те организации, которые внесли значительный вклад в достижение ЦУР *(привлечение экспертов (организаций) для разработки положения о конкурсе, организации и проведения конкурса)*

1.2.4. ЮНФПА окажет содействие Минтруда и соцзащиты в проведении мероприятий по обмену между заинтересованными передовым опытом и лучшими практиками активного долголетия, в том числе проведение слетов волонтеров «серебряного возраста», представителей советов пожилых граждан и др., информационно-просветительской кампании, направленной на информирование общества о вкладе людей старшего возраста в достижение ЦУР путем участия в волонтерском движении, принятии решений по значимым вопросам жизнедеятельности *(привлечение экспертов (организаций) для разработки коммуникационного плана кампании и его реализации, включая производство роликов и др. коммуникационных продуктов и др.)*

1.2.5. ЮНИСЕФ окажет содействие Минобразования в работе с Молодежными послами ЦУР (отбор и деятельность Молодежных послов ЦУР регламентированы положением о конкурсе Молодежных послов ЦУР и положением о Молодежных послых ЦУР) с учетом наилучшего опыта Российской Федерации и других стран *(привлечение экспертов (организаций) для проведения мероприятий с участием Молодежных послов ЦУР и разработка коммуникационных продуктов (видео, билборды и др.)*.


1.2.6. ЮНИСЕФ окажет содействие Минобразования по проведению кампании по направлению «Ориентация на будущие поколения: подростки и молодежь» *(привлечение экспертов (организаций) для разработки коммуникационного плана кампании и его реализации, включая разработку коммуникационных продуктов (видео, билборды и др.)*.

1.2.7. Тематическая экспертная поддержка мероприятий Совместного проекта по информационному направлению продвижения ЦУР будет обеспечена ПРООН *(привлечение экспертов, консультантов)*.

1.2.8. Тематическая экспертная поддержка мероприятий Совместного проекта по вопросам детей и молодежи будет обеспечена ЮНИСЕФ *(привлечение экспертов, консультантов)*.

Мероприятие 1.3. Обмен опытом и международное сотрудничество в осуществлении ЦУР

1.3.1. ПРООН окажет содействие МИД в подготовке, обсуждении с широким кругом заинтересованных сторон и публикации добровольного национального обзора о реализации Республикой Беларусь Повестки дня – 2030 *(привлечение экспертов (организаций) для подготовки добровольного национального обзора, для подготовки презентационных мероприятий, видео, проведение мероприятий по обсуждению добровольного национального обзора с заинтересованными и др.)*.



1.3.2. ПРООН окажет поддержку МИД в проведении в Республике Беларусь Международной конференции по обмену опытом в области достижения ЦУР *(привлечение экспертов (организаций) для организации и проведения конференции и др.)*.

Мероприятие 1.4. Повышение знаний и компетенций в вопросах ЦУР

1.4.1. ПРООН окажет содействие Министерству образования Республики Беларусь в разработке учебных материалов по вопросам достижения ЦУР для их последующего использования в учебных программах повышения квалификации руководящих работников и специалистов, а также в качестве учебных программ обучающих курсов *(привлечение экспертов (организаций) для разработки учебных материалов, проведение мероприятий по обсуждению разработанных учебных материалов с заинтересованными и др.)*.

1.4.2. При поддержке ПРООН учреждением образования «Белорусский государственный педагогический институт имени Максима Танка» будет подготовлен добровольный университетский обзор о реализации Повестки дня – 2030 *(привлечение экспертов (организаций) для подготовки добровольного университетского обзора, проведение мероприятий по обсуждению добровольного университетского обзора с заинтересованными и др.)*.

1.4.3. ПРООН окажет содействие МИД по разработке и реализации программ обмена опытом и изучения наилучших практик в области достижения ЦУР в Российской Федерации *(Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития (МРГ), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) и др.)*, а также в других странах. Целевой аудиторией данных программ станут представители Совета по устойчивому развитию, региональных, парламентской и партнерской групп устойчивого развития *(привлечение экспертов (организаций) для организации и проведения обучающих поездок в иностранные государства и др.)*.


1.4.4. ЮНИСЕФ окажет содействие Министерству образования Республики Беларусь в разработке и апробировании учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития *(привлечение экспертов (организаций) для разработки и апробации учебных курсов, проведение мероприятий по обсуждению разработанных учебных курсов и др.)*.

1.4.5. ЮНИСЕФ окажет экспертную поддержку Министерству образования Республики Беларусь в организации и проведении в учебных заведениях Самого большого урока в мире по ЦУР *(привлечение экспертов (организаций) в организации и проведении урока и др.)*.

1.4.6. ВОЗ окажет содействие Минздраву в разработке учебного модуля по вопросам общественного здравоохранения, профилактики неинфекционных заболеваний и продвижения здорового образа жизни в привязке к ЦУР *(привлечение экспертов (организаций) для разработки учебных модулей, раздаточных материалов, проведения демонстрационных семинаров и др.)*.

При разработке учебного модуля по общественному здравоохранению и профилактике неинфекционных заболеваний будут проводиться консультации, а также будет использован экспертный потенциал Министерства здравоохранения Российской Федерации и Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (Москва, Российская Федерация).

ЗАДАЧА (КОМПОНЕНТ) 2: СОДЕЙСТВИЕ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЦУР И ПОДДЕРЖКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР НА МЕСТНОМ УРОВНЕ



Результат 2. ЦУР включены в стратегические документы прогнозирования и планирования и ускорен процесс локализации ЦУР.

Мероприятие 2.1. Включение ЦУР в стратегические документы прогнозирования и планирования

К моменту начала реализации Совместного проекта разработаны и приняты следующие ключевые документы, учитывающие индикаторы ЦУР: 1) НСУР-2035, 2) Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, 3) государственные программы на 2021–2025 годы.

2.1.1. ПРООН окажет содействие областным исполнительным комитетам в разработке (обновлении) региональных стратегий устойчивого развития (6 стратегий). При разработке (обновлении) этих стратегий будут учитываться Платформы ускорения ЦУР и использоваться отдельные показатели ЦУР в качестве целевых показателей. Обсуждение разработанных (обновленных) стратегических документов будет осуществляться на семинарах и круглых столах с участием представителей государственных органов и ОГО. Предполагается последующее одобрение стратегий областными исполнительными комитетами и их презентация широкой общественности (*привлечение экспертов (организаций) для разработки (обновления) стратегий, проведения мероприятий по обсуждению стратегий и их презентации и др.*).

2.1.2. ПРООН окажет содействие МИД в разработке и наполнении онлайн-платформы наилучших практик, связанных с достижением ЦУР (*привлечение экспертов (организаций) для разработки цифрового решения онлайн-платформы и наполнения ее информацией о наилучших практиках, связанных с достижением ЦУР и др.*).


2.1.3. ЮНФПА окажет содействие Министерству экономики Республики Беларусь и Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь и организациям, которые будут определены ими, в повышении потенциала специалистов государственных органов в области учета демографических факторов, использования системы национальных трансфертных счетов в процессе государственного планирования (*привлечение экспертов (организаций) для проведения семинаров, разработки раздаточных материалов и др.*).

2.1.4. ЮНФПА окажет содействие Министерству экономики Республики Беларусь и Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь и организациям, которые будут определены ими, в проведении информационно-просветительских мероприятий по вопросам учета демографических факторов и их влияния на демографическое устойчивое развитие в процессе бюджетирования государственных ресурсов (*привлечение экспертов (организаций) для разработки информационных материалов и проведения информационно-просветительских мероприятий и др.*).

2.1.5. Тематическая экспертная поддержка мероприятий Совместного проекта по вопросам устойчивого демографического развития будет обеспечена ЮНФПА (*привлечение экспертов, консультантов*).

2.1.6. ЮНИСЕФ окажет поддержку Министерству образования Республики Беларусь и другим государственным органам, ответственным за проведение финансовой и экономической политики, в разработке методологии и оценке необходимых финансовых ресурсов для бюджетирования достижения ЦУР, связанных с детьми (*привлечение экспертов (организаций) для разработки методологии, ее обсуждения с заинтересованными и проведения оценки и др.*).

2.1.7. ПРООН окажет содействие Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в организации и проведении Форума по теме зеленого финансирования (*привлечение экспертов (организаций) для организации и проведения Форума и др.*).



Мероприятие 2.2. Поддержка ускорения достижения ЦУР на местном уровне

2.2.1. ПРООН будет оказана поддержка областным исполнительным комитетам в реализации пилотных инициатив по ЦУР, способных показать практические результаты ускорения достижения ЦУР на местном уровне. Для содействия качественной подготовке заявок для участия в конкурсе пилотных инициатив в областях будут проведены обучающие семинары (*привлечение экспертов (организаций) для проведения семинаров, проведение конкурса и реализация инициатив и др.*).

Партнерами и бенефициарами инициатив могут выступать юридические лица – органы местного управления и самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, включая общественные организации. Победители будут выбраны на конкурсной основе. Положение о порядке и условиях проведения конкурса пилотных инициатив будет разработано на начальной стадии реализации Совместного проекта и одобрено КК.

Пилотные инициативы будут выбраны для каждой Платформы ускорения ЦУР с учетом регионального принципа. Ключевыми критериями для выбора таких инициатив будут служить – соответствие цели и задачам Совместного проекта, инновационность, соответствие направлениям деятельности, предусмотренных в НСУР-2035, государственных и региональных программах, Платформы ускорения ЦУР. Инициативы будут включать как отдельные, так и сквозные темы продвижения ЦУР (например, формирование цифровых экосистем, в том числе в рамках «умных» устойчивых городов, обеспечивающих взаимодействие государства, общества и бизнеса с равным участием женщин и мужчин, подростков, молодежи и представителей наиболее уязвимых групп, предотвращение насилия в отношении женщин и др.).

При проведении конкурса и реализации пилотных инициатив будет обеспечена визуализация донора Совместного проекта (Российской Федерации) во всех победивших инициативах.

2.2.2. Тематическая экспертная поддержка мероприятий Совместного проекта по направлению региональное развитие будет обеспечена ПРООН (*привлечение экспертов, консультантов*).

ЗАДАЧА (КОМПОНЕНТ) 3: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ

Реализация мероприятий в рамках данной задачи (компонента) будет осуществляться с учетом Платформ ускорения ЦУР.

Результат 3. Обеспечено совершенствование системы мониторинга достижения ЦУР на национальном и местном уровнях

Мероприятие 3.1. Совершенствование системы сбора и мониторинга национальных и региональных данных по ЦУР

3.1.1. ПРООН окажет поддержку Белстату в доработке Национальной платформы представления отчетности по показателям ЦУР (НППО) (<http://sdgplatform.belstat.gov.by>) для обеспечения визуализации геопространственной информации по отдельным показателям ЦУР (*привлечение экспертов (организаций) для доработки НППО и др.*).

3.1.2. ЮНИСЕФ окажет поддержку Белстату в совершенствовании информационного портала «Универсальный веб-портал статистических данных о детях», включая визуализацию данных и внедрение формата SDMX для обеспечения эффективного обмена данными (*привлечение экспертов (организаций) для совершенствования портала и др.*).

3.1.3. ЮНИСЕФ окажет поддержку Белстату в разработке методологических подходов к оценке качества административных данных, их совершенствованию, а также подготовке к проведению обследования МИКС в целях мониторинга национальных и региональных индикаторов ЦУР, касающихся детей и молодежи (*привлечение экспертов (организаций) для разработки методологических подходов, а также подготовке к проведению МИКС и др.*).

3.1.4. ЮНИСЕФ окажет содействие Белстату в разработке процедуры распространения микроданных с апробацией на данных МИКС в части индикаторов ЦУР, касающихся детей и молодежи (*привлечение экспертов (организаций) для разработки процедуры распространения микроданных и ее апробации и др.*).

Мероприятие 3.2. Поддержка разработки показателей ЦУР производителями данных из числа государственных органов и иных организаций

По состоянию на 1 августа 2022 г. Национальная система показателей для мониторинга достижения ЦУР включает 267 показателей, из них 168 показателей соответствуют глобальному перечню и 99 показателей прокси, данные по которым косвенно отвечают требованиям, а для 84 показателей установлены национальные целевые значения. По ряду показателей требуется приведение в соответствие международных определений с национальными, валидация качества существующих административных данных, по другим показателям требуется разработка национальных метаданных, проведение специальных обследований, разработка дополнительных показателей по отдельным ЦУР с учетом местных особенностей развития и другое.


3.2.1. ПРООН окажет содействие Белстату в проведении обзора всех производителей данных по показателям ЦУР и выработке направлений дальнейшей работы по совершенствованию национального перечня показателей ЦУР, повышению доступности данных и обеспечению качественного мониторинга достижения ЦУР в Республике Беларусь (*привлечение экспертов (организаций) для проведения обзора и разработке рекомендаций и др.*).

Также ПРООН окажет содействие Белстату в разработке методологических подходов к оценке качества административных данных в части отдельных ЦУР по двум Платформам ускорения ЦУР: «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту и цифровые трансформации и социальные инновации (*привлечение экспертов (организаций) для разработки методологических подходов и др.*).

3.2.2. ПРООН окажет поддержку Белстату в разработке рекомендаций (методологий расчета) по национальным показателям отчётности отдельных ЦУР (не менее 2-х методологий по Платформам ускорения ЦУР: «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту и цифровые трансформации и социальные инновации), производство данных по которым осуществляют государственные органы, ответственные за реализацию ЦУР, и данные по которым недоступны или методология их формирования и расчета требует адаптации к национальным условиям. Дополнительно ПРООН обеспечит содействие в формировании счетов расходов на охрану окружающей среды (*привлечение экспертов (организаций) для разработки методологий расчета и формирования счетов расходов и др.*).

3.2.3. ЮНИСЕФ окажет поддержку Белстату в адаптации глобальных метаданных к национальным условиям для формирования и расчета показателей ЦУР, касающихся детей и молодежи в контексте Платформы ускорения ЦУР «Ориентация на будущие поколения» (*привлечение экспертов (организаций) для адаптации данных и др.*).

3.2.4. ЮНФПА окажет содействие Белстату, Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерству здравоохранения Республики Беларусь в совершенствовании расчета



показателей ЦУР, касающихся устойчивого демографического развития страны в привязке к НСУР-2035 и Платформе ускорения ЦУР «Гендерное равенство в обществе» *(привлечение экспертов (организаций) для совершенствования расчета показателей и др.)*.

3.2.5. Тематическая экспертная поддержка мероприятий Совместного проекта по направлению мониторинг и оценка ЦУР будет обеспечена ПРООН *(привлечение экспертов, консультантов)*.

Совместный проект послужит дальнейшему развитию сотрудничества между Белстатом и Росстатом, обеспечению гармонизации подходов к мониторингу Целей устойчивого развития.

ЗАДАЧА (КОМПОНЕНТ) 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА

Результат 4. Обеспечены эффективное управление Совместным проектом, мониторинг и оценка его выполнения.

Мероприятие 4.1. Управление Совместным проектом, знаниями, мониторинг и оценка.

Для достижения результатов Совместного проекта потребуются человеческие, материально-технические и временные ресурсы, направленные на управление проектом, знаниями, мониторинг и оценку.

Группа управления Совместным проектом (ГУП) включает руководителя Совместного проекта, финансового специалиста и специалиста по административным вопросам и закупкам, нанятых ПРООН в соответствии с правилами и процедурами ПРООН. Примерные технические задания персонала Совместного проекта представлены в Приложении 4. Персонал Совместного проекта будет отобран на конкурсной основе после консультаций с Исполняющим партнером (МИД). С персоналом Совместного проекта будут заключены контракты на период реализации Совместного проекта.


ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ привлекут специалистов по административным вопросам в соответствии с правилами и процедурами этих агентств.

Кроме того, в соответствии с процедурами ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ будут наниматься национальные и международные эксперты и консультанты для оказания аналитической и технической поддержки в рамках реализации Совместного проекта.

Будут обеспечены закупка офисного оборудования и размещение персонала Совместного проекта в соответствии с распределением бюджета Совместного проекта. По окончании срока реализации проекта всё приобретённое оборудование будет передано конечным получателям в соответствии с решением КК Совместного проекта.

Управление Совместным проектом будет осуществляться персоналом проекта из офиса, расположенного в г. Минске и (или) дистанционно. Помещения для размещения персонала Совместного проекта будут согласованы с МИД в установленном порядке.

В реализации Совместного проекта также будут задействованы сотрудники страновых офисов ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ, которые будут обеспечивать качество реализации



Совместного проекта. Страновые офисы ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ также будут оказывать административные услуги, перечисленные в Приложении 1. Стоимость затрат на выполнение работы вышеуказанными сотрудниками, а также на осуществление административных услуг страновыми офисами ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ будет возмещаться в сумме, не превышающей лимита, установленного в бюджете для данной категории расходов (согласно разделу VII). Стоимость услуг по проектным вопросам будет возмещаться согласно Варианту Б (Приложение 1). Стоимость административных услуг будет возмещаться согласно Варианту А (Приложение 1). Контроль за функциями этих специалистов, согласно их должностным инструкциям, осуществляется руководителями страновых офисов ООН.

Страновые офисы Участвующих агентств ООН (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ) будут предоставлять административную поддержку по реализации Совместного проекта национальным партнерам в соответствии со своими правилами и процедурами. Оперативный контроль за реализацией Совместного проекта со стороны Участвующих агентств ООН будет обеспечиваться программными сотрудниками страновых офисов ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ. Стоимость затрат на выполнение работы сотрудниками страновых офисов ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ, а также на осуществление страновыми офисами ООН административных услуг будет возмещаться в сумме, не превышающей лимита, установленного в бюджете для данной категории расходов (согласно Разделу VII). Стоимость специалистов по программным вопросам страновых офисов ООН будет возмещаться согласно Варианту Б (Приложение 1). Стоимость административных услуг страновых офисов ООН будет возмещаться согласно Варианту А (Приложение 1).

Временные рамки

Срок реализации проекта составляет 36 месяцев с даты регистрации проекта в базе данных проектов и программ международной технической помощи.

Ресурсы, необходимые для достижения результатов

Для достижения результатов необходимы трудовые ресурсы, которые будут включать:

Группу управления Совместным проектом (осуществляет общее ежедневное управление и реализацию Совместного проекта, взаимодействие с Национальным координатором по достижению ЦУР, МИД, другими национальными партнерами, агентствами ООН и др.);
экспертов и консультантов (оказывают аналитическую и техническую поддержку);
сотрудников страновых офисов агентств ООН (административная и программная поддержка).

Материально-технические ресурсы обеспечат нормальные условия труда персонала Совместного проекта (оснащение офиса, в том числе компьютерами, мониторами, многофункциональными устройствами, канцелярскими принадлежностями и другими расходными материалами), также будут содействовать информированию населения о ЦУР (брошюры, публикации и другие информационные материалы). Денежные ресурсы будут использоваться при возмещении командировочных расходов и оплате расходов на проведение заседаний и семинаров, пилотных инициатив, обучающих поездок и услуг по контрактам. Ресурсы используются в соответствии с Разделом VII документа (Многолетний рабочий план).



Рабочий план Совместного проекта

Рабочие планы Совместного проекта будут разрабатываться ежегодно, рассматриваться и одобряться на заседаниях КК. Рабочие планы на второй и последующие годы реализации Совместного проекта будут разрабатываться в течение последнего месяца рабочего года, предшествующего планируемому году. В ходе реализации Совместного проекта эффективность мероприятий будет обеспечиваться за счет взаимодействия с другими программами, проектами, координации, совместного планирования работы и активного участия заинтересованных сторон. Мероприятия, предусмотренные настоящим Совместным проектом, и объемы их финансирования, могут быть изменены (уточнены) при разработке годовых рабочих планов Совместного проекта в соответствии с правилами и процедурами ООН в пределах общего бюджета Совместного проекта.

Партнерства

Совместный проект создаст более тесное и устойчивое партнерство между агентствами системы ООН, государственными органами и иными организациями, научными учреждениями, ОГО и бизнесом. Совместный проект расширит возможности для установления межведомственного партнерства в области продвижения ЦУР. Такое партнерство поможет практическому сотрудничеству на национальном и местном уровнях. Совместный проект также будет направлен на повышение потенциала как государственных служащих, так и представителей общественности и бизнеса по имплементации Повестки дня - 2030, в том числе благодаря реализации пилотных инициатив на местном уровне.

Риски и предпосылки

Стратегия и план действий Совместного проекта основаны на следующих предпосылках:

На уровне стратегических целей развития:


Реализация Повестки дня – 2030 будет приоритетным направлением для Республики Беларусь на протяжении срока реализации Совместного проекта и в течение 5 лет после его окончания. В течение этого периода сохраняется общая политическая установка и нацеленность государственных органов всех уровней на достижение ЦУР.

На уровне внешней среды реализации Совместного проекта и государственного управления

Несмотря на сложную экономическую ситуацию уровень жизни населения относительно стабилен. Сохранится общая установка государственных контролирующих органов на борьбу с коррупцией, разработку и осуществление антимонопольных мер. Рыночная конкуренция будет сохраняться. Пандемия COVID-19 кардинально не влияет на формат работы и оперативность принятия решений. На уровне международных программ развития исходя из ограниченного количества потенциальных международных партнёров сохраняется фокус на приоритетность реализации в Беларуси региональных проектов развития.

На региональном и местном уровне

Специалисты организаций на местном уровне сохраняют высокую мотивацию повышать свою компетентность и квалификацию. Они заинтересованы в участии в мероприятиях Совместного проекта и последующем применении полученных знаний на практике. Заинтересованные стороны, принимающие участие в разработке стратегических планов или вовлеченные в усовершенствование существующих планов, мотивированы и способны договариваться о совместных действиях и партнерстве. Растет осведомленность и интерес населения к теме устойчивого развития.



На уровне субъектов, вовлеченных в реализацию Совместного проекта:

На рынке труда Республики Беларусь доступны компетентные эксперты и специалисты для найма в команду Совместного проекта.

В целях обеспечения успешной реализации Совместного проекта будет проведена работа по определению, оценке, приоритезации степени рисков, будут рассмотрены меры по регулированию и снижению степени рисков, а также будет разработан и реализован соответствующий план управления рисками. Журнал рисков будет вестись и обновляться по мере необходимости в ходе осуществления проекта, не реже одного раза в год в период его реализации. Риски будут определены с использованием действующих правил и процедур ООН (управление общеорганизационными рисками) и соответствующих инструментов оценки рисков.

Риски, которые могут существенно повлиять на результаты Совместного проекта, могут проявиться в следующих ситуациях:

ситуация с COVID-19 не позволяет партнерам вести эффективную работу или взаимодействие ограничено (оценка⁷ вероятности возникновения $P=3$, возможного воздействия $I=3$);

ЦУР становятся меньшим политическим приоритетом для Беларуси, что приводит к сокращению возможностей для расширения масштабов Совместного проекта (оценка вероятности возникновения $P=1$, возможного воздействия $I=4$) и в других случаях, предусмотренных в Приложении 3.

Работа с предпосылками и рисками будет выстроена на основе следующих соображений:

Предварительный план мониторинга и оценки Совместного проекта представлен в разделе VI (Мониторинг и оценка) и первоначальный анализ рисков и план управления ими представлен в Приложении 3 (Анализ рисков).

Эффективное управление Совместного проекта выстроено таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально упростить процесс анализа информации, разработки предложений, и обеспечить гибкость принятия решений либо вынесение проблемных вопросов на заседания КК, а с другой стороны – прописать максимально подробно должностные инструкции, процессы и области ответственности. Ответственность за отслеживание предпосылок и рисков в первом приближении распределена на этапе разработки Совместного проекта.

Комплексность показателей, гибкость подходов к решению возникающих проблемных вопросов будет обеспечена за счет эффективной и результативной совместной работы с экспертами и партнерами из различных секторов (синергия опыта и компетенций), процесса мониторинга и актуального во времени и содержательного сбора обратной связи от бенефициаров и целевых групп Совместного проекта как на местном, так и на национальном уровнях.

Участие заинтересованных сторон

Основными заинтересованными сторонами (бенефициарами) Совместного проекта являются:

⁷ По шкале от 1 (низкое значение) до 5 (высокое значение).



- МИД;
- Белстат;
- Министерство экономики Республики Беларусь;
- Министерство образования Республики Беларусь;
- Министерство здравоохранения Республики Беларусь;
- Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь;
- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
- Министерство информации Республики Беларусь;
- Национальный банк Республики Беларусь;
- Национальная академия наук Беларуси;
- Другие государственные органы и иные организации, включенные в состав Совета по устойчивому развитию;
- Областные и районные исполнительные комитеты;
- ОГО (общественные организации и профсоюзные организации), бизнес-сообщества и другие заинтересованные организации, включая учреждения образования и здравоохранения.

Целевые группы Совместного проекта

Представители Национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР повысят свой потенциал в области устойчивого развития, что обеспечит более эффективную работу по выполнению Повестки дня – 2030.

Местные жители и организации будут вовлечены в реализацию пилотных инициатив, поддержанных в рамках Совместного проекта.


Знания

Знания и опыт, приобретённые заинтересованными сторонами Совместного проекта, будут трансформированы в планы действий и проекты по тематике устойчивого развития. Отзывы заинтересованных сторон будут собираться и анализироваться на регулярной основе для учета в принятии решений и формулировании извлеченных уроков проекта. Информационные материалы, разрабатываемые в рамках проекта, будут содействовать преемственности знаний и опыта в сфере достижения ЦУР.

Устойчивость и масштабирование

Устойчивость результатов реализации Совместного проекта после его прекращения, учитывая содержание, партнёрские отношения и реализацию мероприятий Совместного проекта, обеспечивается с помощью совместной деятельности по внедрению ее результатов по определённым направлениям посредством:

заинтересованности и слаженной деятельности заинтересованных сторон различной формы собственности на национальном и местном уровнях;



государственной поддержки (распространение информации о результатах Совместного проекта, бюджетного и инвестиционного финансирования мероприятий по устойчивому развитию в рамках реализации НСУР -2035 и государственных программ);
учета результатов пилотных инициатив при планировании на местном уровне.

Освещение деятельности и результатов Совместного проекта

Освещение деятельности и результатов Совместного проекта будет нацелено на повышение информированности различных групп заинтересованных сторон и популяризацию основных достижений ЦУР и их положительного влияния на развитие страны.

Координацию информационной работы по тематике ЦУР в рамках Совместного проекта будет осуществлять ПРООН совместно Участвующими агентствами ООН (ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ). ПРООН будет действовать в качестве координатора по коммуникации с Российской Федерацией и другими заинтересованными сторонами, вовлеченными в реализацию Совместного проекта.

Будет обеспечено размещение и использование логотипа и (или) узнаваемых знаков Российской Федерации при осуществлении всех мероприятий Совместного проекта (дискуссии, встречи, круглые столы, интервью, пресс-релизы и т.д.). Для каждого мероприятия будут подготовлены пресс-релизы, которые будут распространяться в средствах массовой информации; которые также будут приглашаться на мероприятия Совместного проекта для освещения этапов его реализации. Примеры успешной реализации Совместного проекта будут отражены в отчетах о ходе и результатах Совместного проекта. Мероприятия, проводимые в рамках Совместного проекта, будут сопровождаться фотографиями, которые будут размещаться на едином информационном портале (сайте) и других информационных ресурсах.

IV. Управление Совместным проектом

Национальные партнеры

Совместный проект будет реализован в режиме национального исполнения при поддержке страновых офисов ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ в соответствии с правилами и процедурами агентств ООН.

Национальными партнерами проекта являются Национальный координатор по достижению ЦУР, МИД, Белстат и другие государственные органы и иные организации, вовлеченные в реализацию мероприятий Совместного проекта.

Исполняющий партнер

МИД будет выполнять функции Исполняющего партнера. МИД является центральным органом государственного управления, подчиняется Совету Министров (Правительству) Республики Беларусь и проводит государственную политику в области внешних связей, координирует внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность страны. МИД выполняет функции Секретариата Национального координатора по достижению ЦУР. Выступая в качестве Исполняющего партнера, МИД будет отвечать за успешную реализацию Совместного проекта,



устойчивость достигнутых результатов и отчетность перед государственными органами Республики Беларусь о результатах Совместного проекта, обеспечивать контроль за реализацией проекта с национальной стороны, согласовывать материалы, представляемые на рассмотрение КК (отчеты о реализации проекта, аналитические материалы), взаимодействие с Участвующими агентствами ООН и Группой управления Совместным проектом по реализации Совместного проекта, координацию деятельности других национальных партнеров.

Национальный директор

Национальный координатор по достижению ЦУР будет являться Национальным директором Совместного проекта и будет осуществлять общую координацию деятельности в рамках Совместного проекта.

Административный агент

Офис многопартнёрского трастового фонда ПРООН, исполняя роль Административного агента, ответственного за эффективное и беспристрастное распределение ресурсов и финансовую отчетность донору – Российской Федерации, от имени всех Участвующих агентств ООН будет:

- подписывать стандартные административные соглашения с донорами и получать средства от доноров, желающих оказать финансовую поддержку Совместному проекту через Административного агента;

- при условии наличия средств выплачивать такие средства каждому из участвующих агентств ООН в соответствии с решениями КК и принимая во внимание бюджет, установленный в проектном документе Совместного проекта;

- обеспечивать свод отчетов и докладов на основе материалов, предоставленных каждым Участвующим агентством ООН, в соответствии с документом Совместного проекта и предоставить их донору;

- предоставлять итоговую отчетность донору.

Участвующие агентства ООН, Созывающий агент

ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ будут оказывать поддержку в реализации Совместного проекта в режиме национального исполнения и являться Участвующими в реализации Совместного проекта агентствами ООН.

При этом ПРООН в Республике Беларусь одновременно выполняет функции Участвующего агентства и Созывающего агента (координатора) со стороны Участвующих агентств ООН, отвечая за согласованность программной деятельности, взаимодействие с национальными партнерами, в том числе представляя сводный описательный отчет на основе материалов, представленных каждым Участвующим агентством ООН.

Участвующие агентства ООН действуют в соответствии со своими собственными положениями, правилами, директивами и процедурами, несут полную программную и финансовую ответственность за средства, выделенные Административным агентом, и отвечают за реализацию и осуществление мероприятий и достижение соответствующих результатов в рамках своих функций и обязанностей, описанных в Совместном проекте.



Участвующие агентства ООН получают ресурсы для найма персонала и консультантов, которые внесут непосредственный вклад в деятельность Совместного проекта, и бюджеты на сопутствующие расходы, такие как офисная структура, командировочные расходы и др. Каждое Участвующее агентство ООН имеет право вычесть свои косвенные расходы из полученных средств в размере, указанном в Разделе VII «Многолетний рабочий план», в качестве дополнительных расходов от общего объема средств, полученных для Участвующего агентства ООН.

Страновые офисы Участвующих агентств ООН будут предоставлять поддержку по реализации Совместного проекта, осуществляемого в модальности национального исполнения, по запросу Исполняющего партнёра. Стороны согласились, что документ Совместного проекта, включающий Приложение 1 «Предоставление услуг страновых офисов ООН в рамках реализации Совместного проекта» и многолетний рабочий план с распределением мероприятий и финансовых ресурсов по годам (раздел VII), являются запросом на предоставление услуг ООН.

Валюта финансирования:

Валюта финансирования - доллары США. Все системы финансовой отчетности агентств ООН ведутся в долларах США (USD).



V. Матрица результатов

ДОКУМЕНТ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПРООН ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2021–2025 ГОДЫ

Приоритетная область № 1. Развитие экономики на принципах «зеленого» и инклюзивного роста (соответствующие целевые показатели ЦУР: 1.2; 2.3; 2a; 8.3; 8.5; 8.9; 9.3; 9.4; 12.1; 12.6).

Индикативный краткосрочный результат 1.1: Меры и мероприятия по развитию «зеленой», циркулярной, низкоуглеродной экономики, с учетом интересов уязвимых групп, разработаны и предложены

Индикатор 1.1.1: Национальный показатель ЦУР: 12.1.1.1. Наличие национальных планов действий по переходу к рациональным моделям потребления и производства или включающих рациональное потребление и производство в качестве приоритета или задачи в национальную политику

Базовый показатель (2019): 1

Целевой показатель (2025): 1

Источник, периодичность: Национальная платформа, ежегодно

Индикативный краткосрочный результат 1.2: Внедрены финансовые и нефинансовые механизмы, обеспечивающие эффективность регионального и местного развития, в том числе в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, с учетом интересов наиболее уязвимых групп населения

Индикатор 1.2.1: Национальный показатель ЦУР: 1.2.1 Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности, в разбивке по полу (процент)

Базовый показатель (2019): 5,0; мужчины – 5,2; женщины – 4,9;

Целевой показатель (2025): 5,0⁸

Источник, периодичность: Национальная платформа, ежегодно.

Индикатор 1.2.2: Национальный показатель ЦУР: 10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода в разбивке по полу и признаку инвалидности (процент)

Базовый показатель (2019): 5,7; мужчины – 5,9; женщины – 5,6; люди с инвалидностью – 4,2; Целевой показатель (2025): 5,0

Источник, периодичность: Национальная платформа, ежегодно.

Приоритетная область № 4. Расширение возможностей уязвимых групп населения для полноценного участия в социально-экономической жизни (соответствующие целевые показатели ЦУР: 1.3; 3.5; 5.5; 5b; 5c; 8.5; 10.3; 16.7; 17.18).

Индикативный краткосрочный результат 4.1: Улучшена система сбора, мониторинга, анализа и использования дезагрегированных данных, в том числе по уязвимым группам, в соответствии с подходом, основанным на правах человека, и принципами гендерного равенства и принципом «никого не оставить в стороне».

Индикатор 4.1.1: Национальный показатель ЦУР: 17.18.1.1. Количество глобальных показателей для мониторинга достижения Целей устойчивого развития (единиц)


Базовый показатель (2018): 74

Целевой показатель (2025): 93⁹

Источник, периодичность: Национальная платформа, ежегодно.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРООН НА 2022–2025 ГОДЫ

Применимое направление преобразований: Проведение структурных преобразований, особенно в связи с переходом к «зеленой» экономике, инклюзивным стратегиям и цифровым технологиям.



⁸ По данным Минтруда и соцзащиты на Национальной платформе отчетности по ЦУР указанный показатель составляет 4,5

⁹ По информации Белстата данный показатель указан на 2022 год

ДОКУМЕНТ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ЮНИСЕФ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2021–2025 ГОДЫ

Итоговый результат 1. К 2025 году улучшены условия для развития и безопасности детей и подростков в семейной среде благодаря социальным услугам и укреплению потенциала лиц, осуществляющих уход

ЦУР 16.2.1.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 14 лет, подвергавшихся физическому наказанию и/или психологическому давлению со стороны лиц, осуществляющих уход за этими детьми, за последний месяц в общей численности детей соответствующей возрастной группы, процентов

Исходное значение: 57,0% (2019 г.)

Целевой показатель: 40,0% (2025 г.)

Процентная доля детей в возрасте 0–5 месяцев, находящихся исключительно на грудном вскармливании

Исходное значение: 21,7% (2019 г.)

Целевой показатель: 35% (2025 г.)

Удельный вес выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые помещены на семейные формы опеки в течение года

Исходное значение: 81,7% (2018 г.)

Целевой показатель: 85% (2025 г.)

Итоговый результат 2. К 2025 году дети и подростки лучше защищены от насилия и имеют доступ к правосудию для несовершеннолетних

Удельный вес девочек и мальчиков, вступивших в конфликт с законом, в отношении которых применена probation вместо заключения под стражу

Исходное значение: 0 (2019 г.)

Целевой показатель: 60% (2025 г.)

Итоговый результат 3. К 2025 году дети, подростки и молодые люди лучше защищены, более активно участвуют в социуме, лучше подготовлены к преодолению вызовов, связанных с трудоустройством в будущем, а также участвуют в решении вопросов, затрагивающих их интересы

ЦУР 3.4.2. Смертность от самоубийств среди несовершеннолетних (в возрасте 10–17 лет) на 100 000 человек

Исходное значение: 3,8 (2018 г.)

Целевой показатель: 2,0 (2025 г.)

Процент детей с особенностями развития и инвалидностью, получающих образование в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования

Исходное значение: 71,1 (2019)

Целевой показатель: 85 (2025)

Итоговый результат 4. К 2025 году расширено взаимодействие государственного и частного секторов и повышена эффективность расходов в целях более полной реализации потенциала будущих поколений

ЦУР 1.2.1. Доля детского населения страны, живущего за национальной чертой бедности

Исходное значение: 10,4% (2018 г.)

Целевой показатель: 6,6% (2025 г.)

ЦУР 1.3.1.2. Обеспеченность детей государственными пособиями, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет

Исходное значение: 27,7% (2018 г.)

Целевой показатель: 29,1% (2025 г.)¹⁰

Доля бюджетного финансирования, направленного на поддержку детей, в том числе из Фонда социальной защиты, в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, по сравнению с общими государственными расходами

Исходное значение: 28% (2018 г.)

Целевой показатель: 29% (2025)

¹⁰ По информации Минтруда и соцзащиты значение этого показателя прогнозируется на уровне 25 процентов к концу 2025 года



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЮНИСЕФ НА 2022–2025 ГОДЫ

Каждый ребенок, включая подростков, живет и гармонично развивается с доступом к полноценному питанию, качественной первичной медицинской помощи, воспитанию и предметам первой необходимости.

Каждый ребенок, включая подростков, учится и овладевает навыками, необходимыми для будущего.

Каждый ребенок, включая подростков, защищен от насилия, эксплуатации, жестокого обращения, невнимания и вредных практик.

Каждый ребенок, включая подростков, имеет доступ к инклюзивной социальной защите и живет без бедности.

ДОКУМЕНТ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ЮНФПА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2021–2025 ГОДЫ

Практический результат 1.1. Укрепление потенциала по предоставлению высококачественной комплексной информации и услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья женщинам и молодежи, особенно из уязвимых групп населения

Показатели результативности:

1.1.1. Число женщин, охваченных организованной программой скрининга рака шейки матки

Базовый показатель на 2019 г.: 0

Целевой показатель на 2025 г.: 80 000

1.1.2. Процент проживающих в сельской местности женщин, пользующихся услугами планирования семьи, которые оказывают учреждения первичной медико-санитарной помощи (услуги оказывают врачи общей практики и/или акушерки)

Базовый показатель: 0%;

Целевой показатель: 40%

1.1.3. Количество регионов, оказывающих благодаря обученному персоналу комплексные услуги по СРЗ, которые полностью доступны для людей с инвалидностью

Базовый показатель: 2;

Целевой показатель: 7

Практический результат 1.2. Улучшение знаний о здоровом образе жизни и о навыках безопасной жизнедеятельности у женщин и молодежи, особенно у женщин и молодежи с инвалидностью, у пожилого населения и у сельских жителей (в том числе в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС).

Показатели результативности:

1.2.1. Процент молодых людей, использующих платформу обмена знаниями о здоровом образе жизни и навыках безопасности жизнедеятельности.

Базовый показатель на 2019 г.: 0;

Целевой показатель на 2025 г.: 25%

1.2.2. Среди основных групп населения проведено обследование «Знания, отношение, практики»:

Базовый показатель на 2019 г.: нет;

Целевой показатель на 2025 г.: да

1.2.3. Доля людей в возрасте от 65 лет и старше, регулярно занимающихся спортом в целях оздоровления:

Базовый показатель на 2019 г.: 22;

Целевой показатель на 2025 г.: 27

Практический результат 3.1. Внедрена демографическая аналитика для повышения оперативности, адресности и результативности политик, программ и представительств в области развития.

3.1.1. Проведена вторая волна обследования «Поколения и гендер», опубликованы результаты.

Базовый показатель на 2020 г.: Нет;

Целевой показатель на 2025 г.: Да



3.1.2. Национальная база данных по демографической статистике социально-экономического развития на центральном, региональном и местном уровнях обновляется и дополняется новыми демографическими показателями.
 Базовый показатель на 2020 г.: Нет;
 Целевой показатель на 2025 г.: Да

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЮНФПА НА 2022–2025 ГОДЫ

Применимые направления преобразований:
 к 2025 году сокращение неудовлетворенной потребности в услугах по планированию семьи;
 к 2025 году сокращение предотвратимой материнской смертности.

ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ БЮРО ВОЗ (2022–2023)

Стратегический приоритет 1. Обеспечить всеобщий охват услугами дополнительно одного миллиарда человек.

1.1. Улучшение доступа к качественным основным медицинским услугам.

1.1.1. Содействовать возможностям стран предоставлять высококачественные медицинские услуги, ориентированные на нужды людей, на основе стратегий первичной медико-санитарной помощи и комплексов пакетов основных услуг.

Поддержка реализации мер общественного здравоохранения по сокращению распространения курения, вредного употребления алкоголя и нездорового питания (в частности, высокого потребления соли).

Обучение в системе общественного здравоохранения по внедрению политики «наиболее эффективных» рекомендованных ВОЗ мер профилактики и борьбы с НИЗ для руководителей общественного здравоохранения и лиц, принимающих решения.

Название проекта и номер проекта в системе Atlas: Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития, № 00134714

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТА	ИСТОЧНИК ДАННЫХ	ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (по частоте сбора данных) ¹¹			МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ & РИСКИ
				Значение	Год 1	Год 2	



¹¹ Мужчинам и женщинам представлены равные возможности для участия во всех образовательных мероприятиях, мероприятиях по повышению потенциала, а также работы в качестве экспертов, что будет поддерживать стремление обеспечить участие не менее 50% женщин в реализации Совместного проекта

Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

<p>Результат 1: Национальный институциональный механизм по достижению ЦУР в Республике Беларусь усилен</p>	<p>ПРООН 1.1.1. Количество участников круглых столов и других мероприятий по тематике устойчивого развития</p>	<p>Отчеты по проекту по реализации мероприятий и анализ их участников</p>	<p>Низкий уровень осведомленности в области устойчивого развития</p>	<p>2022</p>	<p>Не менее 100 участников</p>	<p>Не менее 100 участников</p>	<p>Не менее 300 участников</p>	<p>Проведение опросов или анкетирования участников мероприятия & Несоответствие формата/структуры данных целям мониторинга и оценки проекта</p>
<p>ПРООН 1.1.2 Количество разработанных методологий оценки проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия ЦУР и количество проектов нормативных правовых актов, на которых апробирована методология</p>	<p>Отчеты по проекту Отчеты консультантов проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия ЦУР</p>	<p>Отсутствие методологий оценки проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия ЦУР</p>	<p>2022</p>	<p>Не менее 1 проекта нормативного правового акта, на котором отработана методология</p>	<p>1 методология</p>	<p>Не менее 1 проекта нормативного правового акта</p>	<p>Анализ отчетов консультантов & Недостаточная заинтересованность отдельных участников в реализации мероприятия</p>	
<p>ЮНФПА 1.1.3. Количество семинаров, тренингов по повышению знаний и компетенций специалистов государственных органов в области учета демографических факторов при разработке проектов нормативных правовых актов</p>	<p>Отчеты по проекту Отчеты консультантов проектов нормативных правовых актов</p>	<p>Недостаточность знаний и компетенций в области учета демографических факторов при разработке проектов нормативных правовых актов</p>	<p>2022</p>	<p>2 семинара, тренинга</p>	<p>2 семинара, тренинга</p>	<p>6 семинаров, тренингов</p>	<p>Опрос участников семинаров, тренингов & Недостаточная заинтересованность отдельных участников в реализации данного мероприятия</p>	
<p>ЮНФПА 1.1.4. Наличие проведенной оценки законодательства в области охраны репродуктивного здоровья для мужчин и женщин в контексте ЦУР</p>	<p>Отчеты по проекту, отчеты консультантов, отчеты о проведенных встречах с</p>	<p>Отсутствие комплексной оценки законодательства в области охраны репродуктивного здоровья</p>	<p>2022</p>	<p>Наличие подготовленных рекомендаций</p>	<p>Наличие проведенной оценки законодательства и подготовленных региональных консультаций</p>	<p>Анализ отчетов консультантов о проведенной оценке и предлагаемых рекомендациях по совершенствованию, анкетирование участников региональных консультаций &</p>		



Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

Наличие выработанных рекомендаций по совершенствованию законодательства	партнерами по обсуждению рекомендаций	о здоровья для мужчин и женщин в контексте ЦУР	о здоровья для женщин и мужчин	по совершенствованию законодательства в области репродуктивного здоровья	рекомендации по совершенствованию законодательства, не менее 3 проведенных региональных консультаций	Недостаточная заинтересованность отдельных участников в реализации мероприятия
Количество региональных консультаций по совершенствованию законодательства в области репродуктивного здоровья	Отчеты по проекту	Низкий уровень осведомленности и в области устойчивого развития	2022	10 процентов повышение уровня осведомленности населения о ЦУР	1 социальный опрос	Проведение социального опроса & Несоответствие формата/структуры данных целям мониторинга и оценки проекта
ПРООН 1.2.1. Количество социальных опросов на предмет знания населением ЦУР	Отчеты по проекту	Низкий уровень осведомленности и в области устойчивого развития	2022	10 процентов повышение уровня осведомленности населения о ЦУР	1 конкурс	Анализ отчетов консультантов, данные опросов в социальных сетях, данные социального опроса населения & Нерепрезентативные данные
ПРООН 1.2.2. Количество коммуникационных стратегий по продвижению ЦУР	Отчеты консультантов	Низкий уровень осведомленности и в области устойчивого развития	2022	10 процентов повышение уровня осведомленности населения о ЦУР	1 конкурс	Анализ отчетов консультантов, данные опросов в социальных сетях, данные социального опроса населения & Нерепрезентативные данные
Процент повышения уровня осведомленности населения о ЦУР	Отчеты по проекту	Низкий уровень осведомленности и в области устойчивого развития	2022	10 процентов повышение уровня осведомленности населения о ЦУР	1 конкурс	Анализ отчетов консультантов, данные опросов в социальных сетях, данные социального опроса населения & Нерепрезентативные данные
ПРООН 1.2.3. Количество конкурсов «Чемпионы ЦУР»	Отчеты по проекту	Низкий уровень осведомленности и в области устойчивого развития	2022	1 конкурс	1 конкурс	Анкетирование участников мероприятия & Недостаточная заинтересованность отдельных участников в реализации мероприятия



<p>ЮНЕСКО 1.2.4. Количество проведенных информационно-просветительских кампаний, направленных на учет вклада населения старшего возраста в достижение ЦУР</p>	<p>Отчет по проекту, отчет о проведении информационно-просветительской кампании</p>	<p>Низкий уровень осведомленности и о значимости вклада населения старшего возраста в достижение ЦУР</p>	<p>2022</p>	<p>1 проведенная информационно-просветительская кампания по вкладу населения старшего возраста в достижение ЦУР</p>	<p>Не менее 600,000 пользователей социальных медиа охвачено тематическими материалами и активностями кампании</p>	<p>-</p>	<p>1 проведенная информационно-просветительская кампания Не менее 600,000 пользователей социальных медиа охвачено тематическими материалами кампании</p>	<p>Отчеты об охвате материалами кампании онлайн-опрос участников кампании & Недостаточная заинтересованность общественности в кампании</p>
<p>ЮНЕСКО 1.2.5. Количество мероприятий с участием Молодежных послов ЦУР</p>	<p>Отчет по проекту</p>	<p>Недостаточное количество мероприятий с участием Молодежных послов ЦУР</p>	<p>2022</p>	<p>3 мероприятия с участием Молодежных послов ЦУР</p>	<p>3 мероприятия с участием Молодежных послов ЦУР</p>	<p>9 мероприятий с участием Молодежных послов ЦУР</p>	<p>Отчет по проекту Онлайн-опрос участников мероприятий & Недостаточная заинтересованность в освещении мероприятий</p>	
<p>ЮНЕСКО 1.2.6. Количество проведенных кампаний, направленных на продвижение Платформы ускорения ЦУР «Ориентация на будущее поколения: подростки и молодежь»</p>	<p>Отчет по проекту, отчет о проведении кампании</p>	<p>Низкий уровень осведомленности и о значимости ускорения достижения ЦУР в рамках Платформы ускорения ЦУР «Ориентация на будущее поколения: подростки и молодежь»</p>	<p>2022</p>	<p>1 кампания по продвижению Платформы ускорения ЦУР «Ориентация на будущее поколения: подростки и молодежь»</p>	<p>Не менее 200,000 пользователей социальных медиа охвачено тематическими материалами и активностями кампании</p>	<p>Не менее 300,000 пользователей социальной медиа охвачено тематическими материалами и активностями кампании</p>	<p>1 кампания Онлайн-опрос участников кампании Проведение социального опроса (п. 1.2.1) & Недостаточная заинтересованность общественности в ЦУР</p>	



Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

ПРООН 1.2.7. Количество коммуникационных продуктов по тематике ЦУР	Отчеты по проекту	Низкий уровень осведомленности и населения в области устойчивого развития	2022	3 коммуникационных продуктов	3 коммуникационных продуктов	3 коммуникационных продуктов	9 коммуникационных продуктов	Проведение опросов в социальных сетях, данные социального опроса & Недостаточная заинтересованность населения в теме устойчивого развития
ЮНИСЕФ 1.2.8. Количество информационно-аналитических продуктов по ЦУР, касающихся детей и молодежи	Отчеты по проекту	Низкий уровень осведомленности и в области ЦУР касающихся детей и молодежи	2022	2 информационно-аналитических продукта	2 информационно-аналитических продукта	2 информационно-аналитических продукта	6 информационно-аналитических продуктов	Проведение опросов в социальных сетях Проведение социального опроса (п. 1.2.1) & Недостаточная заинтересованность населения в теме устойчивого развития
ПРООН 1.3.1. Количество добровольных национальных обзоров о реализации Республикой Беларусь Повестки дня – 2030 Количество заинтересованных (представители государственных органов, науки, частного сектора, ОГО), вовлеченных в подготовку добровольных национальных обзоров о реализации Республикой Беларусь Повестки дня – 2030	Отчеты по проекту	Низкий уровень вовлеченности широкого круга заинтересованных в процесс подготовки добровольного национального обзора о реализации Республикой Беларусь Повестки дня – 2030	2022	-	-	1 национальный обзор Не менее 50 человек	1 национальный обзор Не менее 50 человек	Анализ отчетов консультантов, проведение опросов & Недостаточная заинтересованность отдельных участников в реализации мероприятия
ПРООН 1.3.2. Количество международных конференций по обмену опытом в области достижения ЦУР	Отчеты по проекту	Отсутствие международных мероприятий по обмену опытом в области	2022	-	1 международная конференция	-	1 международная конференция	Проведение опросов участников & Недостаточная заинтересованность отдельных




			достижения ЦУР								участников в реализации мероприятия
ПРООН 1.4.1. Количество комплектов учебных материалов по вопросам достижения ЦУР	Отчеты по проекту		Отсутствие по вопросам достижения ЦУР для их последующего использования в учебных программах повышения квалификации руководящих работников и специалистов, а также в качестве учебных программ обучающихся курсов	2022	Не менее 2 комплектов учебных материалов по вопросам достижения ЦУР	Не менее 1 комплекта учебных материалов по вопросам достижения ЦУР	-	Не менее 3 комплектов учебных материалов по вопросам достижения ЦУР			Анализ отчетов консультантов & Недостаточная заинтересованность в разработке учебных материалов
ПРООН 1.4.2. Количество добровольных университетских обзоров о реализации Повестки дня – 2030	Отчеты по проекту		Отсутствие университетского обзора о реализации Повестки дня – 2030	2022	-	1 добровольный обзор	1 добровольный обзор	1 добровольный обзор			Анализ отчетов консультантов & Недостаточная заинтересованность в разработке университетского обзора о реализации Повестки дня – 2030
ПРООН 1.4.3. Количество человек – представителей Национальной архитектуры управления процессом	Отчеты по проекту		Отсутствие образовательных поездок по тематике ЦУР	2022	Не менее 5 человек	Не менее 5 человек	Не менее 5 человек	Не менее 15 человек			Анкетирование участников поездок & Запрет на командировки ввиду пандемии КОВИД-19 или других условий



достижения ЦУР, принявших участие в образовательных поездках по обмену опытом и изучению наилучших практик в области достижения ЦУР	Отчеты по проекту	Отсутствие дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	2022	Не менее 2 разработанных дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	Не менее 1 апробированного дистанционного учебного курса для школьников по вопросам устойчивого развития	Не менее 1 разработанных и апробированных дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	Не менее 2 разработанных и апробированных дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	Отчеты консультантов & Недостаточная заинтересованность в апробации дистанционных учебных курсов
ЮНИСЕФ 1.4.4. Количество разработанных и апробированных дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	Отчеты по проекту	Отсутствие дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	2022	Не менее 2 разработанных дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	Не менее 1 апробированного дистанционного учебного курса для школьников по вопросам устойчивого развития	Не менее 1 разработанных и апробированных дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	Не менее 2 разработанных и апробированных дистанционных учебных курсов для школьников по вопросам устойчивого развития	Отчеты консультантов & Недостаточная заинтересованность в апробации дистанционных учебных курсов
ЮНИСЕФ 1.4.5. Периодичность проведения самого большого урока в мире по ЦУР в учебных заведениях страны	Отчеты по проекту	Самый большой урок в мире по ЦУР проводится не системно и только в отдельных учебных заведениях		Ежегодное проведение самого большого урока в мире по ЦУР в учебных заведениях	Ежегодное проведение самого большого урока в мире по ЦУР в учебных заведениях	Ежегодное проведение самого большого урока в мире по ЦУР в учебных заведениях	Ежегодное проведение самого большого урока в мире по ЦУР в учебных заведениях	Отчеты консультантов & Недостаточная заинтересованность в проведении самого большого урока в мире
ВОЗ 1.4.6.1. Количество утвержденных учебных модулей по общественному здоровью по вопросам профилактики НИЗ в привязке к ЦУР	Отчеты по проекту	Недостаточная интеграция ЦУР в учебные модули по общественному здравоохранению	2022	1 утвержденный учебный модуль	1 утвержденный учебный модуль	1 утвержденный учебный модуль	1 утвержденный учебный модуль	Отчеты консультантов & Отсутствие заинтересованности в утверждении учебных модулей
ВОЗ 1.4.6.2. Количество демонстрационных семинаров по учебному модулю по профилактике неинфекционных заболеваний и	Отчеты по проекту	Недостаточное вовлечение на межведомственном уровне лиц, принимающих решения в	2022	1 демонстрационный семинар	1 демонстрационный семинар	1 демонстрационный семинар	3 демонстрационных семинара	Анкетирование участников мероприятия & Недостаточная заинтересованность отдельных



	продвижению здорового образа жизни в рамках ЦУР		отношении профилактики риска НИЗ						участников в реализации мероприятия
<p>Результат 2: ЦУР включены в стратегические документы прогнозирования и планирования и ускорен процесс локализации ЦУР</p>	<p>ВОЗ 1.4.6.3. Количество подготовленных тренеров по учебному модулю по профилактике нейфекционных заболеваний и продвижению здорового образа жизни</p> <p>ВОЗ 1.4.6.4. Количество разработанных раздаточных материалов и других учебных пособий и распространённых на тренингах и семинарах</p>	<p>Отчеты по проекту</p>	<p>Недостаточное количество тренеров</p>	<p>2022</p>	<p>15 подготовленных тренеров</p>	<p>15 подготовленных тренеров</p>	<p>20 подготовленных тренеров</p>	<p>50 подготовленных тренеров</p>	<p>Анкетирование участников мероприятия & Недостаточная заинтересованность в подготовке тренеров</p>
<p>Результат 2: ЦУР включены в стратегические документы прогнозирования и планирования и ускорен процесс локализации ЦУР</p>	<p>ПРООН 2.1.1. Количество разработанных (обновленных) и обсужденных с широким кругом заинтересованных сторон региональных стратегий устойчивого развития</p>	<p>Отчеты по проекту</p>	<p>Недостаточное количество учебных материалов по вопросам профилактики НИЗ в рамках ЦУР</p>	<p>2022</p>	<p>10 разработанных раздаточных материалов</p>	<p>10 разработанных раздаточных материалов</p>	<p>10 разработанных раздаточных материалов</p>	<p>30 разработанных раздаточных материалов</p>	<p>Анкетирование участников мероприятия & Недостаточная заинтересованность отдельных участников в использовании раздаточных материалов</p>
<p>Результат 2: ЦУР включены в стратегические документы прогнозирования и планирования и ускорен процесс локализации ЦУР</p>	<p>ПРООН 2.1.2. Количество онлайн-платформ наилучших практик, связанных с достижением ЦУР</p> <p>Наличие обновлений о наилучших практиках, связанных с достижением ЦУР</p>	<p>Отчеты по проекту</p> <p>Отчеты консультантов</p>	<p>Отсутствие в большинстве регионов стратегий по устойчивому развитию, разработанных с учетом ЦУР</p>	<p>2022</p>	<p>2 стратегии</p>	<p>2 стратегии</p>	<p>2 стратегии</p>	<p>6 стратегий</p>	<p>Анализ отчетов консультантов & Недостаточная заинтересованность местных органов власти в разработке региональных стратегий</p>
<p>Результат 2: ЦУР включены в стратегические документы прогнозирования и планирования и ускорен процесс локализации ЦУР</p>	<p>ПРООН 2.1.2. Количество онлайн-платформ наилучших практик, связанных с достижением ЦУР</p> <p>Наличие обновлений о наилучших практиках, связанных с достижением ЦУР</p>	<p>Отчеты по проекту</p> <p>Отчеты консультантов</p>	<p>Отсутствие онлайн-платформ наилучших практик, связанных с достижением ЦУР</p>	<p>2022</p>	<p>1 онлайн-платформа наилучших практик, связанных с достижением ЦУР</p>	<p>15 обновлений</p>	<p>10 обновлений</p>	<p>1 онлайн-платформа</p> <p>Не менее 25 обновлений</p>	<p>Анализ отчетов консультантов и информации на онлайн-платформе наилучших практик, связанных с достижением ЦУР & Недостаточное количество наилучших практик, связанных с достижением ЦУР</p>



Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

ЮНФПА	2.1.3.	Количество семинаров, тренингов по повышению знаний и компетенций специалистов государственных органов в области учета демографических факторов, использования системы национальных трансфертных счетов в процессе государственного планирования	Отчеты по проекту	Недостаточность знаний и компетенций в области учета демографических факторов, национальных трансфертных счетов при формировании и исполнении бюджетов на национальном и региональном уровнях	2022	5 семинаров, тренингов	5 семинаров, тренингов	15 семинаров, тренингов	Опрос участников семинаров, тренингов & Недостаточная заинтересованность отдельных участников в реализации данного мероприятия
ЮНФПА	2.1.4.	Количество информационно-просветительских мероприятий по вопросам составления бюджетов с учетом демографических факторов и их влияния на устойчивое демографическое развитие	Отчеты по проекту	Низкая осведомленность о важности учета демографических факторов при составлении региональных бюджетов	2022	3 информационно-просветительских мероприятия	3 информационно-просветительских мероприятия	6 информационно-просветительских мероприятий	Анализ отчетов консультантов Опрос участников мероприятий & Недостаточная заинтересованность местных органов власти в учете демографических факторов при составлении бюджетов
ЮНФПА	2.1.5.	Наличие тематической экспертной поддержки мероприятий Совместного проекта по вопросам устойчивого демографического развития	Отчеты по проекту	Отсутствие тематической экспертной поддержки по направлению демографического развития	2022	Наличие тематической экспертной поддержки	Наличие тематической экспертной поддержки	Наличие тематической экспертной поддержки	Анализ отчетности привлеченных консультантов & Отсутствие пула консультантов по направлению устойчивого демографического развития
ЮНИСЕФ	2.1.6.		Отчеты по проекту	Отсутствие разработанной методологии и оценки	2022	Наличие анализа финансирования и достижения	1 разработанная методология для бюджетирования	Наличие анализа финансирования	Анализ отчетности привлеченных консультантов &



	Наличие анализа финансирования достижения ЦУР, связанных с детьми	необходимых финансовых ресурсов для бюджетирования достижения ЦУР, связанных с детьми	ЦУР, связанных с детьми	ЦУР, связанных с детьми	достижения ЦУР, связанных с детьми	достижения ЦУР, связанных с детьми	Отсутствие заинтересованности в проведении оценки необходимых финансовых ресурсов для бюджетирования достижения ЦУР, связанных с детьми
	Количество разработанных методологий оценки необходимых финансовых ресурсов для бюджетирования достижения ЦУР, связанных с детьми	Количество проведенных оценок необходимых финансовых ресурсов для бюджетирования достижения ЦУР, связанных с детьми	ЦУР, связанных с детьми	ЦУР, связанных с детьми	разработанная методология и проведенная оценка необходимых финансовых ресурсов для бюджетирования достижения ЦУР, связанных с детьми	разработанная методология и проведенная оценка необходимых финансовых ресурсов для бюджетирования достижения ЦУР, связанных с детьми	
ПРООН 2.1.7.	Количество форумов по вопросам зеленого финансирования	Отчеты по проекту	2022	-	1 форум	1 форум	Проведение опроса участников Форума & Недостаточная заинтересованность отдельных участников в реализации мероприятия
ПРООН 2.2.1	Количество поддержанных пилотных инициатив по ЦУР на местном уровне	Отчеты по проекту Анкетные участники семинаров	2022	Не менее 5 поддержанных инициатив	Не менее 5 поддержанных инициатив	Не менее 5 поддержанных инициатив	Анализ отчетов победителей конкурса о реализации пилотных инициатив по ЦУР на местном уровне Анализ работы онлайн платформы & Недостаточная заинтересованность в реализации пилотных инициатив
	Количество онлайн платформ для подачи заявок на проведение пилотных инициатив	Количество человек, принявших участие в обучающих семинарах в		1 онлайн платформа	-	1 онлайн платформа	



рамках проведения Конкурса пилотных инициатив	Отчеты по проекту	Низкий уровень локализации ЦУР	2022	Не менее 5 человек	Не менее 50 человек	Не менее 5 человек	Не менее 150 человек	Анализ отчетности консультантов & Недостаточная заинтересованность в вопросах локализации ЦУР
ПРООН 2.2.2. Количество консультаций по теме локализации ЦУР	Отчеты по проекту	Низкий уровень локализации ЦУР	2022	Не менее 5 человек	Не менее 50 человек	Не менее 5 человек	Не менее 180 человек	Анализ отчетности консультантов & Недостаточная заинтересованность в вопросах локализации ЦУР
Количество мероприятий по тематике ЦУР на региональном уровне	Отчеты по проекту	Не менее 5 мероприятий	2022	Не менее 5 человек	Не менее 50 человек	Не менее 5 человек	Не менее 15 мероприятий	Анализ отчетности консультантов & Недостаточная заинтересованность в вопросах локализации ЦУР
Результат 3 Обеспечено совершенствование системы мониторинга достижения ЦУР на национальном и местном уровнях	Отчеты по проекту	Отсутствие визуализации геопространственной информации по отдельным показателям ЦУР	2022	Не менее 10 человек	Не менее 10 человек	Не менее 10 человек	Не менее 10 человек	Анализ отчетности консультантов и функционирования представительства отчетности по показателям ЦУР & Отсутствие специалистов по интеграции геопространственной информации в платформу отчетности по ЦУР
ЮНИСЕФ 3.1.2. Количество показателей (в процентном соотношении), которые можно передавать в формате SDMX	Отчеты по проекту	Веб-портал статистических данных о детях не адаптирован к стандарту SDMX	2022	Не менее 50 процентов показателей, которые входят в вопросник TransMonEE	Не менее 50 процентов показателей, которые входят в вопросник TransMonEE	Не менее 50 процентов показателей, которые входят в вопросник TransMonEE	Не менее 50 процентов показателей, которые входят в вопросник TransMonEE	Анализ отчетности консультантов и функционирования веб-портала & Отсутствие доступа к порталу статистических данных о детях
ЮНИСЕФ 3.1.3. Наличие выработанных подходов к оценке качества административных данных в части отдельных ЦУР, касающихся детей и молодежи	Отчеты по проекту	Отсутствует методология оценки качества административных данных в части отдельных ЦУР,	2022	Наличие выработанных подходов к оценке качества административных данных	Наличие подготовленных национальных опросников и дизайна выборки для проведения административных данных и	Наличие выработанных подходов к оценке качества административных данных	Наличие проведенного анализа передовой международной практики по оценке качества административных данных	Анализ отчетности консультантов & Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятия



Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

	Наличие национальных опросников и дизайна выборки для проведения 7 раунда обследования МИКС		касаящихся детей и молодежи Подготовка проведения 7 раунда обследования МИКС не проводилась		рекомендаций по ее использованию в условиях Республики Беларусь	7 раунда обследования МИКС)	внешних данных и рекомендаций по ее использованию в условиях Республики Беларусь. Наличие выработанных подходов к оценке качества административных данных. Наличие подготовленных национальных опросников, дизайна выборки для проведения 7 раунда обследования МИКС	
ЮНИСЕФ 3.1.4. Наличие процедуры распространения микроданных с апробацией на данных МИКС в части индикаторов, касающихся детей и молодежи	Отчеты по проекту	Отсутствие процедуры распространения микроданных с апробацией на данных МИКС в части индикаторов, касающихся	2022	Наличие проведенного анализа передовой международной практики по распространению микроданных и рекомендаций по ее	Наличие проведенного анализа передовой международной практики по распространению микроданных на данных МИКС в части	Наличие апробированной процедуры распространения микроданных	Наличие проведенного анализа передовой международной практики по распространению микроданных	Анализ отчетности консультантов & Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятия




Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

			детей и молодежи	использованию в условиях Республики Беларусь	индикаторов ЦУР, касающихся детей и молодежи	рекомендаций по ее использованию в условиях Республики Беларусь. Наличие процедуры распространения Белстатом микроданных с апробацией на данных МИКС в части индикаторов, касающихся детей и молодежи	
ПРООН 3.2.1. Количество обзоров производителей данных по показателям ЦУР Наличие рекомендаций по направлениям дальнейшей работы по совершенствованию перечня показателей ЦУР, повышению доступности данных и обеспечению качества мониторинга достижения ЦУР в республике Беларусь	Отчеты по проекту Отчеты консультантов	Отсутствие обзоров производителей данных по национальным показателям ЦУР, рекомендаций по направлениям дальнейшей работы по совершенствованию перечня показателей ЦУР,	2022	1 обзор	Рекомендации по направлениям дальнейшей работы по совершенствованию перечня показателей ЦУР, повышению доступности данных и обеспечению качества мониторинга достижения ЦУР.	Наличие методологических подходов к оценке качества административных данных в части отдельных показателей ЦУР по двум Платформам ускорения данных и ЦУР.	Анализ отчетности консультантов & Недостаточная заинтересованность в рекомендациях и предложениях по совершенствованию механизмов достижения ЦУР

Министерство образования и науки Республики Беларусь
Страна Беларусь
Международной технической помощи Беларуси


Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

<p>Наличие методологических подходов к оценке качества административных данных в части отдельных ЦУР по двум Платформам ускорения ЦУР: «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту и цифровые трансформации и социальные инновации</p>	<p>повышению доступности данных и обеспечению качественного мониторинга достижения ЦУР в Республике Беларусь и методологических подходов к оценке качества административных данных в части отдельных ЦУР</p>	<p>ЦУР в Республике Беларусь</p>	<p>«зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту и цифровые трансформации и социальные инновации</p>	<p>качественного мониторинга достижения ЦУР в Республике Беларусь Наличие методологических подходов к оценке качества административных данных в части отдельных ЦУР по двум Платформам ускорения ЦУР: «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту и цифровые трансформации и социальные инновации</p>	<p>Анализ отчетности консультантов & Недостаточная заинтересованность в методологиях показателей ЦУР по отдельным задачам ЦУР</p>
<p>ПРООН 3.2.2. Количество рекомендаций (методологий расчета) по национальным показателям отчетности отдельных ЦУР в контексте двух Платформ</p>	<p>Отчеты по проекту Отчеты консультантов</p>	<p>2022</p>	<p>Не менее 2 методологий расчета</p>	<p>Наличие необходимых условий для формирования счетов расходов на охрану</p>	<p>Не менее 2 методологий Наличие необходимых условий для формирования счетов</p>




Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

<p>ускорения ЦУР: «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту и цифровые трансформации и социальные инновации Наличие необходимых условий для формирования счетов расходов на охрану окружающей среды</p>	<p>в контексте двух Платформ ускорения ЦУР: «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту и цифровые трансформации и социальные инновации Отсутствие необходимых условий для формирования счетов расходов на охрану окружающей среды</p>				<p>расходов на охрану окружающей среды</p>	<p>Анализ отчетности консультантов и отчетности партнеров & Недостаточная заинтересованность в проведении мероприятий</p>
<p>ЮНИСЕФ 3.2.3. Количество адаптированных глобальных метаданных к национальным условиям для расчета показателей ЦУР, касающихся детей и молодежи в контексте Платформы ускорения ЦУР «Ориентация на будущее поколения»</p>	<p>Отчеты по проекту Отчеты консультантов Наличие потребности в адаптации глобальных метаданных к национальным условиям для расчета показателей ЦУР, касающихся детей и молодежи в контексте Платформы ускорения ЦУР «Ориентация на</p>	<p>2022</p>	<p>Наличие адаптированных глобальных метаданных к национальным условиям для расчета показателей ЦУР, касающихся детей и молодежи в контексте Платформы ускорения ЦУР «Ориентация на</p>	<p>Наличие адаптированных глобальных метаданных к национальным условиям для расчета показателей ЦУР, касающихся детей и молодежи в контексте Платформы ускорения ЦУР «Ориентация на</p>	<p>Наличие адаптированных глобальных метаданных к национальным условиям для расчета показателей ЦУР, касающихся детей и молодежи в контексте Платформы ускорения ЦУР</p>	<p>Анализ отчетности консультантов и отчетности партнеров & Недостаточная заинтересованность в проведении мероприятий</p>



Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»


	будущие поколения»	будущие поколения»	будущие поколения»	будущие поколения»	будущие поколения»	будущие поколения»	будущие поколения»	«Ориентация на будущие поколения»	
<p>ЮНФПА 3.2.4. Наличие рекомендаций по совершенствованию расчета показателей ЦУР, касающихся устойчивого демографического развития страны в привязке к NSUR-2035 и Платформе ускорения ЦУР «Гендерное равенство в обществе»</p>	<p>Отчеты по проекту консультантов</p>	<p>Наличие пробелов в расчете показателей ЦУР, касающихся устойчивого демографического развития страны</p>	<p>2022</p>	<p>Наличие рекомендаций по совершенствованию расчета показателей ЦУР, касающихся устойчивого демографического развития страны в привязке к NSUR-2035 и Платформе ускорения ЦУР «Гендерное равенство в обществе» (не менее 2 показателей)</p>	<p>Наличие рекомендаций по совершенствованию расчета показателей ЦУР, касающихся устойчивого демографического развития страны в привязке к NSUR-2035 и Платформе ускорения ЦУР «Гендерное равенство в обществе» (не менее 2 показателей)</p>	<p>Наличие рекомендаций по совершенствованию расчета показателей ЦУР, касающихся устойчивого демографического развития страны в привязке к NSUR-2035 и Платформе ускорения ЦУР «Гендерное равенство в обществе» (не менее 4 показателей)</p>	<p>Наличие рекомендаций по совершенствованию расчета показателей ЦУР, касающихся устойчивого демографического развития страны в привязке к NSUR-2035 и Платформе ускорения ЦУР «Гендерное равенство в обществе» (не менее 4 показателей)</p>	<p>Анализ отчетности консультантов & Недостаточная заинтересованность отдельных участников в реализации мероприятия</p>	
<p>ПРООН 3.2.5. Количество консультаций по тематике мониторинга и оценки достижения ЦУР в месяц Количество подготовленных аналитических материалов по тематике мониторинга и отчетности достижения ЦУР в год</p>	<p>Отчеты по проекту консультантов</p>	<p>Отсутствие методологической поддержки по отчетности ЦУР</p>	<p>2022</p>	<p>Не менее 10 консультаций в месяц</p>	<p>Не менее 10 консультаций в месяц</p>	<p>Не менее 10 консультаций в месяц</p>	<p>Не менее 360 консультаций & Недостаточная заинтересованность в получении поддержки по отчетности достижения ЦУР</p>	<p>Анализ отчетности консультантов, проведение опросов партнёров & Недостаточная заинтересованность в получении поддержки по отчетности достижения ЦУР</p>	




VI. Мониторинг и оценка

Мониторинг Совместного проекта будет осуществляться в соответствии с правилами и процедурами Участвующих агентств ООН на основании следующих планов мониторинга и оценки:

Деятельность по мониторингу	Цель	Частота	Ожидаемые действия	Национальные партнеры (при совместном исполнении)	Затраты (при наличии)
Отслеживать достижение результатов	Данные о ходе работ в сопоставлении с индикаторами результатов в Матрице результатов и ресурсов будут собираться и анализироваться для оценки хода реализации Совместного проекта с точки зрения выполнения согласованных задач	Ежеквартально	При более медленном ходе реализации Совместного проекта по сравнению с запланированными сроками будут приниматься оперативные меры реагирования руководством Совместного проекта	-	-
Контролировать и управлять рисками	Определить конкретные риски, которые могут угрожать достижению запланированных результатов. Выявить и контролировать действия по управлению рисками с использованием журнала рисков. Это включает в себя меры и планы мониторинга, которые могли бы потребоваться в соответствии с социальными и экологическими стандартами ПРООН. Аудит будет проводиться в соответствии с политикой аудита ООН для управления финансовыми рисками	Не менее двух раз в год	Руководством Совместного проекта определяются риски и принимаются меры для управления ими. Журнал рисков ведется постоянно, чтобы отслеживать выявленные риски и предпринятые действия	-	-
Учиться	Знания, передовой опыт и извлеченные уроки будут регулярно собираться, а также активно извлекаться из других программ и	Ежегодно	Соответствующие уроки извлекаются командой Совместного проекта и	-	-




Деятельность по мониторингу	Цель	Частота	Ожидаемые действия	Национальные партнеры (при совместном исполнении)	Затраты (при наличии)
	проектов и у других партнеров и интегрироваться в Совместный проект		используются для принятия управленческих решений		
Обеспечение качества Совместного проекта	Качество Совместного проекта будет оцениваться в соответствии со стандартами качества ООН для выявления сильных и слабых сторон проекта и для принятия управленческих решений для улучшения проекта	Один раз в два года	Сильные и слабые стороны Совместного проекта будут анализироваться руководителем Совместного проекта и использоваться для обоснования решений, направленных на повышение эффективности Совместного проекта	-	-
Пересматривать и вносить коррективы	Внутренний анализ данных и фактической информации по итогам всех мониторинговых мероприятий для принятия решений	Минимум ежегодно	Данные об эффективности, рисках, извлеченных уроках и качестве будут обесуждаться КК и использоваться для корректировки проекта	Члены КК	-
Отчет по Совместному проекту	Отчет о ходе работ будет представлен КК и ключевым заинтересованным сторонам. Отчет будет состоять из данных о ходе выполнения Совместного проекта показывающих результаты, достигнутые в сравнении с заранее определенными годовыми целями на уровне задач, годовой сводки рейтинга качества Совместного проекта обновленного журнала рисков с	Ежегодно и к концу проекта (заключительный отчет)	На основании данных отчета будут подготовлены рекомендации КК (при необходимости)	Члены КК	-



Деятельность по мониторингу	Цель	Частота	Ожидаемые действия	Национальные партнеры (при совместном исполнении)	Затраты (при наличии)
Обзор Совместного проекта	<p>мерами по смягчению последствий и любых отчетов об оценке или анализе, подготовленных за отчетный период</p> <p>КК будет проводить регулярные обзоры проекта для оценки его эффективности и пересматривать многолетний план работы для обеспечения реалистичности бюджета в течение всего срока реализации Совместного проекта. В последний год реализации Совместного проекта КК должен провести заключительный обзор проекта, чтобы зафиксировать извлеченные уроки и обсудить возможности расширения и обобщения результатов Совместного проекта и извлеченных уроков с соответствующей аудиторией</p>	Ежегодно	КК будет обсуждать любые проблемы качества или более медленный, чем ожидалось, ход работ, давать рекомендации руководителю Совместного проекта	-	-

План оценки

Название оценки	Партнеры (при наличии)	Соответствующий результат стратегических планов ООН	Результат	Запланированная дата завершения	Основные заинтересованные участники оценки	Затраты и источник финансирования
Среднесрочная оценка	-	-	-	-	-	-
Финальная оценка проекта		-	-	По меньшей мере, за три месяца до окончания срока реализации	Участвующие агентства ООН, национальные партнеры	20 000 долларов США

Совместный проект «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития»

				Совместного проекта	Совместного проекта	Бюджет Совместного проекта



VIII. Механизмы руководства и управления

Координационный комитет

Для стратегического руководства и координации действий в рамках Совместного проекта будет создан Координационный комитет (КК). КК будет способствовать сотрудничеству между национальными партнерами, Участвующими агентствами ООН, донором, заинтересованными сторонами.

Сопредседателями КК будут Национальный координатор по достижению ЦУР, который является Национальным директором Совместного проекта, и Постоянный координатор ООН (ПК ООН) в Республике Беларусь.

На начальном этапе Совместного проекта агентства ООН по согласованию с МИД разрабатывают регламентирующие документы КК, включая список членов и регламент работы.


КК несёт ответственность за принятие на основе консенсуса управленческих решений по Совместному проекту. КК рассматривает и одобряет годовые рабочие планы Совместного проекта, обеспечивая согласованность действий с национальными приоритетами развития Республики Беларусь.

В состав КК войдут представители основных заинтересованных сторон, с национальной стороны: Национальный координатор по достижению ЦУР, МИД, а также Белстат, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, которые возглавляют межсекторальные группы Совета по устойчивому развитию, представитель Партнерской группы устойчивого развития. Со стороны ООН в состав КК войдут: Постоянный координатор ООН, Участвующие агентства ООН (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ). Донор в составе КК будет представлен Посольством Российской Федерации в Республике Беларусь. При необходимости КК может принять решение о приглашении других участников на заседания КК, при этом количество участников заседания должно оставаться в пределах, обеспечивающих работоспособность КК.

Руководитель Совместного проекта будет обеспечивать составление протоколов заседаний КК, включая учет решений по итогам каждого заседания. Окончательный список членов КК будет утвержден Сопредседателями КК.

КК будет проводить заседания не реже двух раз в год (очно и (или) в режиме видеоконференции) или по мере необходимости, если член КК обратился с просьбой о проведении заседания.

Решения КК принимаются консенсусом в соответствии с процедурами, обеспечивающими управление результатами Совместного проекта, наилучшим соотношением цены и качества, справедливостью, честностью, прозрачностью и эффективной международной конкуренцией.



КК обеспечит постоянное вовлечение заинтересованных сторон и эффективность с самого начала реализации Совместного проекта путем организации регулярных встреч с представителями заинтересованных сторон и применения устойчивых практик управления Совместным проектом.

Более подробное техническое задание для КК предоставлено в Приложении 4.

Стратегический уровень управления Совместным проектом со стороны агентств ООН обеспечивают страновые офисы Участвующих агентств ООН в Республике Беларусь при координации ПРООН (Созывающий агент).

Группа управления Совместным проектом осуществляет основное оперативное управление Совместным проектом, взаимодействие с национальными партнерами, Участвующими агентствами ООН и заинтересованными сторонами.



Технические задания для основного персонала Совместного проекта представлены в Приложении 4.

В целях повышения эффективности Совместного проекта, выполнения узкоспециализированных задач и предоставления необходимой экспертизы будут привлекаться международные и национальные эксперты, консультанты. Найм экспертов, консультантов будет осуществляться в соответствии с правилами и процедурами ООН.

Передача имущества, приобретённого в рамках Совместного проекта, будет осуществлена после ее завершения в соответствии с решением КК по правилам и процедурам ООН.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА

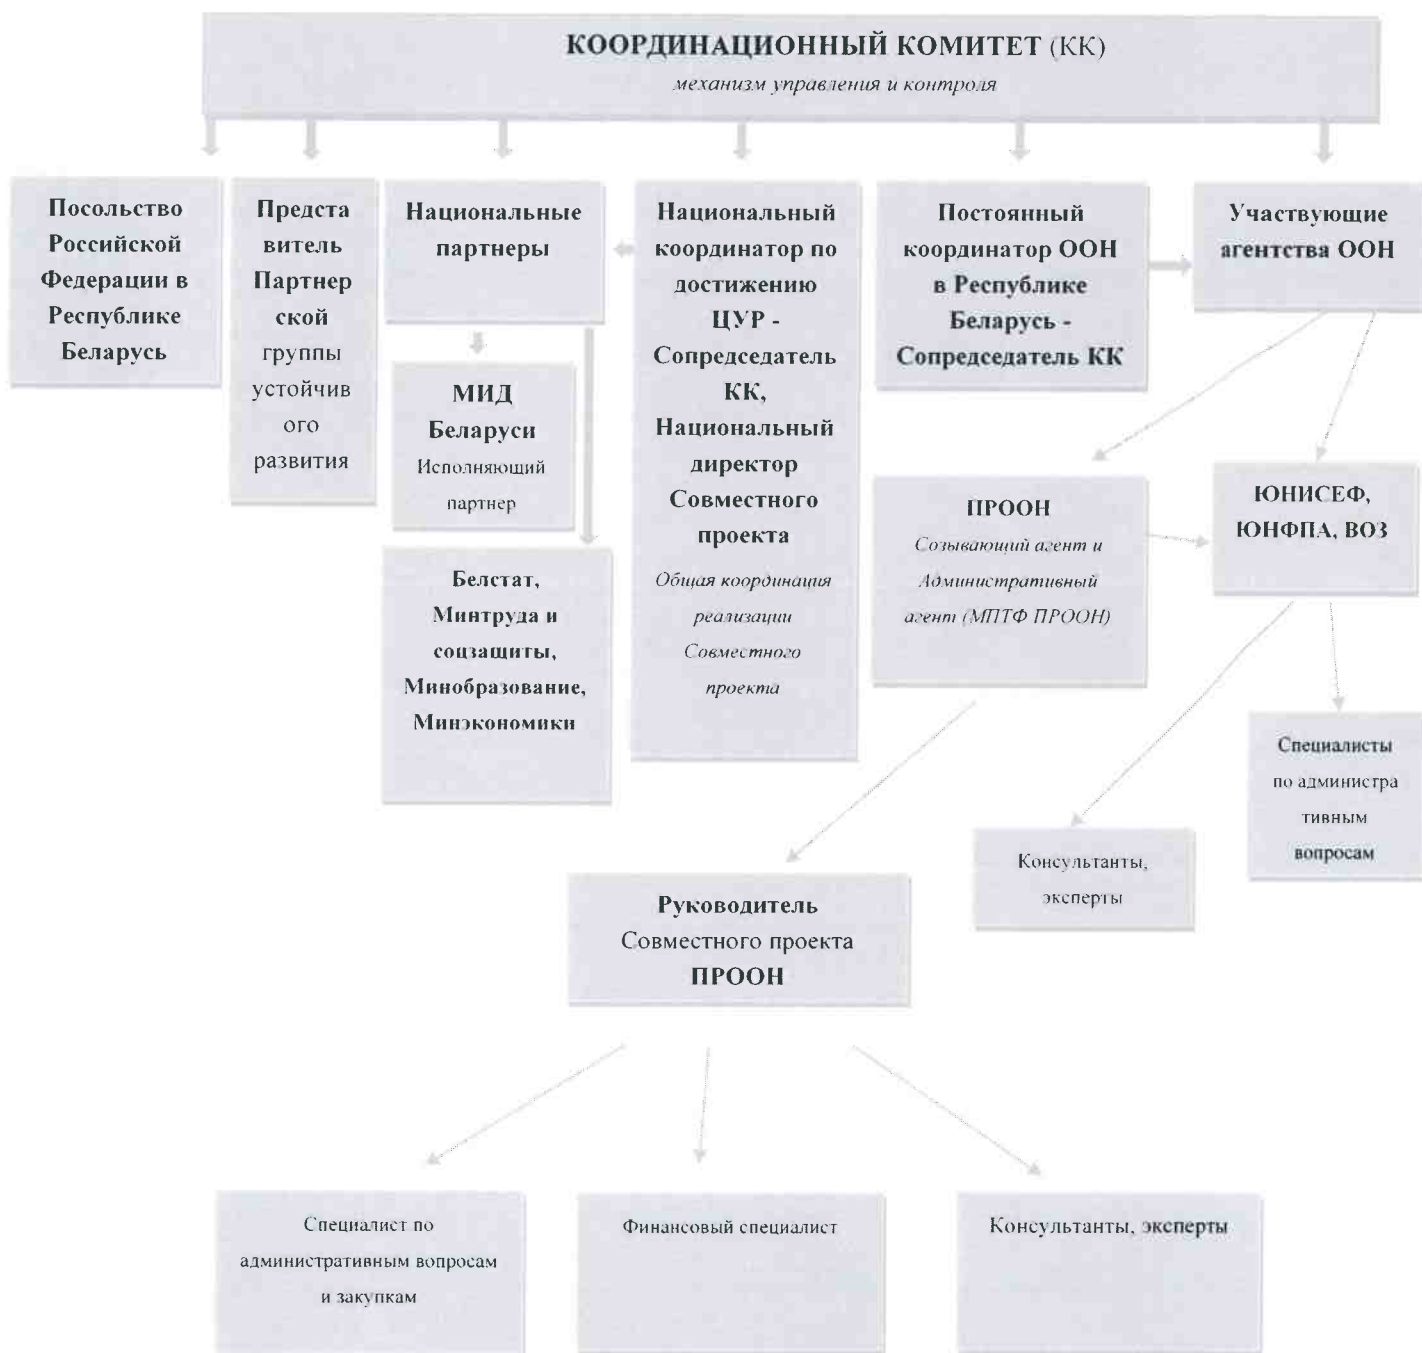

IX. Правовые рамки

ПРООН	<p>Совместный проект является инструментом, упомянутым в статье 1 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Программой развития Организации Объединенных Наций от 24 сентября 1992 года.</p> <p>Конкретные цели Совместного проекта будут реализованы ПРООН в Беларуси в соответствии с ее финансовыми положениями, правилами, практикой и процедурами только в той мере, в какой они не противоречат принципам Финансовых положений и правил ПРООН. Если финансовое управление исполняющего партнера не обеспечивает необходимого руководства для обеспечения оптимального соотношения цены и качества, справедливости, добросовестности, прозрачности и эффективной международной конкуренции, применяется финансовое управление ПРООН.</p>
ЮНИСЕФ	<p>Совместный проект будет осуществляться в соответствии с Основным соглашением о сотрудничестве, заключенным между Республикой Беларусь и ЮНИСЕФ 14 декабря 2007 года и вступившим в силу 31 марта 2009 года. Деятельность в рамках Совместного проекта определяется направлениями, описанными в документе Страновой программы ЮНИСЕФ на 2021–2025 годы, который был утвержден Исполнительным комитетом ЮНИСЕФ в сентябре 2020 года.</p> <p>Деятельность по реализации конкретных целей Совместного проекта будет осуществляться ЮНИСЕФ в Республике Беларусь в соответствии со своими финансовыми положениями, правилами, практикой и процедурами.</p>
ЮНФПА	<p>Республика Беларусь является участницей многосторонних договоров, в том числе Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года («Общая конвенция»), которые определяют статус и распространяются на органы Организации Объединенных Наций, их имущество, должностных лиц и персонал. ЮНФПА является неотъемлемой частью структуры Организации Объединенных Наций. Соответственно, к ЮНФПА, его имуществу, должностным лицам и персоналу применяется Общая конвенция.</p> <p>Мероприятия в рамках задач Совместного проекта будут осуществляться ЮНФПА в соответствии с положениями, правилами, политиками и процедурами ЮНФПА.</p>
ВОЗ	<p>Совместный проект будет осуществляться в соответствии с Базовым соглашением между Правительством Республики Беларусь и Всемирной организацией здравоохранения об установлении технического консультативного сотрудничества от 20 мая 1999 года.</p> <p>Деятельность по реализации конкретных целей Совместного проекта будет осуществляться Страновым офисом ВОЗ в Республике Беларусь в соответствии с его финансовыми положениями, правилами, практикой и процедурами.</p>



Х. Управление рисками

1. Ответственность за меры защиты и обеспечение безопасности Исполняющего партнера, его сотрудников и имущества, а также имущества ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ, находящегося в пользовании у Исполняющего партнера, возлагается на Исполняющего партнера. Для выполнения этого обязательства Исполняющий партнер должен:

- осуществить разработку соответствующего плана безопасности и поддерживать план безопасности, принимая во внимание ситуацию безопасности в стране и регионе, в которой осуществляется Совместный проект;
- принять на себя все риски и обязательства, связанные с безопасностью Исполняющего Партнера, и реализацию плана обеспечения безопасности в полном объеме.


2. Агентства ООН оставляют за собой право проверки разработки такого плана, и в случае необходимости внесения предложений по его изменению. Несоблюдение мер по обеспечению актуальности плана и его реализации в полном объеме считается нарушением обязательств Исполняющего партнера в рамках Совместного проекта.

3. Исполняющий партнер согласен с тем, что он будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы никакая часть из средств ООН, полученных в рамках Совместного проекта, не использовалась для поддержки отдельных лиц или организаций, связанных с террористической деятельностью, и что среди получателей средств, выплаченных ООН в рамках Совместного проекта, отсутствуют лица, включенные в список, формируемый Комитетом Совета Безопасности в соответствии с резолюцией 2167 (1999). Список доступен по ссылке http://www.un.org/sc/committees/1267/qa_sanctions_list.shtml.

4. Исполняющий партнер признает и соглашается с недопустимостью сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и надругательств со стороны Исполняющего партнера и каждой из его ответственных сторон, их соответствующих получателей и других субъектов, участвующих в реализации Совместного проекта, как подрядчиков или субподрядчиков и их персонала, так и любых лиц, оказывающих им услуги в соответствии с Совместным проектом.

а) Во время реализации мероприятий Совместного проекта Исполняющий партнёр и каждая из его ответственных сторон, упомянутых выше, должны соблюдать стандарты поведения, изложенные в Бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2003/13, датированные 9 октября 2003 года, относительно «Специальных мер по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств».

б) Кроме того, не ограничиваясь применением других положений, правил, мер и процедур, влияющих на выполнение деятельности в рамках Совместного проекта, Исполняющий партнёр и каждая из его ответственных сторон, упомянутых выше, не должны подвергаться сексуальным домогательствам в какой бы то ни было форме. Сексуальные домогательства определяются как любое нежелательное поведение сексуального характера, которое можно обоснованно ожидать или воспринимать как оскорбление или унижение, когда такое поведение вмешивается в работу, становится условием трудоустройства или создает пугающую, враждебную или оскорбительную рабочую обстановку.



5. а) При осуществлении деятельности в рамках Совместного проекта Исполняющий партнер (в отношении своей собственной деятельности) требует от своих субсторон (в отношении их деятельности) наличия у них минимальных стандартов и процедур или плана разработки и (или) совершенствования таких стандартов и процедур с целью принятия эффективных превентивных и следственных мер. Данные меры должны включать: политику в отношении сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации, и надругательств; политику в отношении изобличения (защиты) от репрессалий; и механизмы подачи жалоб, дисциплинарных взысканий и расследований. В соответствии с этим, Исполняющий партнер будет требовать, чтобы такие субстороны принимали все необходимые меры для того, чтобы:

-не допускать, чтобы его сотрудники, агенты или любые другие лица, привлеченные для оказания каких-либо услуг в соответствии с настоящим Документом Совместного проекта, были вовлечены в сексуальные домогательства или сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства;

-предлагать сотрудникам и персоналу обучение по вопросам профилактики и реагирования на сексуальные домогательства или сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства, если Исполнительный партнер и его субстороны еще не организовали собственное обучение по вопросам этим вопросам, Исполняющий партнер и его субстороны могут использовать учебные материалы, имеющиеся в ООН;

-отчитываться и осуществлять мониторинг в отношении заявлений о сексуальном домогательстве или сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах, о которых Исполняющий партнер и его субстороны были должным образом проинформированы или были поставлены в известность каким-либо образом, и в отношении состояния таких заявлений;

-направлять жертв (потерпевших) от сексуальных домогательств или сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств для получения безопасной и конфиденциальной помощи; и

-своевременно и конфиденциально регистрировать и расследовать любые заявления, достаточно достоверные для проведения расследования в отношении сексуальных домогательств или сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. Исполняющий партнер информирует ООН о любых таких полученных заявлениях и расследованиях, проводимых им или любой из его субсторон в связи с их деятельностью в рамках Совместного проекта, и информирует ООН о ходе расследования, проводимого им или любой из таких субсторон, если такое уведомление (i) не ставит под угрозу проведение расследования, включая, но не ограничиваясь охраной и безопасностью людей и/или (ii) не противоречит законодательству. После проведения расследования Исполняющий партнер уведомляет ООН о любых мерах, принятых им или любым другим учреждением по итогам расследования.

б) Исполняющий партнер подтверждает, что он выполнил вышеизложенное к удовлетворению ООН, когда ООН или любая другая сторона, действующая от ее имени, просит о предоставлении такого подтверждения. Несоблюдение Исполняющим партнером и каждой из его субсторон вышеуказанного считается основанием для приостановления или прекращения Совместного проекта.



6. Социальная и экологическая устойчивость Совместного проекта будет повышаться за счет применения Социальных и экологических стандартов ПРООН (<http://www.undp.org/ses>) и связанного с ними Механизма подотчетности (<http://www.undp.org/secu-srm>).
7. Исполняющий партнер: (а) осуществляет программные мероприятия в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН (б) обеспечивает выполнение любых планов по управлению или уменьшению последствий, подготовленных с целью обеспечения соответствия проекта упомянутым стандартам, и (с) конструктивно и своевременно принимает участие в работе, направленной на разрешение любых проблем или урегулирования жалоб, возникающих в рамках Механизма подотчетности. ООН будет стремиться к тому, чтобы сообщества и другие заинтересованные стороны Совместного проекта были проинформированы об этом и имели доступ к Механизму подотчетности.
8. Все стороны, подписавшие данный Документ Совместного проекта, добросовестно сотрудничают в ходе любых мероприятий по оценке любых обязательств, связанных с проектом, или соблюдением Социальных и экологических стандартов ПРООН. Это включает в себя обеспечение доступа к объектам Совместного проекта, соответствующему персоналу, информации и документации.
9. Исполняющий партнер принимает надлежащие меры для предотвращения злоупотребления средствами, мошенничества или коррупции со стороны своих должностных лиц, консультантов, ответственных сторон, субподрядчиков и субполучателей при реализации Совместного проекта или использовании средств ООН. Исполняющий партнер обеспечивает наличие и соблюдение своей политики финансового управления, борьбы с коррупцией и мошенничеством в отношении всех финансовых средств, полученных от ООН или через нее.
10. Требования следующих документов, действующих на момент подписания Документа Совместного проекта, применяются к Исполняющему партнеру: а) Меры ПРООН в отношении мошенничества и других видов коррупционной практики и б) Руководство по проведению расследований Офиса ПРООН по аудиту и расследованиям. Исполняющий партнер соглашается с требованиями вышеуказанных документов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Документа Совместного проекта и доступны в сети Интернет по электронному адресу: www.undp.org.
11. В случае необходимости расследования ПРООН обязана проводить расследования, касающиеся любого аспекта Совместного проекта. Исполняющий партнер в полной мере сотрудничает с органом, проводящим расследование, включая предоставление персонала, соответствующей документации и обеспечение доступа к помещениям Исполняющего партнера (и его консультантов, ответственных сторон, субподрядчиков и субполучателей) для таких целей в разумные сроки и на разумных условиях, которые могут потребоваться для проведения расследования. При наличии ограничений в выполнении этого обязательства ПРООН проводит консультации с Исполняющим партнером для поиска решения проблемы.
12. Стороны, подписавшие Документ Совместного проекта, незамедлительно сообщают друг другу о любых случаях ненадлежащего использования средств, или заслуживающих доверия

сообщениях о мошенничестве или коррупции с надлежащим соблюдением конфиденциальности.

13. В том случае, если Исполняющему партнеру становится доподлинно известно, что Совместный проект или деятельность ООН, полностью или частично являются предметом расследования в отношении предполагаемого мошенничества или коррупции, Исполняющий партнер должен проинформировать об этом руководство Участвующих агентств ООН. Исполняющий партнер должен регулярно информировать руководство Участвующих агентств ООН о статусе расследования и связанных с ним действиях.

14. Участвующие агентства ООН имеют право на возмещение Исполняющим партнером любых средств, которые были использованы ненадлежащим образом, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом были оплачены, иначе чем в соответствии с положениями и условиями настоящего Документа Совместного проекта. Агентства ООН могут вычесть такую сумму из любого платежа, причитающегося Исполняющему партнеру по условиям данного или любого другого соглашения.

15. В том случае, если Участвующие агентства ООН не получили возмещение этих средств, то Исполняющий партнер соглашается с тем, что доноры ООН (включая Правительство), финансирование со стороны которых полностью или частично является источником средств на деятельность, подпадающую под действие настоящего Документа Совместного проекта, могут обращаться к Исполняющему партнеру за возмещением любых средств, которые, по определению Участвующих агентств ООН, были использованы не по назначению, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом оплачены, иначе нежели чем в соответствии с положениями и условиями настоящего Документа Совместного проекта. При этом термин «Документ Совместного проекта», используемый в настоящем положении, включает в себя любые последующие соглашения, заключенные в отношении Документа Совместного проекта, в том числе соглашения с ответственными сторонами, субподрядчиками и получателями.

16. Все контракты, оформленные Исполняющим партнером в связи с настоящим Документом Совместного проекта, должны содержать положение о том, что никакие гонорары, вознаграждения, компенсации, скидки, подарки, комиссии или другие выплаты, кроме указанных в предложении, не были предоставлены, получены или обещаны в связи с процессом отбора или в ходе исполнения контракта, и что получатель средств от Исполняющего партнера обязуется сотрудничать с любыми расследованиями и аудиторскими проверками после осуществления оплаты.

17. В случае обращения Участвующих агентств ООН в соответствующие национальные органы для инициирования разбирательств в отношении связанных с Совместным проектом неправомερных действий, Правительство Республики Беларусь обязуется обеспечить активное участие национальных органов в проведении расследования и осуществлении судебных процедур в отношении любых лиц, уличенных в участии в неправомερных действиях, компенсации ущерба и возврат в полном объеме средств, полученных этими лицами от Участвующих агентств ООН.



18. Исполняющий партнер обязуется обеспечить, чтобы все условия, перечисленные в настоящем разделе, именуемом «Управление рисками», были переданы каждой ответственной стороне, субподрядчику и получателю, а все положения данного раздела, именуемые «Стандартные положения по управлению рисками» включены, *mutatis mutandis*, во все субконтракты или субсоглашения, которые в будущем будут заключены в связи с Документом Совместного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Предоставление услуг страновых офисов ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ в рамках реализации Совместного проекта
2. Типовая форма социального и экологического опроса
3. Анализ рисков
4. Примерные технические задания Координационного совета Совместного проекта и ключевого персонала Совместного проекта
5. Бюджет Совместного проекта

